

Мониторинг окружающей среды

Одиннадцатый Полугодовой отчет.
За период: Июль – декабрь 2025 года.
Номер Проекта: KGZ 52256-001.
январь 2026 года.

Кыргызская Республика: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области

Подготовлено: Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) для Кыргызской Республики и Азиатского банка развития (АБР).

ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(по состоянию на 1 января 2026 г.)

| | |
|------------------|----------------------|
| Денежная единица | – сом |
| 1,00 сом | = 0,011 долларов США |
| 1,00 доллара США | = 87,25 сомов |

СОКРАЩЕНИЯ

| | |
|--------------|--|
| АБР | - Азиатский банк развития |
| АО | - Айыл Окмоту |
| АРИС | - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики |
| МОС | - Механизм обратной связи |
| ПСД | - Проектно-сметная документация |
| МРЖ | - Механизм рассмотрения жалоб |
| ОТ, ТБ и ООС | - Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды |
| СИЗ | - Средства индивидуальной защиты |
| КОР | - Кредитование на основе результатов |
| ДРПВВ | - Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| ПУОСКО | - План управления окружающей средой для конкретного объекта |
| ВСС | - Водоснабжение и санитария |

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом отчете «\$» означает доллары США.

Настоящий Полугодовой Отчет по мониторингу окружающей среды является документом Заемщика. Мнения, выраженные в настоящем документе, не обязательно отражают точку зрения Совета директоров, руководства или персонала АБР и могут носить предварительный характер.

При подготовке любой страновой программы или стратегии, финансировании любого проекта или путем обозначения или ссылки на конкретную территорию или географическую зону в этом документе Азиатский банк развития не намеревается выносить какие-либо суждения относительно правового или иного статуса любой территории или области.

Содержание

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| 1.1 | Преамбула..... | 7 |
| 1.2 | Заголовок информация | 7 |
| 2 | ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | 9 |
| 2.1 | Описание Программы | 9 |
| 2.2 | Контакты и руководство по Программе | 12 |
| 2.3 | Мероприятия по Программе в ходе текущего отчетного периода | 21 |
| 2.4 | Описание любых изменений в дизайне Программы | 32 |
| 2.5 | Описание любых изменений в согласованных строительных методах .. | 33 |
| 3 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ | 34 |
| 3.1 | Общее описание мероприятий по экологическим защитным мерам | 34 |
| 3.2 | Аудит объектов..... | 36 |
| 3.3 | Отслеживание проблем (на основе Уведомлений о несоответствиях) | 41 |
| 3.4 | Тенденции | 42 |
| 3.5 | Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски | 42 |
| 4 | РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА | 43 |
| 4.1 | Обзор мониторинга, проводившегося в текущем периоде..... | 43 |
| 4.2 | Тенденция | 49 |
| 4.3 | Резюме результатов мониторинга..... | 50 |
| 4.4 | Использование материальных ресурсов | 51 |
| 4.4.1 | В текущем периоде | 51 |
| 4.4.2 | Использование совокупного ресурса | 51 |
| 4.5 | Управление отходами | 51 |
| 4.5.1 | В текущем периоде | 52 |
| 4.5.2 | Образование накапливающихся отходов | 52 |
| 4.6 | Здоровье и безопасность..... | 52 |
| 4.6.1 | Здоровье и безопасность рабочих..... | 52 |
| 4.6.2 | Здоровье и безопасность сообщества..... | 53 |
| 4.7 | Тренинги..... | 54 |
| 5 | ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКО | 56 |
| 5.1 | Обзор ПУОСКО | 56 |
| 5.2 | Механизм рассмотрения жалоб, Механизм обратной связи..... | 58 |
| 5.3 | Соответствие проекта экологическим гарантиям по кредитным/грантовым соглашениям | 62 |
| 6 | НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ | 64 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 6.1 | Надлежащая практика | 64 |
| 6.2 | Возможность для улучшения | 64 |
| 7 | РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 66 |
| 7.1 | Резюме | 66 |
| 7.2 | Рекомендации..... | 67 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | | |
|---------------|---|-----|
| Приложение 1. | Заключение Государственной экологической экспертизы подпроекта Жерге-Тал | 68 |
| Приложение 2. | Перечень основных документов по экологическим защитным мерам Программы по состоянию на 31 декабря 2025 года | 80 |
| Приложение 3. | Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Ак-Кыя | 82 |
| Приложение 4. | Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Жерге-Тал | 109 |

Список таблиц

| | | |
|------------|--|----|
| Таблица 1 | Освоенная сумма в рамках Программы | 7 |
| Таблица 2 | Села дополнительного финансирования Программы | 11 |
| Таблица 3 | Ответственность партнерских организаций при реализации Программы | 13 |
| Таблица 4 | Программные контракты | 15 |
| Таблица 5 | Контактные данные ОМСУ охваченных Программой | 17 |
| Таблица 6 | Государственные органы, исполняющие функции по охране окружающей среды | 18 |
| Таблица 7 | Информация о подпроектах Программы по первому контракту для пакетов ПСД (проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой») | 20 |
| Таблица 8 | Информация о подпроектах Программы по второму контракту для пакетов ПСД (проектный институт ОсОО «ЭНКОН») | 20 |
| Таблица 9 | Информация о подпроектах Программы по третьему контракту для пакетов ПСД (Консорциум: ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой») | 21 |
| Таблица 10 | Краткая информация о контрактах на строительные работы и ходе работ | 23 |
| Таблица 11 | Информация о количестве рабочих | 32 |
| Таблица 12 | Перечень сел, где проведены общественные слушания | 34 |
| Таблица 13 | Посещения объектов и аудиты | 37 |
| Таблица 14 | Меры по смягчению воздействий и статус их реализации | 46 |

| | | |
|------------|---|----|
| Таблица 15 | Соответствие программы экологическим гарантиям по кредитным/грантовым соглашениям | 61 |
|------------|---|----|

Список схем

| | | |
|----------|---|----|
| Схема 1. | Экологический менеджмент Программы по состоянию на декабрь 2025 г. | 16 |
|----------|---|----|

Список фотографий

| | | |
|--------------|---|----|
| Фото 1 - 2 | Бетонирование вокруг колодца. Строительство гасителя (с. Лама, статус: октябрь 2025 г.) | 24 |
| Фото 3 - 4 | Строительство резервуара. КТП (с. Арал и с. Кичи-Арал, статус: август 2025 г.) | 25 |
| Фото 5 - 6 | Покраска ограждения площадки резервуара. Удаление ржавчины из арматуры резервуара (с. Беш-Терек, статус: сентябрь 2025 г.) | 25 |
| Фото 7 - 8 | Монтаж запорной арматуры. Строительство резервуара (с. Чаек (зона № 4), статус: август 2025 г.) | 26 |
| Фото 9 - 10 | Земляные работы. Реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании детского сада (с. Чаек (зоны № 1, 2 и 3), статус: сентябрь 2025 г.) | 26 |
| Фото 11 - 12 | Площадка водонапорной башни. Земляные работы (с. Кочкор, статус: июль 2025 г.) | 27 |
| Фото 13 - 14 | Площадка водозабора. Автобетоносмесители Подрядчика (с. Кара-Тоо, статус: август 2025 г.) | 28 |
| Фото 15 - 16 | Земляные работы. Стойки для ограждения площадки резервуара (с. Исакеев, статус: август 2025 г.) | 28 |
| Фото 17 - 18 | Земляные работы. Армирование резервуара (с. Молдо-Кылыч, статус: август 2025 г.) | 29 |
| Фото 19 - 20 | Санитарные помещения средней школы. Ограждение септика средней школы (с. Баетово, статус: сентябрь 2025 г.) | 29 |
| Фото 21 - 22 | Испытание водопроводных труб. Подключение частных домов (с. Кайынды-Булак, статус: октябрь 2025 г.) | 30 |
| Фото 23 - 24 | Земляные работы. Установка колодца (с. Куланак, с. Учкун, статус: октябрь 2025 г.) | 31 |
| Фото 25 - 26 | Работы на площадке резервуара. Построенный гаситель-колодец (с. Жерге-Тал, статус: август 2025 г.) | 31 |
| Фото 27 | Площадка водонапорной башни полностью огорожен (подпроект Кочкор, статус: на октябрь 2025 г.) | 39 |
| Фото 28 | Установлены предупредительные знаки (подпроект Кайынды-Булак, статус: ноябрь 2025 г.) | 40 |
| Фото 29 | Установлены переходные мостики (подпроект Кайынды-Булак, статус: ноябрь 2025 г.) | 40 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Фото 30 | Установлены временные лестницы для строительно-монтажных работ (с. Учкун, статус: сентябрь 2025 г.) | 41 |
| Фото 31 | На траншеях установлены прочные защитные ограждения (п/п Чаек, статус: август 2025 г.) | 41 |
| Фото 32 | Журнал проведения инструктажа по ОТ и ТБ (п/п Чаек, статус: ноябрь 2025 г.) | 44 |
| Фото 33 | Рабочим представлены спецодежда и СИЗ (подпроект Кайынды-Булак, статус: на август 2025 г.) | 49 |
| Фото 34 | Рабочим представлены спецодежда и СИЗ (подпроект Баетов, статус: на октябрь 2025 г.) | 52 |
| Фото 35 | Аптечка первой медицинской помощи (подпроект Кара-Тоо, статус: на ноябрь 2025 г.) | 52 |
| Фото 36 | Огорожена площадка водонапорной башни (с. Кайынды-Булак, статус: на октябрь 2025 г.) | 53 |
| Фото 37 | Установлены светоотражающие знаки (с. Кара-Тоо, статус: октябрь 2025 г.) | 53 |
| Фото 38 | Тренинги для рабочих (подпроекты Жерге-Тал, статус: на июль 2025 г.) | 54 |
| Фото 39 | Пылоподавления улиц села после обратной засыпки траншеи (с. Исакеев, статус: август 2025) | 56 |
| Фото 40 | Подрядчик установил баннер на строительной площадке (с. Жерге-Тал Нарынского района, статус: на ноябрь 2025 г.) | 57 |
| Фото 41 | Книга для жалоб и предложений сообщества (подпроект Баетов, статус на ноябрь 2025 г.) | 58 |
| Фото 42 – 43 | Фотографии в рамках проведенной встречи с заявителем (с. Учкун, статус на ноябрь 2025 г.) | 59 |
| Фото 44 | Баннер МОС АРИС (статус на ноябрь 2025 г.) | 60 |

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула

1. Настоящий отчет представляет собой полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды для Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (Программа).
2. Настоящий отчет представляет собой **одиннадцатым** полугодовым отчетом по мониторингу окружающей среды в рамках Программы за период июль-декабрь 2025 года.

1.2 Заголовок информация

3. Целью Программы является инклюзивный и надежный доступ к безопасному водоснабжению и улучшенной санитарии для сельских населенных пунктов в Нарынской области.
4. За отчетный период в рамках Программы освоены более 13 млн. \$ США (см. Таблицу 1).

Таблица № 1. Освоенная сумма в рамках Программы

| | Программа (Credit # 3854-KGZ (COL); Grant # 0676-KGZ (SF)) – Основное финансирование (\$ США) | Программа (Credit # 4494-KGZ (COL); Grant # 0971-KGZ (SF)) – Дополнительное финансирование (\$ США) | Всего (\$ США) |
|--------------|--|---|----------------------|
| Кредит | 1 860 294,13 | 1 337 500,00 | 3 197 794,13 |
| Грант | 1 953 583,49 | 6 750 000,00 | 8 703 583,49 |
| ПКР | 1 046 109,28 | 114 942,53 | 1 161 051,81 |
| Итого | 4 859 986,90 | 8 202 442,53 | 13 062 429,43 |

5. **Категория окружающей среды.** Категория защитных мер по охране окружающей среды для программы кредитования на основе результатов (КОР) – Категория В. Работы в рамках Программы будут относительно небольшими и широко распространены по Нарынской области.

В связи с небольшим характером работ, воздействие на окружающую среду будет зависеть от конкретного объекта и ограничиваться этапом строительства в рамках программной деятельности.

6. Специалистом по защитным мерам Программы подготовлен Перечень основных документов по экологическим защитным мерам Программы на 31 декабря 2025 года (см. Приложение 2).

2 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1 Описание Программы

7. Азиатский Банк Развития (АБР) окажет содействие в реализации Национальной стратегии Правительства Кыргызской Республики по развитию на 2018–2040 годы, цель которой – обеспечение чистой воды и санитарии для всех. Государственная (общенациональная) программа для сектора водоснабжения и санитарии, «Программа развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики на 2016–2026 годы», направлена на достижение улучшенного доступа к безопасным и качественным услугам по водоснабжению и санитарии (ВСС) во всех населенных пунктах. Государственная программа устанавливает стратегическую и политическую основу для развития инфраструктуры и услуг ВСС и повышения потенциала государственных учреждений, агентств и операторов для устойчивого предоставления услуг ВСС. Основное внимание в деятельности АБР уделяется подходу, основанному на результатах, для поддержки государственной программы по достижению всеохватывающего и надежного доступа к безопасному водоснабжению и улучшенным санитарным условиям для сообществ в сельских районах.
8. Государственная программа по расширению доступа к безопасному водоснабжению и улучшенным санитарным условиям для сельских сообществ в Нарынской области в соответствии с запросом Правительства Кыргызской Республики. Таким образом, Программа будет поддерживать строительство и реабилитацию инфраструктуры, подкрепленную мерами по усилению потенциала Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС), реализующего агентства, и улучшит устойчивое управление объектами ВСС.
9. АРИС образовано Указом Президента Кыргызской Республики 15 октября 2003 года в целях углубления предпринимаемых мер по привлечению инвестиций на преодоление бедности, развитие и поддержку частного предпринимательства в рамках Национальной стратегии сокращения бедности, укрепления деятельности органов местного самоуправления и усиления местных сообществ и общинных организаций. АРИС является некоммерческой организацией, обладающей статусом юридического лица.

Программа будет поддерживать строительство/реабилитацию инфраструктуры, а также оказывать поддержку посредством поддержки мер по наращиванию потенциала АРИС, Агентству по реализации программы, и операторов, а также улучшить устойчивое управление объектами ВСС.

Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выступает в качестве Исполнительного агентства Программы и будет нести ответственность за общий мониторинг Программы.

10. Механизм КОР является наиболее подходящим для этой Программы, поскольку:

- i. существует четко определенная область действия для поддержки со стороны партнеров по развитию;
- ii. учитывая предыдущее участие АБР в секторе сельского водоснабжения и санитарии (ВСС), метод КОР предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам работать вместе и демонстрировать твердую приверженность достижению поддающихся проверке результатов;
- iii. данный механизм способен стимулировать институциональное усиление в сфере закупок, функции внутреннего аудита и устойчивой эксплуатации и технического обслуживания объектов ВСС на уровне сообществ;
- iv. усиленные механизмы проложат путь для будущей активизации участия в секторе; и
- v. механизм КОР резко сократит транзакционные издержки, учитывая многочисленные мелкие транзакции на сельском и районном уровнях, которые потребуются в рамках Программы.

11. На уровне воздействия Программа КОР соответствует цели Правительства Кыргызской Республики по улучшению здоровья и качества жизни жителей и снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду к 2026 году. Итогом Программы станет инклюзивный и надежный доступ к системе безопасного водоснабжения и улучшенным объектам санитарии в сельских населенных пунктах Нарынской области, с приоритетным фокусом не менее 64 000 человек. Достижение итога Программы будет обеспечиваться двумя конечными результатами:

Результат 1: расширение инфраструктуры водоснабжения и пилотирование решений в области санитарии, и

Результат 2: усиление институционального потенциала и устойчивости в секторе сельского водоснабжения и санитарии.

12. Текущая программа КОР направлена на обеспечение питьевой водой и санитарией 64 000 сельского населения и оказание помощи 21 образовательному и медицинскому учреждению в Нарынской области. **Дополнительное финансирование Программы.** Дополнительное финансирование расширит существующий объем текущей программы КОР, чтобы охватить 100 000 человек и 37 учреждений образования и здравоохранения, а также поддержит инициативы по реформированию сектора и изменению климата с использованием той же модели финансирования.

В дополнительное финансирование для Программы вошли 23 села (см. Таблицу № 2).

Таблица № 2. Список сел дополнительного финансирования Программы

| № | Название района | Название АО ¹ | Название села | Численность населения (данные НСК на 2022 г.) |
|----|-----------------|--------------------------|---------------|---|
| 1 | Ат-Башы | Ат-Башы | Ат-Башы | 20 150 |
| 2 | | | Ак-Жар | |
| 3 | Жумгал | Мин-Куш | Кен-Суу | 534 |
| 4 | | | Котур-Суу | |
| 5 | | | Табылгы | |
| 6 | | | Сары-Булун | 304 |
| 7 | | | Кызыл-Соок | 217 |
| 8 | Нарын | Жерге-Тал | Жерге-Тал | 3 364 |
| 9 | | Мин-Булак | Орнок | 637 |
| 10 | | | Эчки-Башы | 1 979 |
| 11 | | | Оттук | 1 771 |
| 12 | | Доболу | Кенеш | 752 |
| 13 | | | Алыш | 544 |
| 14 | | Эмгек-Талаа | Эмгек-Талаа | 1 961 |
| 15 | | Чет-Нура | Ак-Булун | 325 |

¹ Айыл Окмоту (сельская управа) – исполнительно-распорядительный орган при аильном (сельском) или поселковом кенеше, осуществляющий в пределах своих полномочий управление делами жизнеобеспечения и жизнедеятельности местного сообщества.

| № | Название района | Название АО ¹ | Название села | Численность населения (данные НСК на 2022 г.) |
|--------------|-----------------|--------------------------|---------------|---|
| 16 | Кочкор | Кум-Добо | Арсы | 769 |
| 17 | | Ормон-Хан | Семиз-Бел | 1 327 |
| 18 | | | Эпкин | 1 890 |
| 19 | | | Тендик | 4 643 |
| 20 | | | Чолпон | Туз |
| 21 | | Кара Суу | Кызыл-Добо | 2 068 |
| 22 | Ак-Талаа | Кара-Бургон | Жаны-Тилек | 376 |
| 23 | | Баетов | Угут | 917 |
| Итого | | | 23 | 46 088 |

Кредитное и Грантовое соглашения по дополнительному финансированию для Программы между Кабинета Министров КР и АБР были подписаны 4 ноября 2024 года в городе Бишкек.

Принят Закон Кыргызской Республики от 28 апреля 2025 года за № 83 «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области - Дополнительное финансирование» и Грантового соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту «Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области - Дополнительное финансирование», подписанных 4 ноября 2024 года в городе Бишкек».

2.2 Контакты и руководство по Программе

13. Программа будет выполняться под общей ответственностью Департамента «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ)², которое находится при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Реализацию Программы будет осуществлять Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС).

² Постановление Кабинета Министров КР от 28 августа 2025 года № 531 «О Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и о некоторых вопросах Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики».

В рамках Программы будет осуществлено строительство систем водоснабжения в 35 подпроектах (43 селах) Нарынской области.

Из них по состоянию на 31 декабря 2025 года завершены в 7 подпроектах (7 селах), работы ведутся в 9 подпроектах (14 селах) и на этапе планирования 19 подпроектов (22 села). АРИС работает в тесном сотрудничестве с ДРПВВ, участвующими Айыл Окмоту и другими ключевыми заинтересованными сторонами Программы и партнерами (см. Таблицу № 3).

Таблица № 3. Ответственность партнерских организаций при реализации Программы

| № | Организация | Ответственность |
|---|--|---|
| 1 | <p>Yuto Nyakukan Главный специалист по городскому развитию, SD2-WUD, PTL yhyakukan@adb.org; Лизандро Ракома Страновой координатор по вопросам окружающей среды lracoma@adb.org; Национальные консультанты по охране окружающей среды, ППКР АБР: Жылдыз Молдосанова jmoldosanova.consultant@adb.org; Султан Бакиров sbakirov.consultant@adb.org</p> | <p>АБР – финансирующая организация и оказывает поддержку в разработке и реализации программы кредитования на основе результатов.</p> |
| 2 | <p>Исполнительное агентство (ИА) – ДРПВВ: Азамат Шадманов директор enesay24.info@yandex.ru</p> | <p>Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ), которое находится при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики несет ответственность за развитие как сельского, так и городского секторов водоснабжения и санитарии, включая политику, планирование и координацию сектора. Роль ДРПВВ в Программе - это общее исполнительное агентство, которое, помимо прочего, включает в себя: общую координацию сектора и поддержку политики; связь с Кабинетом Министров Кыргызской Республики и донорами, участие во всех мероприятиях по закупкам (например, в качестве члена Оценочной комиссии), определение и приоритезация секторальных вмешательств (включая инвестиции в инфраструктуру и институциональную поддержку), а также в качестве ответственного органа Кабинета Министров Кыргызской Республики с целью оказания поддержки АРИС в реализации (по мере необходимости).</p> |
| 3 | <p>Реализующее агентство (РА) - АРИС: Улан Байгончиков – Координатор Программы Ubaigonchokov@aris.kg; Бекназар Абдураимов – специалист по мерам безопасности Программы Babduraimov@aris.kg</p> | <p>АРИС будет нести ответственность за общую реализацию Проекта, в том числе за соответствие фидуциарным аспектам и мерам безопасности. АРИС был создан Указом Президента Кыргызской Республики в октябре 2003 года как автономное учреждение как в юридическом плане, так и в операционном.</p> |

| № | Организация | Ответственность |
|---|---|---|
| 4 | Главы районных государственных администраций-акимы | Исполнительная власть в регионе осуществляется местной государственной администрацией. Местная государственная администрация - государственный исполнительный орган, обеспечивающий согласованную деятельность территориальных подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики на территории района, их взаимодействие с органами местного самоуправления и осуществляющий государственный контроль, над своей деятельностью с точки зрения делегированных функций и полномочий. |
| 5 | <p>Проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой»:</p> <p>Андрей Путилов главный инженер проекта gipro75@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p> | <p>Проектный институт несет ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 13 сел Нарынской области (I этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Тош-Булак, с. Орук-Там, с. Орто-Саз, с. Ак-Кыйя, с. Жалгыз-Терек, с. Жерге-Тал, с. Жан-Булак, с. Куланак, с. Учкун Нарынского района; - с. Баетов, с. Кайынды-Булак Ак-Талинского района; - Ат-Башы, с. Ак-Жар Ат-Башынского района. |
| 6 | <p>Проектный институт ОсОО «ЭНКОН» Хромов Александр Сергеевич, директор проектного института encon@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p> | <p>Проектный институт несет ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 15 сел Нарынской области (II этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Жерге-Тал Ак-Талинского района; - с. Кызыл-Соок, с. Сары-Булун, с. Кен-Суу, с. Котур-Суу, с. Табылгы, с. Арал, с. Кичи-Арал, с. Лама, с. Чаек, с. Беш-Терек Жумгалского района; - с. Молдо-Кылыч, с. им. Б.Исакеева, с. Кочкор, с. Кара-Тоо Кочкорского района. |
| 7 | <p>Консорциум: ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой» Хромов Александр Сергеевич, директор проектного института encon@mail.ru</p> <p>Андрей Путилов главный инженер проекта gipro75@mail.ru</p> <p>Ольга Зинина Специалист по вопросам окружающей среды zinola@yandex.com</p> | <p>Проектные институты несут ответственность и осуществляет разработку проектно-сметной документации (ПСД) для 15 сел Нарынской области (III этап):</p> <ul style="list-style-type: none"> - с. Арсы, с. Семиз-Бел, с. Туз, с. Эпкин, с. Кызыл-Добо, с. Тендик Кочкорского района; - с. Орнок, с. Кенеш, с. Алыш, с. Эмгек-Талаа. С. Эчки-Башы, с. Оттук, с. Ак-Булун Нарынского района; - с. Жаны-Тилек, с. Угут Ак-Талинского района. |
| 8 | <p>Подрядчики: Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная компания Шер-Курулуш» ekaras777@mail.ru ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» almazbekKD-77@mail.ru ОсОО "Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi" metagkq@gmail.com</p> | <p>Ответственные за строительства систем водоснабжения соблюдая требований Плана управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО), ОТ и ТБ</p> |

| № | Организация | Ответственность |
|---|--|-----------------|
| | ОсОО "MS Building" ms_building@mail.ru ЗАО «Кайнар» zaokaynar@mail.ru ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп» profit-express@mail.ru | |

14. Проектные контракты в рамках реализации Программы приведена в нижеследующей таблице (см. Таблицу № 4).


Таблица № 4. Программные контракты

| № | Название села | Номер и дата подписания контракта (начала – окончания) | Заголовок контракта | Строительные подрядчики | % выполненных работ по состоянию на 31 декабря 2025 г. |
|---|--------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Жерге-Тал Ак-Талинского района | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-04, 30.06.2023 г. (30.06.2023 г. – 24.10.2025 г.) | Строительство системы водоснабжения для подпроекта Жерге-Тал | ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» | 100 % |
| 2 | Ак-Кыйя | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-03, 07.07.2023 г. (07.07.2023 г. – 24.10.2025 г.) | Строительство системы водоснабжения (СВС) в селе Ак-Кыйя | Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «СК Шер-Курулуш» | 100 % |
| 3 | Лама | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-07/RT/L1 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 30.06.2026 г.) | Строительство СВС в селах Арал, Кичи-Арал, Лама, Беш-Терек и Чаек (зона 4) (Лот № 1) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | 90 % |
| | Арал и Кичи-Арал | | | | 78 % |
| | Беш-Терек | | | | 90 % |
| | Чаек (зона № 4) | | | | 70 % |
| 4 | Чаек (зоны № 1, № 2, № 3) | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-07/RT/L2 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 30.06.2026 г.) | Строительство СВС в селе Чаек (зона №1, 2 и 3) (Лот № 2) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | 70 % |
| 5 | Кочкор | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-06/RT/L2 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 30.06.2026 г.) | Строительство СВС в селе Кочкор (Лот № 2) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | 45 % |
| 6 | Кара-Тоо | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-06/RT/L1 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 30.06.2026 г.) | Строительство СВС в селах Кара-Тоо, Исакеев, Молдо-Кылыч (Лот № 1) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | 80 % |
| | Исакеев | | | | 85 % |
| | Молдо-Кылыч | | | | 80 % |
| 7 | Баеово | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L1 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 31.12.2025 г.) | Строительство СВС в селах Баеовского АО (с. Баеово, Лот 1) | ОсОО "MS Building" | 36 % |

| № | Название села | Номер и дата подписания контракта (начала – окончания) | Заголовок контракта | Строительные подрядчики | % выполненных работ по состоянию на 31 декабря 2025 г. |
|----|-----------------------------|---|---|---|--|
| 8 | | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L2 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 31.12.2025 г.) | Строительство СВС в селах Баатовского АО (с. Баатово, Лот 2) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | |
| 9 | Кайынды-Булак | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-08/L3 21.06.2024 г. (21.06.2024 г. – 31.12.2025 г.) | Строительство СВС в селах Баатовского айылного аймака (с. Кайынды-Булак, Лот 3) | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | 85 % |
| 10 | Учкун | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-09/L2 14.02.2025 г. (14.02.2025 г. – 30.08.2026 г.) | Строительство СВС в селах Учкун и Кок-Жар (Лот 1) | Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп» | 40 % |
| 11 | Куланак | ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-09/L1 14.02.2025 г. (14.02.2025 г. – 30.08.2026 г.) | Строительство СВС в селе Куланак (Лот 2) | | 40 % |
| 12 | Жерге-Тал Нарынского района | ARIS-ADB-NRWSSDP-AF-CW-NCB-DLI-1-10 11.03.2025 г. (11.03.2025 г. – 11.09.2026 г.) | Строительство СВС в селе Жерге-Тал | ЗАО «Кайнар» | 45 % |

Ниже представлена схема, отражающая экологического менеджмента Программы (см. Схема 1).

Схема 1. Экологический менеджмент Программы по состоянию на декабрь 2025 г.

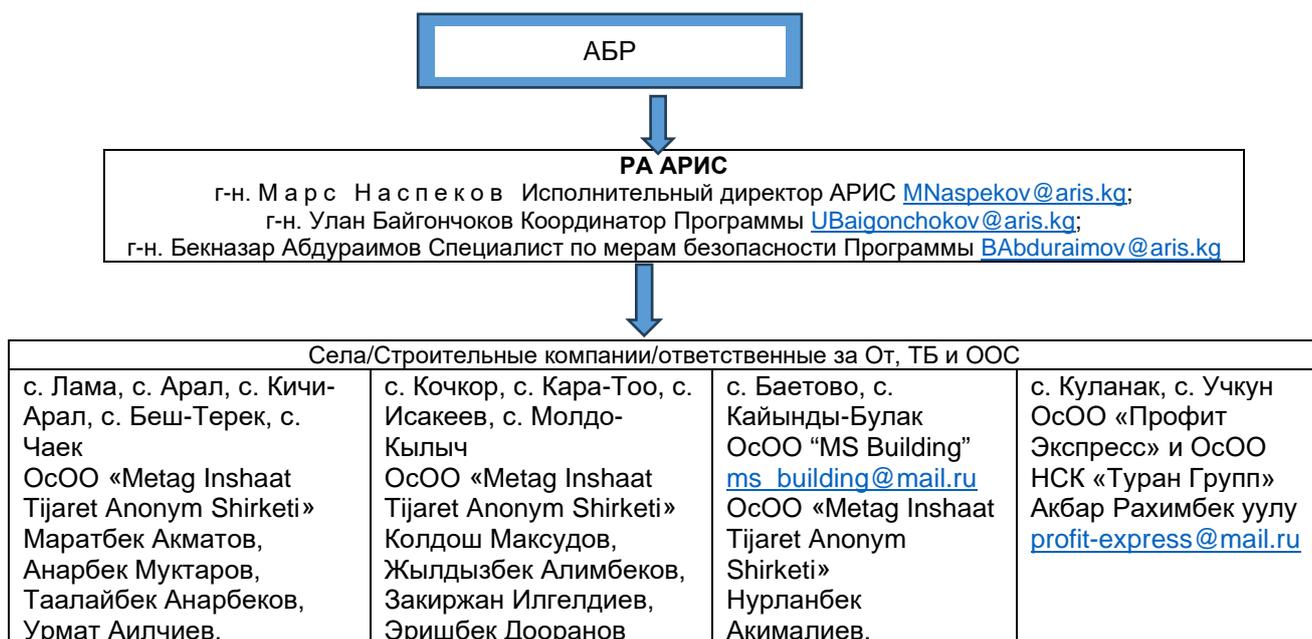

| | | | |
|--|--|--|--|
| Нурбек Сыдыков metagkg@gmail.com | metagkg@gmail.com | Азат Телтаев metagkg@gmail.com | |
| с. Жерге-Тал ЗАО «Кайнар» Кубатбек Тотомбаев zaokaynar@mail.ru | | | |

15. Программа начала реализовываться во всех районах Нарынской области, поэтому АРИС сотрудничает с главами Айыл Окмоту.

Ниже приведен список Айыл Окмоту после административно-территориальной реформы согласно Указа Президента КР от 3 апреля 2023 года № 85 (см. Таблицу № 5).

Таблица № 5. Контактные данные ОМСУ охваченных Программой

| № | Название Айыл Окмоту | Глава Айыл Окмоту | Контакты | Веб-сайт, электронная почта |
|----|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--|
| 1 | Чет-Нуринский АО | Туратбек Кулешов | (03522) 6-00-21 | chetnura.naryn-region.kg |
| 2 | Жерге-Тальский АО Нарынского района | Талантбек Сыдыкбеков | (03522) 5-14-25 | jergetal.naryn-region.kg |
| 3 | Жан-Булакский АО | Кубанычбек Токторалиев | (03522) 6-09-13 | janbulak.naryn-region.kg |
| 4 | Учкунский АО | Алмасбек Ботояров | (03522) 3-63-28 | uchkun.naryn-region.kg uchkun.okmot@mail.ru |
| 5 | Баетовский АО | Арстанбек Акиев | (03537) 9-15-12 | baetov.naryn-region.kg |
| 6 | Ала-Бугинский АО Ак-Талинского района | Улукбек Нуралиев | (03537) 6-07-43 | zhergetal-ao@mail.ru |
| 7 | Ат-Башинский АО | Руслан Докоев | (03534) 2-31-66 | atbashyao@inbox.ru |
| 8 | Мин-Кушский АО | Ильгиз Эрнис уулу | (03536) 3-12-81 | |
| 9 | Жумгалский АО | Атилла Туголбеков | (03536) 2-27-26 | jumgal.naryn-region.kg |
| 10 | Чаекский АО | Таалайбек Кучмуратов | (03536) 2-37-13 | chaekaiylokmotu@mail.ru |
| 11 | Чолпонский АО | Закир Козубеков | (03535) 2-25-57 | |
| 12 | Ормон-Ханский АО | Талант Абдылдаев | (03535) 2-15-33 | niazbekovna@mail.ru |
| 13 | Кум-Добенский АО | Мирлан Исраилов | (03535) 2-19-56 | schorgoeva@gmail.com |

16. Ряд государственных департаментов несут ответственность за управление и охрану окружающей среды в Кыргызской Республике.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, наделен основными полномочиями по реализации законодательства об охране окружающей среды (см. Таблицу № 6).

Таблица № 6. Государственные органы, исполняющие функции по охране окружающей среды (ООС)

| Основные государственные органы, исполняющие функции по ООС | Соответствующие функции | Источник экологической информации |
|--|---|--|
| <p>Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (МПРЭТН КР) http://mnr.gov.kg</p> | <p>- устанавливает государственную политику в области охраны окружающей среды; - публикует нормы качества и стандарты охраны окружающей среды; - устанавливает особо охраняемые территории; - создает систему экологического мониторинга; - осуществляет экологическую экспертизу проекта и ведения хозяйственной деятельности.</p> | <p>Атмосферный воздух и изменение климата, Водные ресурсы, Земельные ресурсы, Биоразнообразие, Государственные лесные ресурсы, Отходы.</p> |
| <p>Служба экологического и технического надзора при МПРЭТН КР http://mnr.gov.kg</p> | <p>Выполняет контрольные функции по соблюдению природоохранного законодательства природопользователями</p> | <p>Сброс опасных загрязнителей, Сброс сточных вод.</p> |
| <p>Государственное предприятие «Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция» http://www.gkpen.kg</p> | <p>Осуществляет сбор данных, связанных с количеством и качеством грунтовых вод.</p> | <p>Сведения о запасах подземных вод, полезных ископаемых и их использовании</p> |
| <p>Министерство здравоохранения КР www.med.kg Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора</p> | <p>Осуществляет бактериологический и химический мониторинг качества питьевой воды.</p> | <p>Качество питьевой воды, Уровень заболеваемости.</p> |
| <p>Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики www.meteo.kg</p> | <p>Контролирует состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод.</p> | <p>Качество атмосферного воздуха, Качество водных ресурсов Отходы (уран и др.), Гидрологические данные.</p> |
| <p>Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики https://www.water.gov.kg</p> | <p>Планирует, организует и реализует мероприятия по административно-хозяйственному и нормативно-правовому регулированию водопользования при эксплуатации водохозяйственных объектов, охране земель водохранилищ. Регулирует межгосударственные отношения, связанные с использованием водных ресурсов, образующихся на территории Кыргызской Республики.</p> | <p>Использование водных ресурсов, в том числе межгосударственный водораздел на трансграничных реках.</p> |
| <p>Государственное предприятие по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Государственном агентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при</p> | <p>Осуществляет комплекс землеустроительных и кадастровых мероприятий на всей территории Кыргызской Республики независимо от организационно-правовой формы субъектов землеустройства.</p> | <p>Мониторинг земельных ресурсов, Анализ почвы, Планирование использования земельных ресурсов, Определение:</p> |

| Основные государственные органы, исполняющие функции по ООС | Соответствующие функции | Источник экологической информации |
|--|--|--|
| Кабинете Министров Кыргызской Республики gpi.giprozem1@mail.ru | Выдает заключение по видам угодий, категориям и площадям земель при отводе земель, а также при получении Государственного акта, Свидетельства и Удостоверение на земельные участки землепользователям, в том числе объектам водоснабжения и санитарии (ВСС). | - вид угодий, - категорий земель, - площади земель, - место нахождения земель с указанием на масштабных (бумажных и цифровых) картах. |
| Нарынский, Ак-Талинский, Ат-Башинский, Жумгалский и Кочкорский филиалы Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики. Тел. филиалов: Нарын (03522) 5-10-34; Ак-Тала (03537) 9-21-48; Ат-Башы (03534) 2-41-43; Жумгал (03536) 6-01-09; Кочкор (03535) 5-10-2. | Осуществляют землеустроительных и кадастровых мероприятий на территории района независимо от организационно-правовой формы субъектов землеустройства. Выдает Государственный акт, Свидетельство и Удостоверение на земельные участки землепользователям, в том числе объектам водоснабжения и санитарии (ВСС). | Учет земель, регистрация прав на недвижимое имущество. |
| Национальный статистический комитет Кыргызской Республики www.stat.kg - (Нацстатком) | Это ключевой государственный информационный и статистический орган, который организует и управляет бухгалтерским учетом и статистикой на всей территории Кыргызской Республики. | Статистика состояния окружающей среды |

17. По итогам конкурса по отбору Консультанта по разработке проектно-сметной документации (ПСД) инфраструктуры сельского водоснабжения Нарынской области были заключены контракты:

А). С проектным институтом Открытым Акционерным Обществом (ОАО) «Кыргызгипрострой» заключен первый контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-QCBS-01-2021 от 15 сентября 2021 года.

Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта были разработаны пакеты ПСД (см. Таблицу № 7).

Таблица № 7. Информация о подпроектах Программы по первому контракту для пакетов ПСД (проектный институт ОАО «Кыргызгипрострой»)

| № | Название района | Название Айыл Окмот | Наименование подпроекта | Наименование охваченных сел | Население |
|---|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Нарын | Чет-Нурунский | Тош-Булак | Тош-Булак | 210 |
| 2 | | | Орук-Там | Орук-Там | 197 |
| 3 | | | Орто-Саз | Орто-Саз | 820 |
| 4 | | | Ак-Кыйя | Ак-Кыйя | 985 |
| 5 | | | Жалгыз-Терек | Жалгыз-Терек | 1245 |

| | | | | | |
|--------------|----------|----------------|-----------|---------------|--------------|
| 6 | | Жерге-Тальский | Жерге-Тал | Жерге-Тал | 3364 |
| 7 | | Жан-Булакский | Жан-Булак | Жан-Булак | 2527 |
| 8 | | Учкунский | Куланак | Куланак | 6544 |
| 9 | | | | Учкун | |
| 10 | Ак-Талаа | Баетовский | Баетов | Баетов | 11893 |
| 11 | | | | Кайынды-Булак | |
| 12 | Ат-Башы | Ат-Башынский | Ат-Башы | Ат-Башы | 20150 |
| 13 | | Ак-Жарский | | Ак-Жар | |
| Итого | 3 | 7 | 10 | 13 | 47935 |

Б). С проектным институтом Обществом с Ограниченной Ответственностью (ОсОО) «ЭНКОН» заключен второй контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-QCBS-02-2021 от 16 ноября 2021 года. Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта были разработаны пакеты ПСД (см. Таблицу № 8).

Таблица № 8. Информация о подпроектах Программы по второму контракту для пакетов ПСД (проектный институт ОсОО «ЭНКОН»)

| № | Название района | Название АО | Наименование подпроекта | Наименование охваченных сел | Население |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Ак-Талинский | Ала-Бугинский | Жерге-Тал | Жерге-Тал | 585 |
| 2 | Жумгальский | Мин-Кушский | Кызыл-Соок | Кызыл-Соок | 217 |
| 3 | | | Сары-Булун | Сары-Булун | 304 |
| 4 | | | Кабак | Кен-Суу | 534 |
| 5 | | | | Котур-Суу | |
| 6 | | Чаекский | Чаек | Табылгы | 13535 |
| 7 | | | | Чаек | |
| 8 | | | Арал | Беш-Терек | 660 |
| 9 | | | | Арал | |
| 10 | | Кичи-Арал | | | |
| 11 | | Жумгальский | Лама | Лама | 636 |
| 12 | Кочкорский | Чолпонский | Молдо-Кылыч | Молдо-Кылыч | 1090 |
| 13 | | Ормон-Ханский | Исакеев | Исакеев | 2287 |
| 14 | | Кум-Добенский | Кочкор | Кочкор | 14397 |
| 15 | | | | Кара-Тоо | |
| Итого | 3 | 7 | 10 | 15 | 34245 |

С). С проектными институтами Обществом с Ограниченной Ответственностью (ОсОО) «ЭНКОН» и Открытым Акционерным Обществом (ОАО) «Кыргызгипрострой» заключен третий контракт № ARIS-ADB-NRWSSDP-CS-QCBS-2023-1 от 15 июля 2023 года. Ниже представлена таблица, отражающая список сел, для которых в рамках данного контракта разрабатываются пакеты ПСД (см. Таблицу № 9).

Таблица № 9. Информация о подпроектах Программы по третьему контракту для пакетов ПСД (Консорциум: ОсОО «ЭНКОН» и ОАО «Кыргызгипрострой»)

| № | Название района | Название АО | Название подпроекта | Название сел | Население | Статус готовности ПСД | |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Кочкорский | Кум-Добенский | Арсы | Арсы | 762 | готово | |
| 2 | | Ормон-Ханский | Семиз-Бель | Семиз-Бель | 1476 | готово | |
| 3 | | Ормон-Ханский | Тендик | Тендик | 4716 | готово | |
| 4 | | Чолпонский | | Туз | Туз | 1458 | в стадии разработки |
| 5 | | | | Эпкин | Эпкин | 1651 | готово |
| 6 | | Кара-Суйский | | Кызыл-Добо | Кызыл-Добо | 2174 | готово |
| 7 | Нарынский | Мин-Булакский | Орнок | Орнок | 629 | в стадии разработки | |
| 8 | | | Эчки-Башы | Эчки-Башы | 1912 | в стадии разработки | |
| 9 | | | Оттук | Оттук | 1741 | в стадии разработки | |
| 10 | | Доболунский | | Кенеш | Кенеш | 719 | в стадии разработки |
| 11 | | | | Алыш | Алыш | 539 | в стадии разработки |
| 12 | | Эмгек-Талаа | Эмгек-Талаа | Эмгек-Талаа | 1961 | в стадии разработки | |
| 13 | | Чет-Нурунский | Ак-Булун | Ак-Булун | 343 | в стадии разработки | |
| 14 | | Ак-Талинский | Кара-Бургон | Жаны-Тилек | Жаны-Тилек | 622 | в стадии разработки |
| 15 | | | Баатовский | Угут | Угут | 1058 | в стадии разработки |
| Итого | 3 | 11 | 15 | 15 | 21761 | - | |

2.3 Мероприятия по Программе в ходе текущего отчетного периода

18. Завершенные подпроекты с 27 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года – 7, которые включили 7 сел:

Отчеты об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенных подпроектов Орто-Саз, Жалгыз-Терек и Жан-Булак Лот 2 в Полугодовом отчете по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2023 года;

Пост-строительному для завершенного подпроекта Тош-Булак в полугодовом отчете по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2024 года;

Пост-строительному для завершенных подпроектов Жан-Булак Лот 1 и Орук-Там в Полугодовом отчете по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2024 года;

Пост-строительному для завершенных подпроектов Ак-Кыя и Жерге-Тал в Полугодовом отчете по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2025 года.

Текущие подпроекты – 9, которые включили 14 села:

Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Чаек и с. Беш-Терек), Кочкор (с. Кочкор, с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово и с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун), Жерге-Тал Нарынского района.

Источники водоснабжения в селах:

- 1) Орто-Саз – скважина;
- 2) Жалгыз-Терек – скважина;
- 3) Жан-Булак – скважина;
- 4) Тош-Булак – каптаж родника;
- 5) Орук-Там – каптаж родника;
- 6) Ак-Кыйя – скважина;
- 7) Жерге-Тал (в Ак-Талинском районе) – каптаж родника;
- 8) Лама – каптаж родника;
- 9) Арал – скважина;
- 10) Кичи-Арал – скважина;
- 11) Беш-Терек – каптаж родника;
- 12) Чаек – каптаж родника;
- 13) Кочкор – скважина;
- 14) Кара-Тоо – скважина;
- 15) Исакеев – скважина;
- 16) Молдо-Кылыч – скважина;
- 17) Баетов – скважина;
- 18) Кайынды-Булак – скважина;
- 19) Куланак – каптаж родника;
- 20) Учкун – скважина;

- 21) Жерге-Тал (в Нарынском районе) – каптаж родника;
- 22) Ат-Башы – под русловые воды в виде каптажа;
- 23) Ак-Жар - под русловые воды в виде каптажа;
- 24) Кызыл-Соок - под русловые воды в виде каптажа;
- 25) Сары-Булун – каптаж родника;
- 26) Кен-Суу – каптаж родника;
- 27) Котур-Суу – каптаж родника;
- 28) Табылгы – каптаж родника.

19. За отчетный период были выполнены следующие строительные-монтажные работы (СМР) (см. Таблицу 10).

Таблица 10. Краткая информация о контрактах на строительные работы и ходе работ

| № | Село | Подрядчик | Лот | Дата подписания контракта | Строительные работы | | Общий прогресс по состоянию на 31.12.2025 г. |
|----|--------------------------------|---|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | | | | Дата начало | Дата завершения | |
| 1 | Жерге-Тал Ак-Талинского района | ОАО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» | - | 30 июня 2023 г. | 30 июня 2023 г. | 24 октября 2025 г. | 100 % |
| 2 | Ак-Кыйя | Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «СК-Шер-Курулуш» | - | 7 июня 2023 г. | 7 июня 2023 г. | 24 октября 2025 г. | 100 % |
| 3 | Лама | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лот 1 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 30 июня 2026 г. | 90 % |
| 4 | с. Арал и с. Кичи-Арал | | | | | | 78 % |
| 5 | с. Беш-Терек | | | | | | 90 % |
| 6 | с. Чаек зона № 4 | | | | | | 70 % |
| 7 | с. Чаек зоны № 1, № 2, № 3 | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лот 2 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 30 июня 2026 г. | 70 % |
| 8 | с. Кочкор | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лот 2 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 30 июня 2026 г. | 45 % |
| 9 | с. Кара-Тоо | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лот 1 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 30 июня 2026 г. | 80 % |
| 10 | Исакеев | | | | | | 85 % |
| 11 | Молдо-Кылыч | | | | | | 80 % |

| № | Село | Подрядчик | Лот | Дата подписания контракта | Строительные работы | | Общий прогресс по состоянию на 31.12.2025 г. |
|----|-----------------------------|---|------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Дата начала | Дата завершения | |
| 12 | с. Баетово | ОсОО "MS Building" и ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лоты 1 и 2 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 31 декабря 2025 г. | 36 % |
| 13 | с. Кайынды-Булак | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» | Лот 3 | 21 июня 2024 г. | 21 июня 2024 г. | 31 декабря 2025 г. | 85 % |
| 14 | с. Куланак | Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп» | Лот 2 | 14 февраля 2025 г. | 14 февраля 2025 г. | 30 августа 2026 г. | 40 % |
| 15 | с. Учкун | | Лот 1 | | | | 40 % |
| 16 | Жерге-Тал Нарынского района | ЗАО «Кайнар» | - | 11 марта 2025 г. | 11 марта 2025 г. | 11 сентября 2026 г. | 45 % |

1) Строительные работы за отчетный период в селе Лама (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Монтаж трансформатора - 1 комплект.

Устройство ленточного фундамента сторожки и хлораторной. Устройство ограждение площадки резервуара и площадки водозабора.

Укладка ПЭ труб: d=110 мм – 1903 м; d= 90 мм – 2826 м; d=63 мм – 2322 м.

Монтаж колодцев – 65 шт.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 1 - 2).



Фото 1 - 2. Бетонирование вокруг колодца. Строительство гасителя (с. Лама, статус: октябрь 2025 г.)

2) Строительные работы за отчетный период в селах Арал и Кичи-Арал (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Укладка ПЭ труб: d=90 мм – 5844 м, d=75 мм – 397 м, d=63 мм - 4124 м.

Установлены колодцы – 70 шт.

Залито подбетонка резервуара (см. Фото 3).

Залито фундамент хлораторной и сторожки.

Установлены ограждения площадки водозабора и трансформатор КТП-25-6-04 (см. Фото 4).



Фото 3 - 4. Строительство резервуара. КТП (с. Арал и с. Кичи-Арал, статус: август 2025 г.)

3) Строительные работы за отчетный период в селе Беш-Терек (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Укладка поселковой сети из ПЭ труб - 8564,2 м.

Укладка водовода из ПЭ труб - 1780 м.

Установлены колодцы – 59 шт.

Каптажные камеры выполнены на 70% от общего объема.

Изготовлены здания сторожки и хлораторной, изготовлено ограждение (см. Фото 5).

Залито фундамент сторожки, строится резервуар (см. Фото 6).



Фото 5 - 6. Покраска ограждения площадки резервуара. Удаление ржавчины из арматуры резервуара (с. Беш-Терек, статус: сентябрь 2025 г.)

4) Строительные работы за отчетный период в селе Чаек (зоны № 1, 2, 3 и 4). (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Уложено ПЭ труб: d=225 мм – 17168,00 м, d=160 мм – 20915,50 м,

d=110 мм – 6453,10 м,

d=63 мм – 6612,10 м.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 7).

Построен резервуар (ведутся бетонные работы) (см. Фото 8).

Фото 7 - 8. Монтаж запорной арматуры. Строительство резервуара (с. Чаек (зона № 4), статус: август 2025 г.)

Монтаж водовода из ПЭ труб: d=160 мм – 1354,00 м, d=225 мм – 762,00 м.

Монтаж ж/б колодцев - 589 шт.

В населенном пункте установлены светоотражающие предупредительные знаки и ограждения на траншеях (см. Фото 9).

Ведутся реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании детского сада (см. Фото 10).



Фото 9 - 10. Земляные работы. Реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании детского сада (с. Чаек (зоны № 1, 2 и 3), статус: сентябрь 2025 г.)

5) Строительные работы за отчетный период в селе Кочкор (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Уложено ПЭ трубы: d=250 мм - 1000 м, d=225 мм - 1249 м, d=110 мм – 2578 м, d=90 мм - 1607 м, d=63 мм - 4663 м, d=160 мм – 1811 м.

Пробурена новая скважина.

Произведена реабилитация существующей скважины.

Площадки водозабора и резервуаров, а также поселковая водопроводная сеть находятся на муниципальной земле АО.

Установлены колодцы – 170 шт.

Завершен монтаж водонапорной башни (см. Фото 11).

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 12).

Фото 11 - 12. Площадка водонапорной башни. Земляные работы (с. Кочкор, статус: июль 2025 г.)

6) Строительные работы за отчетный период в селе Кара-Тоо (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Пробурена скважина 70 м. Буровые работы завершены в полном объеме и законсервирована на площадке водозабора.

Укладка ПЭ труб: d=110 мм - 2354,2 м, d=90 мм - 2708,4 м, d=63 мм - 1265,8 м.

Монтаж ж/б колодцев - 68 шт.

Сети водовода уложены полностью.

В рамках функционирования механизма рассмотрения жалоб (МРЖ) создана Книга отзывов и предложений.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 13 - 14).

Фото 13 - 14. Площадка водозабора. Автобетоносмесители Подрядчика (с. Кара-Тоо, статус: август 2025 г.)

7) Строительные работы за отчетный период в селе Исакеев (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Реабилитированы санитарные помещения в здании средней школы имени Сатаркула Исмаилова.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 15).

Укладка ПЭ труб: $d=110$ мм – 2900 м.

Установлены стойки для ограждения площадки водозабора (см. Фото 16).



Фото 15 - 16. Земляные работы. Стойки для ограждения площадки резервуара (с. Исакеев, статус: август 2025 г.)

8) Строительные работы за отчетный период в селе Молдо-Кылыч (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

На площадке резервуара были уложены ПЭ трубы $d=110$ мм – 40 м.

Установлены ж/б колодцы - 31 шт. Пробурена скважина глубиной 80 м. Буровые работы завершены в полном объеме.

Укладка ПЭ труб: $d=110$ мм - 2061 м, $d=63$ мм- 1712 м, $d=90$ мм – 1630 м.

Дороги и улицы села восстановлены после завершения земляных работ.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 17 - 18).



Фото 17 - 18. Земляные работы. Армирование резервуара (с. Молдо-Кылыч, статус: август 2025 г.)

9) Строительные работы за отчетный период в селе Баетово (Подрядчики: ОсОО «MS Building» и ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Пробурены скважины № 1, № 2, № 3 и № 4 (глубиной по 80 м).

Буровые работы выполнены в полном объеме. Укладка ПЭ труб водовода: $d=160$ мм – 800 м, $d=180$ мм – 800 м, $d=250$ мм – 400 м. Укладка ПЭ труб сети: $d=160$ - 420 м, $d=110$ - 1458 м, $d=90$ - 457 м. Монтаж ж/б колодцев - 22 шт.

Площадки резервуаров, водозабора и водопроводная сеть находятся на муниципальной земле АО.

Ведутся реабилитационные работы внутренних санитарных помещений в здании средней школы имени Шукурбека Бейшеналиева (см. Фото 19 - 20).

Фото 19 - 20. Санитарные помещения средней школы. Ограждение септика средней школы (с. Баетово, статус: сентябрь 2025 г.)

10) Строительные работы за отчетный период в селе Кайынды-Булак (Подрядчик: ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi»):

Буровые работы завершены. Укладка полиэтиленовых (ПЭ) труб: d=110 мм – 1349 м, d=90 мм - 1704,5 м. Монтаж ж/б колодцев - 22 шт.

На траншеях установлены временные переходные мостики с поручнями.

В целях проверки герметичности и целостности проведено испытание ПЭ водопроводных труб опрессовкой (см. Фото 21).

Дороги села восстановлены после завершения земляных работ.

Подключение частных домов выполнены за счет средств хозяев домовладений по согласованию со старостой села Кайынды-Булак (см. Фото 22).



Фото 21 - 22. Испытание водопроводных труб. Подключение частных домов (с. Кайынды-Булак, статус: октябрь 2025 г.)

11) Строительные работы за отчетный период в селах Куланак и Учкун (Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп»):

Укладка водовода из ПЭ труб: d=110 мм – 400 м, d=160 мм – 2600 м.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 23 - 24).

Фото 23 - 24. Земляные работы. Установка колодца (с. Куланак и с. Учкун, статус: октябрь 2025 г.)

12) Строительные работы за отчетный период в селе Жерге-Тал (ЗАО «Кайнар»):

Произведены укладки ПЭ труб: водовода $d=125$ мм – 4920 м и поселковой сети $d=90$ мм – 1500 м. Монтаж ж/б колодцев -18 шт.

Ведутся строительно-монтажные работы (см. Фото 25 - 26).

Фото 25 - 26. Работы на площадке резервуара. Построенный гаситель-колодец (с. Жерге-Тал, статус: август 2025 г.)

20. В следующей таблице указаны информации о количестве работающих рабочих
Подрядчиков (см. Таблицу 11).

Таблица 11. Информация о количестве рабочих

| Села | Подрядчик | Количество рабочих по месяцам | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Лама | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лот № 1 | 16 | 9 | 15 | 15 | - | - |
| с. Арал, с. Кичи-Арал | | 12 | 4 | 4 | - | - | - |
| с. Беш-Терек | | 12 | 10 | 5 | - | - | - |
| с. Чаек зона № 4 | | 32 | 34 | 65 | 44 | - | - |
| с. Чаек зоны № 1, № 2, № 3 | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лот № 2 | 17 | 13 | 17 | 17 | - | - |
| с. Кочкор | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лот № 2 | 15 | 13 | 19 | 19 | 11 | - |
| с. Кара-Тоо | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лот № 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | - |
| Исакеев | | 14 | 15 | 7 | 7 | 6 | - |
| Молдо-Кылыч | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| с. Баетово | ОсОО «MS Building» и ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лоты № 1 и № 2 | 12 | 21 | 6 | 6 | 5 | - |
| с. Кайынды-Булак | ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi» Лот № 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | - |
| с. Куланак | Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп» Лоты 1 и 2 | 13 | 16 | 20 | 20 | - | - |
| с. Учкун | | 10 | 11 | 20 | 24 | - | - |
| Жерге-Тал | ЗАО «Кайнар» | 30 | 30 | 30 | 21 | 4 | - |

2.4 Описание любых изменений в дизайне Программы

21. Дополнительное финансирование Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области охвачены 23 села, в которых проживают 46 088 человек.

22. Были обновлены и опубликованы на веб-сайте АБР документы для дополнительного финансирования Программы Оценка систем защитных мер (ОСЗМ) в рамках Программы и Рамочный документ, по экологической оценке, и обзору (РДЭОО).

2.5 Описание любых изменений в согласованных строительных методах

23. В согласованные методы строительства изменений не вносилось.

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАЩИТНЫМ МЕРАМ

3.1 Общее описание мероприятий по экологическим защитным мерам

24. Специалисты Программы совместно с проектными институтами организовали и провели общественные слушания для информирования местных жителей и общественности о Программе и по обсуждению ПУОСКО, включая ожидаемые воздействия на окружающую среду и соответствующие меры по смягчению последствий для строительства системы водоснабжения и несетевых локальных очистных сооружений (ЛОС) (см. Таблицу 12).

Таблица № 12. Перечень сел, где проведены общественные слушания

| № п/п | Название подпроекта | Название села | ПУОСКО утвержден специалистом по мерам безопасности Программы | ПУОСКО информирован на общественных слушаниях | Представители проектной организации | Представители АРИС |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| Система водоснабжения | | | | | | |
| 1 | Жалгыз-Терек | Жалгыз-Терек | 01.09.2022 г. | 07.09.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | Специалист по мерам безопасности Программы, Инженер по инфраструктуре Программы, Специалист по институциональному развитию Программы, Специалист по санитарии и гигиене Программы, Специалист по МОС Программы |
| 2 | Орто-Саз | Орто-Саз | 01.09.2022 г. | 08.09.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 3 | Жан-Булак | Жан-Булак | 01.09.2022 г. | 08.09.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 4 | Молдо-Кылыч | Молдо-Кылыч | 09.09.2022 г. | 15.09.2022 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 5 | Кочкор | Кочкор | 09.09.2022 г. | 16.09.2022 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 6 | Исакеев | Исакеев | 09.09.2022 г. | 16.09.2022 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 7 | Орук-Там | Орук-Там | 01.11.2022 г. | 09.11.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 8 | Ак-Кыйя | Ак-Кыйя | 01.11.2022 г. | 10.11.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 9 | Тош-Булак | Тош-Булак | 01.11.2022 г. | 10.11.2022 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 10 | Лама | Лама | 14.11.2022 г. | 16.11.2022 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 11 | Арал | с. Арал | 14.11.2022 г. | 17.11.2022 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 12 | | с. Кичи-Арал | 14.11.2022 г. | 17.11.2022 г. | | |
| 13 | Кочкор | Кара-Тоо | 17.01.2023 г. | 19.01.2023 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 14 | Чаек | Чаек | 17.01.2023 г. | 20.01.2023 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 15 | | Беш-Терек | 17.01.2023 г. | 20.01.2023 г. | | |
| 16 | Жерге-Тал | Жерге-Тал (Ак-Талинский р-н) | 17.01.2023 г. | 27.01.2023 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 17 | Баатов | с. Баатово | 03.07.2023 г. | 11.07.2023 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 18 | | с. Кайынды-Булак | 03.07.2023 г. | 11.07.2023 г. | | |

| № п/п | Название подпроекта | Название села | ПУОСКО утвержден специалистом по мерам безопасности Программы | ПУОСКО информирован на общественных слушаниях | Представители проектной организации | Представители АРИС |
|--|---------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| 19 | Жерге-Тал | Жерге-Тал (Нарынского р-на) | 15.01.2024 г. | 17.01.2024 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 20 | Куланак | с. Куланак и с. Учкун | 17.01.2023 г. | 18.01.2024 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 21 | | с. Куланак и с. Учкун | 17.01.2023 г. | 18.01.2024 г. | | |
| 22 | Ат-Башы | с. Ат-Башы | 04.02.2025 г. | 12.02.2025 г. | ОАО "Кыргызгипрострой" | |
| 23 | | с. Ак-Жар | 04.02.2025 г. | 12.02.2025 г. | | |
| 24 | Кызыл-Соок | с. Кызыл-Соок | 04.02.2025 г. | 13.02.2025 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 25 | Сары-Булун | с. Сары-Булун | 04.02.2025 г. | 14.02.2025 г. | | |
| 26 | Кабак | с. Кен-Суу | 04.02.2025 г. | 15.02.2025 г. | | |
| 27 | | с. Котур-Суу | 04.02.2025 г. | 15.02.2025 г. | | |
| 28 | | с. Табылгы | 04.02.2025 г. | 15.02.2025 г. | | |
| Несетевые локальные очистные сооружения (ЛОС) | | | | | | |
| 1 | Лама | Лама | 29.03.2024 г. | 23.04.2024 г. | ОсОО "ЭНКОН" | Специалист по мерам безопасности Программы, Инженер по инфраструктуре Программы, Специалист по институциональному развитию Программы, Специалист по санитарии и гигиене Программы, Специалист по МОС Программы |
| 2 | Исакеев | Исакеев | 29.03.2024 г. | 23.04.2024 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 3 | Чаек | Чаек (12 многоэтажные дома) | 29.03.2024 г. | 24.04.2024 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |
| 4 | Жерге-Тал | Жерге-Тал (Ак-Талинский р-н) | 29.03.2024 г. | 25.04.2024 г. | ОсОО "ЭНКОН" | |

В вышеупомянутых общественных слушаниях приняли участие всего 2186 человек, из них 1020 женщины, что в свою очередь составляет 46,66 %³.

25. В ходе общественных слушаний Специалистом по мерам безопасности Программы презентована всем участникам презентация по теме «Экологические и социальные защитные меры в подпроектах Программы».

В конце общественных слушаний утверждены технические проектные решения подпроектов.

³ Согласно индикатору 8 участие женщин в общественных слушаниях должны составлять не менее 40%.

26. Работники Подрядчика (ОсОО “MS Building”, ОсОО «Metag Inshaat Tijaret Anonym Shirketi», ЗАО «Кайнар» и Консорциум: ОсОО «Профит Экспресс» и ОсОО НСК «Туран Групп») проживают в домах местных жителей сел. Для них не созданы отдельный трудовой лагерь.
27. Основные функциональные обязанности Специалиста по мерам безопасности Программы:
- Проведение мероприятий по мониторингу реализации проектной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики и Положения о Политике по Защитным Мерам АБР 2009 г. (ППЗМ АБР 2009) касательно защитных мер;
 - Координирование и контроль реализацию проектов в соответствии с требованиями экологическим защитным мерам, обеспечивая соблюдение ППЗМ АБР 2009 и экологического законодательства и процедур Кыргызской Республики;
 - Предоставляет регулярные ежеквартальные отчеты в конце каждого квартала, полугодовых отчетов по мониторингу окружающей среды и полугодовых отчетов по мониторингу социальных защитных мер в конце каждого полугодия, а также любых других отчетов, в срочном порядке требуемые в случае определенных ситуаций;
 - Мониторинг функционирование Механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), утвержденного в рамках Программы, своевременное рассмотрение поступивших жалоб и предложений с оставлением соответствующих записей в журналах регистрации;
 - подготовка документов по обеспечению социальных защитных мер, охране труда и технике безопасности, планов по приобретению земель и переселению;
 - Утверждение ПУОСКО, рассмотрение вопросов по адаптации к изменению климата и т.д.

3.2 Аудит объектов

28. Специалистом по мерам безопасности Программы и национальным специалистом по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) проведены проверки соблюдения экологических и социальных защитных мер в подпроектах, где проводятся строительно-монтажные работы по строительству системы водоснабжения в подпроектах (см. Таблицу 13).

Таблица 13. Посещения объектов и аудиты

| Организация | Исполнитель | Цель | Краткое изложение важных выводов | Дата |
|-----------------------|--|--|---|--|
| АРИС, ДРПБВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Лама | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. | 5 июля, 12 августа, 18 сентября и 21 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПБВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Арал и с. Кичи-Арал | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. | 5 июля, 12 августа, 19 сентября и 22 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПБВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в подпроекте с. Чаек и с. Беш-Терек | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Площадка водозабора и площадка резервуара полностью огорожены и т.д. | 5 июля, 12 августа, 19 сентября и 22 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПБВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Кочкор и с. Кара-Тоо | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Площадка водозабора полностью огорожена и т.д. | 4 июля, 11 августа, 20 сентября и 20 октября 2025 г. |

| Организация | Исполнитель | Цель | Краткое изложение важных выводов | Дата |
|-----------------------|--|--|---|--|
| АРИС, ДРПВВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Исакеев и с. Молдо-Кылыч | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. | 4 июля, 16 августа, 20 сентября и 20 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПВВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Баетово и с. Кайынды-Булак | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Площадка водозабора полностью огорожена и т.д. | 2 июля, 13 августа, 15 сентября и 23 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПВВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Куланак и с. Учкун | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. | 3 июля, 14 августа, 17 сентября и 25 октября 2025 г. |
| АРИС, ДРПВВ / SEFF A2 | Специалист по мерам безопасности Программы Бекназар Абдураимов, Национальный специалист по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2) Кенешбек Жумабеков | Мониторинг и надзор строительных работ по соблюдению требований ООС, ОТ и ТБ Подрядчиком в с. Жерге-Тал | Подрядчиком соблюдены все требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д. | 3 июля, 14 августа, 17 сентября и 25 октября 2025 г. |

29. **Результаты аудита участка.** По результатам проверки соблюдения экологических и социальных защитных мер в подпроектах специалистом по мерам безопасности Программы с участием национального специалиста по охране окружающей среды/эколог (SEFF A2), ИТН и прорабов Подрядчика составлены чек-листы по мониторингу и надзору строительных работ.
30. За отчетный период на объектах строительства не было аварий и происшествий, повлекших за собой проблемы, которые повлекли или могли привести к здоровью и безопасности населения и работающего персонала.
31. Подрядчик соблюдает все требования охраны труда и техники безопасности. Площадки водозаборов, площадки резервуаров и площадки водонапорной башни полностью огорожены для ограничения доступа посторонних лиц и животных (см. Фото 27).

Фото 27: Площадка водонапорной башни полностью огорожен (подпроект Кочкор, статус: на октябрь 2025 г.)

В ходе строительно-монтажных работ были установлены светоотражающие предупредительные знаки (см. Фото 28).

**Фото 28. Установлены предупредительные знаки
(подпроект Кайынды-Булак, статус: ноябрь 2025 г.)**

На траншеях установлены переходные мостики с поручнями (см. Фото 29).

Фото 29. Установлены переходные мостики (подпроект Баетов, статус: ноябрь 2025 г.)

В траншеях и в железобетонных водозаборных колодцах установлены временные лестницы для строительно-монтажных работ (см. Фото 30).



Фото 30. Установлены временные лестницы для строительно-монтажных работ (с. Учкун, статус: сентябрь 2025 г.)

В населенном пункте траншеи обеспечены жесткими металлическим защитными ограждениями для защиты от случайного падения людей и животных (см. Фото 31).



Фото 31. На траншеях установлены прочные защитные ограждения (п/п Чаек, статус: август 2025 г.)

32. Со стороны консультантов: инженеров по техническому надзору, инженера по качеству, инженера гидрогеолога и инженера электрика, специально нанятые для Программы в рамках SEFF A2, на постоянной основе ведется работа по мониторингу качества проводимых строительно-монтажных работ.

3.3 Отслеживание проблем (на основе Уведомлений о несоответствиях)

33. В ходе проведения проверки, не были составлены предписания по устранению недостатков норм и требований ПУОСКО, ОТ, ТБ и ООС.

3.4 Тенденции

34. За отчетный период Подрядчики улучшили аспекты ООС, ОТ и ТБ рабочих процессов. Подрядчики соблюдают график строительства.

3.5 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски

35. За отчетный период, в ходе визуального мониторинга специалистом по мерам безопасности Программы строительных участков, не выявлены непредвиденные воздействия на окружающую среду, а также риски на текущих подпроектах Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

4.1 Обзор мониторинга, проводившегося в текущем периоде

36. Специалистом по мерам безопасности Программы проведен обзорный мониторинг соблюдения экологических и социальных защитных мер в подпроектах Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал, где проводятся СМР по строительству СВС.
37. Инструментальные измерения параметров качества воды и воздуха не заложены в ПУОСКО.

Согласно таблице 4-3 ПУОСКО в некоторых селах были проведены мониторинг уровни шума (см. Таблицу 14) и качество воды в роднике.

Таблица 14. Результаты мониторинга шума

| № | Название села | Уровень шума (dB) | Дата |
|---|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Лама | 61 | 12.08.2025 г. |
| 2 | Арал | 58 | 19.09.2025 г. |
| 3 | Кичи-Арал | 59 | 19.09.2025 г. |
| 4 | Кочкор | 60 | 20.09.2025 г. |
| 5 | Кара-Тоо | 61 | 20.09.2025 г. |
| 6 | Исакеев | 58 | 20.09.2025 г. |

В ходе разработки ПСД, 11 октября 2022 года, произведен мониторинг качества родниковых вод села Лама Жумгалским отделом Кочкорского Межрайонного Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Анализ качества родниковой воды «Кымыздык-Булак» по физико-химическим показателям вода соответствовало требованиям Технического регламента «О безопасности питьевой воды» Закона Кыргызской Республики № 34 от 30 мая 2011 года. В настоящее время в селе Лама проводятся строительно-монтажные работы. После завершения строительно-монтажных работ системы водоснабжения, планируется повторный отбор проб родниковых вод села Лама на соответствие действующим нормативам.

38. Значительные выбросы пыли во время работ, выполненных во время отчетного периода, не были произведены. На участке регулярно проводилось подавление пыли водой.
39. Выхлопы из экскаваторов во время земляных работ и грузовиков во время перевозки цемента, гравия и бетона минимальными.
40. Прорабами и мастерами объектов регулярно проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (ОТ и ТБ) для рабочего персонала. В каждом строительном участке имеются Журнал проведения инструктажа по ОТ и ТБ (см. Фото 32).

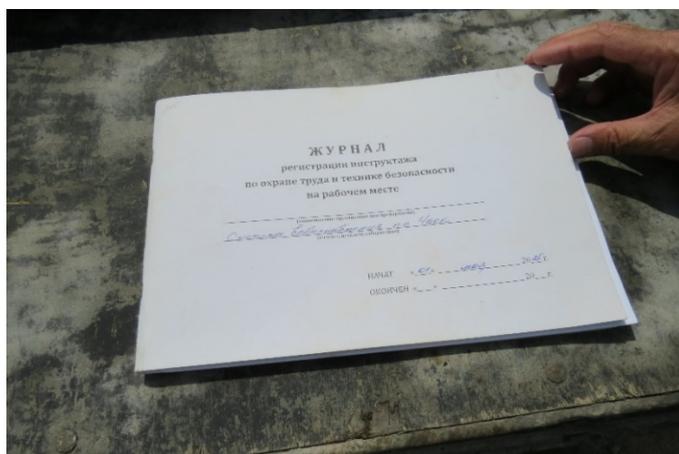


Фото 32: Журнал проведения инструктажа по ОТ и ТБ (п/п Чаек, статус: ноябрь 2025 г.)

41. За отчетный период несчастных случаев или серьезных инцидентов с рабочим персоналом не произошли.
42. В течение отчетного периода на строительных участках несчастных случаев и инцидентов не произошло, в результате, которого возникли бы проблемы со здоровьем и безопасностью населения.
43. ПУОСКО подпроектов Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал были успешно реализованы. Внесение изменений в ПУОСКО не требуются.
44. Анализ реализации ПУОСКО активных подпроектов показывает, что:
 - в процессе проведения работ по строительству системы водоснабжения выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от земляных работ, сварочных работ, работ по восстановлению асфальтового покрытия, а также работе строительной техники были минимальными.

- в период строительного-монтажных работ шумовое воздействие строительной техники и специализированное оборудование носило локальный и краткосрочный характер и приведены к минимуму за счет правильных методов организации производства работ.
- подрядчиками реализованы планы управления отходами, чтобы избежать загрязнения земли и воды.
- в период строительства воздействие на растительный и животный мир не было. Вырубка кустарниковой и древесной растительности не производилась.
- при производстве строительных работ соблюдались нормы охраны труда и техника безопасности, не было несчастных случаев.
- строительные и бытовые отходы были в малом количестве, и они выносились на мусорные полигоны АО.
- при рытье траншей для новой водопроводной сети не обнаружены асбестосодержащие материалы.
- проводимых работах связанных с рытьем траншей и котлованов не обнаружены объекты исторического и культурного наследия.
- функционирует МРЖ.
- земельные участки, предоставленные для размещения системы водоснабжения, выделены из состава муниципальных земель АО в пределах полосы отчуждения согласно ПСД, необходимую для выполнения комплекса земляных и строительного-монтажных работ.
- под площадки водозаборов, резервуаров и водонапорных башен отведены земельные участки на постоянное пользование также из состава муниципальных земель АО согласно ПСД, на которые получены Государственные акты о праве бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком.
- реализация проекта не предполагает изъятия земли и воздействия на активы домохозяйства, их сооружения, используемые в качестве коммерческих объектов. Подготовлены отчеты о комплексной социальной проверке (SDDR) в соответствии с ППЗМ АБР 2009 для подтверждения отсутствия приобретения земель и переселения (ПЗП) и представления соответствующих мер по смягчению воздействий реализации Программы. SDDR представлены в АБР.

45. Меры по снижению воздействия на этапе строительства и статус их реализации в отчетный период представлены в следующей таблице (см. Таблицу 14).

Таблица 14. Меры по смягчению воздействий и статус их реализации

| Действия | Меры по смягчению воздействий | Статус их реализации за отчетный период |
|--|--|--|
| Внедрение плана экологического менеджмента | Обучение по реализации ПУОСКО, включая управление разработанным грунтом/отходами, стандартные операционные процедуры (СОП) для строительных работ; охрана труда и техника безопасности (ОТ и ТБ), основное трудовое законодательство, применимое экологическое законодательство и т.д. | Соблюдено. Подрядчики проинформированы о ПУОСКО. На объекте имеется ПУОСКО, Кодекс поведения по охране окружающей среды, здоровья и труда для персонала подрядчика, План реагирования на чрезвычайные ситуации, Механизм рассмотрения жалоб. |
| Объект культурного наследия: Случайные находки | Подрядчикам соблюдать меры при проведении любых земляных работ. Повышение осведомленности рабочих, мастеров участков, прорабов и инженеров по техническому надзору о случайных находках во время земляных работ. | Соблюдено. в ПУОСКО имеется План охраны объектов исторического и культурного наследия. |
| Земляные работы | Креплений склонов разработанных траншей, для уменьшения риска обвалов грунта. Участок разработанной траншеи будет надежно огражден для защиты от случайного падения людей и животных. Установка предупреждающих щитов, баннеров с паспортом объекта, сигнальных лент, светоотражающих предупредительных дорожных знаков. | Соблюдено. |
| Сбор, хранение и обратная засыпка выкопанного грунта | Часть выкопанных материалов будут загружаться на грузовики и перевозиться к местам временного хранения. | Соблюдено. На объекте имеется Под-план по утилизации грунта для конкретных строительных объектов. |

| Действия | Меры по смягчению воздействий | Статус их реализации за отчетный период |
|-------------------------------------|---|--|
| Социальные и общественные проблемы | <p>Минимизировать неудобства для социальной среды и максимизировать пользу от проекта для общества.</p> <p>Соблюдение ограничений скорости движения автомобилей.</p> <p>Информирования местного населения до начала работ, включая посещение местных школ.</p> <p>Обеспечить, чтобы шум выше 70 дБ не был слышен в пределах 50 м от любой строительной площадки.</p> <p>Прекращать работы в ночное время, из-за которых возникает значительный шум (с 18:00 до 07:00 утра).</p> | Соблюдено. Установлены баннеры с паспортом объекта, сигнальные ленты, светоотражающие предупредительные дорожные знаки. |
| Качество воздуха | <p>Обслуживание все оборудование, сжигающее ископаемое топливо, в соответствии с рекомендациями производителей.</p> <p>Подрядчик обязан использовать оборудование хорошего качества с минимальными выбросами.</p> <p>Запрещается оставлять оборудование на холостом ходу, если оно не используется для проведения строительных работ.</p> <p>Ограничение скорости движения строительного транспорта при проезде через населенные пункты.</p> <p>Поливать дороги внутри и вокруг строительных площадок и улицы села после обратной засыпки траншеи.</p> <p>Устранение возможность утечек на транспортных средствах, используемых для перевозки материалов.</p> | Соблюдено. |
| Охрана труда и техника безопасности | <p>Размещение работников соответствовало передовым практикам.</p> <p>Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности для всего персонала, а также специальное обучение персонала, работающего на рабочих площадках; - бесплатно предоставить работникам объекта все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитную обувь, жилеты для обеспечения высокой видимости, защитные шлемы и средства для защиты слуха; - обучит и назначит специалиста по охране труда и технике безопасности ответственным лицом на период всего проекта; - иметь на объекте медицинскую аптечку. | Соблюдено. |

| Действия | Меры по смягчению воздействий | Статус их реализации за отчетный период |
|-----------------------------|--|---|
| Очистка после строительства | Удалить все насыпи, обломки, мусор, убрать временные сооружения. Восстановление дорог и улиц до первоначального состояния. Восстановление нарушенных коммуникаций. | Соблюдено. |
| Управление отходами | Расположение соответствующих зон хранения отходов на всех рабочих площадках. Вводный инструктаж работников и регулярный инструктаж на рабочем месте для повышения осведомленности сотрудников о нулевом сбросе отходов в окружающую среду. Нулевая терпимость к отходам, поступающим в водотоки или поймы, включая все материалы (например, огарки электродов, древесина, пластмассы и металлы). Подрядчик примет меры по минимизации отходов, т.е. закупит материалы с меньшим количеством упаковки, воздержится от заказа избыточных материалов, договорится с поставщиками о возврате излишков и неиспользованных материалов. Все рабочие площадки будут очищены и восстановлены до прежнего состояния вскоре после завершения работ. Все строительные отходы будут утилизироваться на свалках АО. | Соблюдено. |
| Водные ресурсы | Подрядчик обязан провести оценку рисков всех видов деятельности вблизи водотоков и применять соответствующие меры контроля. Нельзя производить дозаправку транспортных средств или оборудования в руслах рек или в пределах 25 метров от края водотока. Работы в водоохраных зонах оросительных каналах производится не будут. | Соблюдено. |
| Биоразнообразие | Вырубка деревьев не предусматривается. | Соблюдено. |
| Почва и грунтовые воды | Топливо должно храниться в высококачественных наземных резервуарах, размещенных на непроницаемой поверхности с устройством для приема аварийных проливов. Нельзя производить дозаправку вблизи водотоков или в непосредственной близости к ним. Почвы должны быть защищены от водной и ветровой эрозии. Удаление растительности должно быть сведено к минимуму. | Соблюдено. |

| Действия | Меры по смягчению воздействий | Статус их реализации за отчетный период |
|----------|---|---|
| | Растительный слой должен быть снят на строительной площадке и сохранен для последующего восстановления. | |

46. Дороги внутри и вокруг строительных площадок и улицы села после обратной засыпки траншеи опрыскивались регулярно.
47. Бездействующее оборудование не простаивает заведенным/выключено во время отсутствия строительных работ.
48. Все транспортные средства регулярно проходят техническое обслуживание, чтобы свести к минимуму выбросы черного дыма.
49. Подрядчики выделили рабочим средства индивидуальной защиты (СИЗ) (каска, очки, перчатки, жилеты, строительные ботинки, и др.) (см. Фото 33).



Фото 33. Рабочим представлены спецодежда и СИЗ (подпроект Кайынды-Булак, статус: на октябрь 2025 г.)

4.2 Тенденция

50. За отчетный период Подрядчики добились некоторых улучшений в аспектах экологических защитных мер рабочих процессов:
- оповещение местных жителей о проведении строительных работ до их начала.
 - создан кабинет прораба.

- в кабинете прораба имеются все документы по экологическим и социальным защитным мерам: копия ПУОСКО, Кодекс поведения по охране окружающей среды, здоровья и труда для персонала Подрядчика, Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ), План реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС), Книга для жалоб и предложений, Журнал проведения инструктажа по ОТ и ТБ, Приказ Подрядчика на ответственного работника по ООС, ОТ и ТБ и др.
- траншеи ограждены сигнальными лентами и прочными ограждениями.
- были установлены информационные баннеры.
- были установлены переходы/мостики с поручнями.
- были установлены светоотражающие предупредительные дорожные знаки.
- рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (спец. одежда, светоотражающие жилеты, строительные ботинки, перчатки, каски, страховочные ремни и др.) при выполнении их обязанностей.
- не были излишки извлеченного грунта, они использованы обратно.
- не были вырубка деревьев.
- площадки водозаборов, резервуаров и водонапорных башен расположены на муниципальной земле АО.
- укладка водоводов и распределительной сети произведены на муниципальной земле АО.
- дороги и улицы приведены в первоначальное состояние и др.

51. При проведении строительных работ Подрядчики соблюдали все требования ОТ, ТБ и экологические защитные меры, нарушений не было.

4.3 Резюме результатов мониторинга

52. Дополнительный мониторинг не требуется. Помимо регулярных выездов на подпроекты (ежемесячно) улучшение утилизации отходов ежедневно контролируется прорабами и мастерами Подрядчиков, находящимися на строительных площадках.
53. На площадках водозабора и водонапорной башни и на улицах села не обнаружены асбестосодержащие материалы.
54. Во всех ПУОСКО подпроектов включены отдельные Планы обращения с асбестом при случайном обнаружении.

55. В зоне строительства системы водоснабжения подпроектов не обнаружены культурные и историко-архитектурные памятники. В связи с тем, что проводимые строительные работы связаны с рытьем траншей и котлованов, существует вероятность нахождения случайных находок объектов исторического и культурного наследия (далее - ОИКН).

Для сохранения данных объектов во всех ПУОСКО подпроектов включены Планы охраны объектов исторического и культурного наследия. ОИКН в рамках Плана означают археологические и палеонтологические памятники объектов/сооружений/артефактов исторического и/или культурного значения, а также объекты и места религиозного/духовного значения.

56. В действующем «Плане охраны объектов исторического и культурного наследия» описан план действий при случайном нахождении объектов исторического и культурного наследия во время строительных и других работ.

4.4 Использование материальных ресурсов

4.4.1 В текущем периоде

57. Мониторинг использования материальных ресурсов, таких как электричество, вода, является сложным из-за отсутствия отдельных счетчиков для строительных площадок, поэтому данный мониторинг не проводился.

4.4.2 Использование совокупного ресурса

58. Мониторинг использования ресурсов в ПУОСКО не предусмотрен.

59. Хозяйственно-бытовые отходы были собраны и утилизированы на муниципальных свалках АО.

60. Между Подрядчиком и АО не имеется соглашение, так как хозяйственно-бытовые отходы образуются в очень малом количестве.

4.5 Управление отходами

61. Подрядчики реализуют планы управления отходами, чтобы избежать загрязнения земли и воды.

В ходе строительства системы водоснабжения излишков грунта не было. Все небольшие объёмы отходов Подрядчики вывозили на полигоны АО.

62. При выполнении строительных работ отходы образуются в небольших количествах. Отходы в основном представляют собой бумажные мешки из-под цемента, бумажные упаковочные материалы и т. д.
63. Все ПУОСКО подпроектов имеют Планы обращения с асбестом при случайном обнаружении, где подробно описаны порядок действия, извлечение, хранение, транспортировка и захоронение асбестосодержащих материалов, а также обязанности по реализации Плана.

4.5.1 В текущем периоде

64. В ходе строительства Подрядчики своевременно убирают строительные площадки и вывозят мусор. Из-за малого количества объем образовавшихся строительных и бытовых отходов их количество не учитывался, и его трудно учитывать.

4.5.2 Образование накапливающихся отходов

65. Во время строительства в строительных площадках не накапливаются отходы, так как Подрядчиками приняты меры по минимизации отходов.

4.6 Здоровье и безопасность

4.6.1 Здоровье и безопасность рабочих

66. За отчетный период несчастных случаев или серьезных инцидентов с рабочим персоналом не произошли. Мастера участка и прорабы Подрядчика, которые являются ответственными по ООС, ОТ и ТБ регулярно проводили инструктажи по технике безопасности.
67. Рабочие обеспечены специальными одеждами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (см. Фото 34).



Фото 34. Рабочим представлены спецодежда и СИЗ (подпроект Баетов, статус: на октябрь 2025 г.)

68. Медицинские аптечки доступны в полевых кабинетах прорабов каждого Подрядчика и на строительных участках (см. Фото 35).



Фото 35. Аптечка первой медицинской помощи (подпроект Кара-Тоо, статус: на ноябрь 2025 г.)

69. Земляные траншеи укреплены защитными щитами и подпорками от обрушения грунта.

4.6.2 Здоровье и безопасность сообщества

70. В течение отчетного периода на строительных участках несчастных случаев и инцидентов не произошло, в результате, которого возникли бы проблемы со здоровьем и безопасностью населения.

71. Подрядчиком выполняются все требования по ОТ и ТБ. На площадке резервуара установлена ограждения для ограничения доступа посторонних лиц и животных (см. Фото 36).



Фото 36. Огорожена площадка водонапорной башни (с. Кайынды-Булак, статус: на октябрь 2025 г.)

72. Во время строительно-монтажных работ были установлены светоотражательные предупредительные знаки (см. Фото 37).

Фото 37. Установлены предупредительные знаки (с. Кара-Тоо, статус: октябрь 2025 г.)

4.7 Тренинги

73. Специалистом по мерам безопасности Программы проведены тренинги для рабочих по соблюдению охраны труда и техники безопасности при проведении строительных работ (см. Фото 38).



Фото 38. Тренинги для рабочих (с. Жерге-Тал, статус: на июль 2025 г.)

74. С 29 сентября по 2 октября 2025 года Специалист по мерам безопасности Программы участвовал на Конференции по экологическим гарантиям и Ориентационном семинаре по экологическим и социальным рамкам для регионов Центральной и Западной Азии и Восточной Азии, организованном АБР, который состоялся в Тбилиси, Грузия.

5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПУОСКО

5.1 Обзор ПУОСКО

75. Экологические защитные меры применяются во всех текущих подпроектах Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал в соответствии с утвержденными ПУОСКО и “Под-планом по утилизации грунта для конкретных строительных объектов” в основном применяются экологические защитные меры. В подпроектах были реализованы следующие мероприятия:

- предупредительные знаки и переходные мостики с поручнями (см. Фото 9, 13, 17, 28, 29, 37);
- в траншеях и в железобетонных водозаборных колодцах временные лестницы для выполнения строительно-монтажных работ (см. Фото 24 и 30);
- баннеры/указательные щиты Подрядчиков на государственном языке, с указанием контактных данных Центрального офиса АРИС, МОС АРИС и Подрядчика для функционирования Механизмов рассмотрения жалоб (МРЖ) в рамках Проекта (см. Фото 17, 40 и 42).

Траншеи укреплены защитными щитами/подпорками в целях не допущения обвала грунта.

Вынутый грунт временно покрыт брезентом, а излишки грунта не имеются.

Траншеи обеспечены жесткими металлическим защитными ограждениями (см. Фото 31).

Рабочие используют средства индивидуальной защиты (СИЗ) все время в процессе строительно-монтажных работах (см. Фото 1 – 2, 5 – 6, 7 – 8, 11 – 12, 15, 18, 23 – 24, 29, 31, 33, 34, 38 и 39).

Строительные площадки подпроектов огорожены полностью для ограничения доступа посторонних лиц, детей и домашних животных (см. Фото 3 – 4, 5 – 6, 11, 16, 20, 27 и 36).

Строительная площадка и грунтовые дороги/улицы в подпроектах распыляются водой/пылоподавления в целях предупреждения пылеобразования (см. Фото 39).

Фото 39. Пылоподавления улиц села после обратной засыпки траншеи (с. Исакеев, статус: август 2025)

Наряду с этими соблюдаются и другие требования и нормы ПУОСКО подпроектов, экологические защитные меры, охрана труда и техника безопасности в процессе строительно-монтажных работах.

76. ПУОСКО подпроектов Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал были успешно реализованы. Внесение изменений в ПУОСКО не требуются.

5.2 Механизм рассмотрения жалоб, Механизм обратной связи

77. На баннерах Подрядчиков указаны контактные данные Центрального офиса АРИС, Механизмов обратной связи (МОС) АРИС и подрядных организаций для функционирования Механизмов рассмотрения жалоб (МРЖ) в рамках Программы. Баннеры установлены на строительных площадках (см. Фото 40).



Фото 40. Подрядчик установили баннер на строительной площадке (с. Жерге-Тал Нарынского района, статус: на ноябрь 2025 г.)

78. МРЖ созданы во всех подпроектах Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баатов (с. Баатово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал.

79. Согласно требованиям, изложенные в ПУОСКО жалобы и претензии, поступившие в ходе строительно-монтажных работ, рассматриваются Подрядчиком.

В полевом кабинете прораба Подрядчика имеется Книга для жалоб и предложений сообщества (см. Фото 41). По состоянию на 31 декабря 2025 года от местного населения не поступало никаких жалоб. В журнале для отзывов и/или жалоб местного населения были только положительные комментарии.

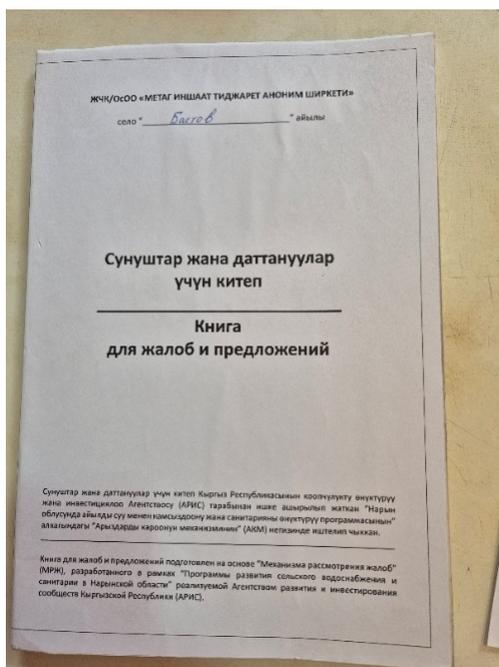


Фото 41. Книга для жалоб и предложений сообщества (подпроект Баетов, статус на ноябрь 2025 г.)

80. 8 октября 2025 года, во время полевого визита Миссии АБР села Учкун Учкунского айыльного аймака Нарынского района Нарынской области с обращением выступил гражданин Бекиш Ногойбаев. В своем обращении он отметил, что «вырытые траншеи остались открытыми, некоторый трубопровод, подведенный к домохозяйствам, не был должным образом проложен, а контроль за работами не осуществлялся». Данное обращение зарегистрировано в МРЖ АРИС.

6 ноября 2025 года рассмотрено обращение заявителя Бекиша Ногойбаева непосредственно в самом с. Учкун с участием Бекиша Ногойбаева и специалистов ПРСВСНО АРИС (инженера по инфраструктуре Эмиля Ильясова, специалиста по МОС Азиза Чалбаева, инженера по техническому надзору Нурланбека Кудашова) и представителя Подрядчика – начальника участка Айбека Акынбекова.

На встрече заявитель Бекиш Ногойбаев ознакомился о сроках и объеме реализации подпроекта Куланак, куда входит строительство системы водоснабжения в селе Учкун, а также с выполняемыми требованиями к строительству.

Учитывая, что работники Подрядчика на местах не могут ответить на все возникающие вопросы жителей, в дальнейшем предложено по всем интересующимся вопросам обращаться напрямую к начальнику участка.

Номер телефона Подрядчика, как и номер телефона МОС АРИС отражены на баннерах, размещенных на участках, где проводится строительно-монтажные работы.

Специалисты Программы объяснили жителю села все шаги по выполнению строительных работ, пообещав улучшить контроль над строительными работами и качество выполнения. Получив объяснения и разъяснения, заявитель Бекиш Ногойбаев принял вышеуказанные информации и заявил о своей удовлетворенности (см. Фото 42 - 43).



Фото 42 – 43. Фотографии в рамках проведенной встречи с заявителем (с. Учкун, статус на ноябрь 2025 г.)

81. Также функционирует Механизм обратной связи (МОС) АРИС. Баннеры МОС АРИС установлены на информационных стендах АО, школ и детских садов (см. Фото 44). Основной целью МОС АРИС является процесс получения оперативной, объективной информации, оценки и рассмотрения апелляций (заявлений, предложений, жалоб, запросов, положительных отзывов) на всех этапах реализации проекта, которые поступают от граждан / бенефициаров для дальнейшего улучшения их работы.



Фото 44. Баннер МОС АРИС (статус: ноябрь 2025 г.).

82. Укреплять связь с бенефициарами проекта и предоставлять каналы для обратной связи, а также выявлять и решать проблемы, повышать прозрачность и подотчетность.
83. На всех этапах реализации проектов АРИС, заинтересованные лица проекта могут подать обращения по интересующим их вопросам по каналам передачи информации МОС АРИС.

Каналы МОС АРИС:

- ✓ WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22, тел.: + 996 (550) 70-05-22
- ✓ Веб-сайт АРИС: www.aris.kg
- ✓ Онлайн платформа АРИС:
<https://kyrgyz-demo-republic-village-covid-19.yrpri.org/group/2831>
- ✓ Электронная почта e-mail: bfm@aris.kg
- ✓ Социальные сети: <https://www.facebook.com/kgariskg>
https://www.youtube.com/channel/UCRapQxzs_z6XEUZlpAcc0_Q
- ✓ Устные или письменные обращения
- ✓ Письма нарочно
- ✓ Приемная АРИС: г.Бишкек, Боконбаева, 102.

84. АРИС, в свою очередь, предоставит ответ на каждое обращение своевременно и объективно в соответствии с внутренним распорядком АРИС и законодательством КР, регулирующим порядок рассмотрения обращений граждан.

5.3 Соответствие проекта экологическим гарантиям по кредитным/грантовым соглашениям

85. Соответствие проекта экологическим гарантиям по кредитным/грантовым соглашениям представлено в следующей таблице (см. Таблицу 15).

Таблица 15. Соответствие Программы экологическим гарантиям по кредитным/грантовым соглашениям

| Номер пункта | Содержание пункта | Статус реализации |
|--------------|--|----------------------------------|
| | Соглашение о финансировании: https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-lna | |
| | Соглашение о программе: https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-pra | |
| 10 | График экологических и социальных гарантий. Пункт 10 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить своевременное и эффективное выполнение всех программных мероприятий в области экологических и социальных защитных мер. | Соответствует в настоящее время. |
| 11 | Пункт 11 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить, чтобы никакие строительные или восстановительные работы в рамках Программы не приводили к значительным неблагоприятным воздействиям на окружающую среду, которые могут быть классифицированы как категория А в рамках ЗПЗ. Перед началом любых строительных или восстановительных работ в рамках Программы, АРИС должно провести проверку, чтобы убедиться, что любые работы, которые могут быть классифицированы как категория А для воздействия на окружающую среду в рамках ЗПЗ, исключены из Программы. | Соответствует в настоящее время. |
| 12 | Пункт 12 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить, чтобы до одобрения любой деятельности для финансирования в рамках Программы были соблюдены следующие условия, касающиеся ограничения использования асбеста в рамках запрещенной инвестиционной деятельности, представленной в Приложении 5 ЗПЗ: (а) проведена оценка существующих сооружений, которые должны быть снесены или удалены для оценки риска присутствия асбеста; и (b) проверка процедур закупок для обеспечения того, чтобы асбестосодержащие материалы не использовались и не финансировались в рамках Программы (за исключением покупки и использования связанного асбестоцементного покрытия, где содержание асбеста составляет менее 20%, как предусмотрено в запрещенной инвестиционной деятельности, указанной в Приложении 5 ЗПЗ). | Соответствует в настоящее время. |
| 13 | Пункт 13 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация, эксплуатация и вывод из эксплуатации всех видов деятельности в рамках Программы соответствовали: (i) всем применимым законам, правилам и руководствам Заемщика, касающимся окружающей среды, здоровья и безопасности; (ii) экологическим гарантиям; и (iii) всем мерам и | Соответствует в настоящее время. |

| Номер пункта | Содержание пункта | Статус реализации |
|--------------|---|----------------------------------|
| | требованиям, включая требования к мониторингу, изложенные в Плане действий Программы. | |
| 14 | <p>Пункт 14 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить, чтобы подготовка, проектирование, строительство, реализация, эксплуатация и вывод из эксплуатации всех видов деятельности в рамках Программы соответствовали: (а) всем применимым законам и правилам Заемщика, касающимся переселения; (b) гарантиям принудительного переселения; и (с) всем мерам и требованиям, включая требования к мониторингу, изложенные в Плане действий Программы.</p> | Соответствует в настоящее время. |
| 15 | <p>Пункт 15 ДРПВВ и АРИС должны обеспечить, чтобы Программа не включала какие-либо риски или воздействия для коренных народов в рамках ЗПЗ. Если из-за непредвиденных обстоятельств в Программе возникают такие последствия, Заемщик должен обеспечить соответствие Программы (а) всем применимым законам и положениям Заемщика, касающимся коренных народов; b) гарантиям коренных народов; и (с) всем мерам и требованиям, включая требования к мониторингу, изложенные в Плане действий Программы.</p> | Не применимый / НП |

6 НАДЛЕЖАЩАЯ ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

6.1 Надлежащая практика

86. Подрядчики продолжили поддерживать хорошую коммуникацию с местным населением, что позволяет им снимать любые проблемы в короткие сроки.

87. Эта практика позволила МРЖ эффективно работать в подпроектах.

Все вопросы решаются на месте в рабочем порядке. За отчетный период жалоб не зарегистрировано.

6.2 Возможность для улучшения

88. Подрядчики должны более ответственно относиться к вопросам охраны окружающей среды. Без постоянных напоминаний своевременно вывозить строительные и бытовые отходы, проводить слаженную работу по пылеподавлению в местах проведения строительно-монтажных работ, а также на траншеях, более ответственно относиться к вопросам техники безопасности и охраны здоровья рабочих и местного населения.

89. Рекомендации по улучшению обращения с отходами Подрядчиками:

- разделять отходы и предоставлять мусорные контейнеры;
- обучать рабочих и запрещать выбрасывать любые отходы на строительной площадке и прилегающих территориях.
- выделить специально отведенную зону временного хранения отходов, где отходы будут храниться в ожидании транспортировки в место окончательной обработки/утилизации.
- минимизировать отходы, т.е. закупит материалы с меньшим количеством упаковки, воздержится от заказа избыточных материалов, договорится с поставщиками о возврате излишков и неиспользованных материалов, и др.

90. Рекомендации по улучшению требований по охране труда и технике безопасности Подрядчиками:

- обеспечить вводное обучение по охране труда и технике безопасности для всего персонала, а также специальную подготовку для персонала, работающего на строительных площадках.

- бесплатно предоставить работникам объекта все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитную обувь, жилеты для обеспечения высокой видимости, защитные шлемы и средства для защиты слуха.
- для конкретных задач могут потребоваться другие СИЗ, например, маски для сварки.
- оказывать медицинскую помощь и неотложную помощь, и др.

7 РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

7.1 Резюме

91. В течении отчетного периода Подрядчиками при проведении строительно-монтажных работ, в достаточной мере выполнялись необходимые природоохранные мероприятия.
92. Проведя анализ результатов проведенного мониторинга, можно отметить, что, строительно-монтажные работы не оказывают какого-либо значительного воздействия на окружающую среду.
93. За весь период строительства на строительных площадках подпроектов не произошли ни одного несчастного случая или серьезного инцидента.
94. Все отходы вывозились на официальные свалки АО.
95. В ходе общественных слушаниях по информированию и рассмотрению ПУОСКО и проектных решений, были заданы вопросы жителями и представителями АО, обсудив их специалисты Программы дали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы участников.
96. В процессе строительно-монтажных работах ПУОСКО подпроектов Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал были успешно реализованы. В течении отчетного периода внесение изменений в ПУОСКО не требовались.
97. В течение всего этапа строительства в подпроектах Лама, Арал (с. Арал, с. Кичи-Арал), Чаек (с. Беш-Терек и с. Чаек), Кочкор (с. Кочкор и с. Кара-Тоо), Исакеев, Молдо-Кылыч, Баетов (с. Баетово, с. Кайынды-Булак), Куланак (с. Куланак, с. Учкун) и Жерге-Тал каких-либо серьезных несоответствий не произошло.
98. Прорабы и мастера Подрядчиков являются ответственными по ООС, ОТ и ТБ, которые работали добросовестно в соответствии с Кодексом поведения по охране окружающей среды, здоровья и труда для персонала Подрядчика (Кодекс поведения ОСЗТ).
99. Прорабы и мастера Подрядчиков ежедневно представляли устный инструктаж всем работникам/рабочим по ОТ и ТБ.

100. Планируется, что отчеты по экологическому аудиту после завершения строительства (пост-строительному) для завершенных подпроектов Лама Жумгальского района и Кайынды-Булак Ак-Талинского района будут подготовлены в ходе Полугодового отчета по мониторингу окружающей среды на период январь-июнь 2026 года.

7.2 Рекомендации

101. Подрядчикам необходимо своевременно выполнить природоохранные мероприятия и заранее предотвращать возможных негативных последствий.

102. Надзор и мониторинг строительных работ будет выполняться так, как и прежде, и как обсуждалось выше.

103. Постоянно заботиться об окружающей среде и регулярно стремиться к снижению вредного воздействия на окружающую среду.

104. Соблюдать законодательство Кыргызской Республики в сфере охране окружающей среды (ООС) и соблюдать требования Заявления о политике безопасности АБР 2009 г. (ЗПБ АБР 2009) и международную практику для защиты и сохранения природной среды и свести к минимуму неизбежные воздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Заключение Государственной экологической экспертизы подпроекта «Жерге-Тал»

| | | |
|---|--|---|
| КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КОЗОМӨЛ МИНИСТРЛИГИ | | МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| ЫСЫК-КӨЛ-НАРЫН РЕГИОНАЛДЫК БАШКАРМАЛЫГЫ 722900 Нарын шаары, Ленин к 58/10 Факс(035225-04-47),тел 5-75-76 | | ИССЫК-КУЛЬ-НАРЫНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 722900 г.Нарын, ул.Ленина 58/10 Факс(035225-04-47),тел 5-75-76 |

«10» 03 2022г.
№ 01-10/5

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам.начальник Иссык-Куль-Нарынского
регионального управления МПРЭТН
Р.Токталиев Р.Токталиев
«10» 03 2022г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственной экологической экспертизы
на Проект система водоснабжения для подпроекта «Жерге-Тал»
Нарынского района Нарынской области

1. Общие сведения

На рассмотрение Государственной экологической экспертизы Иссык-Куль-Нарынского регионального управления МПРЭТН представлен Проект система водоснабжения для подпроекта «Жерге-Тал» Нарынского района Нарынской области, разработанный ОАО «Проектный институт «Кыргызгипрострой».

Инициатором проекта является: Жерге-Тал а/а
К проекту приложены:
- АГЗ №188 от 26.10.2022г.

1. Общая часть

Согласно проекту по административно-территориальному делению территория объекта относится к Нарынской области, Кыргызской Республики и находится в селе Жерге-Тал, Нарынского района.

Участок работ находится в границах села Жерге-Тал, представляет собой сельский населенный пункт, со средней плотностью застройки, с небольшим количеством подземных и надземных коммуникаций, в основном водопровод и ЛЭП.

Абсолютные высотные отметки земли колеблются от 2000 м до 2200 м. Гидрография участка представлена рекой Жерге-Тал, протекающей с севера на юг через село. Территория объекта связана с г. Бишкек асфальтовой дорогой и находится на расстоянии около 300 км. Дорожная сеть участка работ представлена в виде асфальтовых, грунтовых и полевых с. Жерге-Тал Расстояние до столицы Кыргызской Республики, г. Бишкек по асфальтированной автомобильной дороге составляет около 300км;

- расстояние до г.Кант составляет 270км;
- расстояние до г.Балыкчы составляет 120км;
- расстояние до г.Нарын составляет 39 -40км.

Нарынская область расположена в юго-восточной части страны на высоте 1500 метров над уровнем моря, более 70% территории занимают горные хребты.

Климат области -континентальный, зима холодная и продолжительная, абсолютно низкая температура доходит до - 45 градусов, лето короткое, прохладное. Средняя январская температура — 15°С. Абсолютный минимум температуры (-50°С) зарегистрирован на территории Ак-Сайской долины. Климатическая характеристика района приводится по данным метеостанции «Нарын».

Растительность участка работ представлена лиственными деревьями высотой около 3-8 метров, в основном фруктовые деревья и тополя, колючими кустарниками и степным травяным покровом.

Животный мир представлен в основном птицами: воробьи, голуби, галки и др. Животный мир представлен небольшим перечнем млекопитающих: летучие мыши, мышевидные грызуны (домовая мышь, серый хомячок, крысы).

Участок строительства находится на территории жилого сектора, что определяет наличие синантропных видов животных.

На территории строительства и прилегающих территориях не было обнаружено находение видов, занесенных в Красную книгу Кыргызстана.

В геоморфологическом отношении территория расположения села Жерге-Тал, расположена на поверхности слабонаклонной пролювиально-аллювиальной (раQIII) долины реки Жерге-Тал, которая протекает с севера на юг-юго-запад и разделяет село на два участка. Сток реки Жерге-Тал формируется на южных склонах горы Коргоо. Территория села вытянута с севера на юг, с общим уклоном поверхности в этом же направлении. По реке, весной и осенью, когда выпадают обильные атмосферные осадки в виде дождя и таяния снежного покрова на склонах горы Коргоо, могут проходить потоки, носящие селевой характер. Трассы разводящих сетей водоводов проходят по улицам села.

Участок водозаборных сооружений расположен примерно в 800 метра севернее села.

Условные отметки изменяются от 2000 до 2200 над уровнем моря. Геолого-литологическое строение по трассам разводящей сети проектируемым по улицам села, участку расположения водозаборных сооружений и резервуаров, представлено пролювиально-аллювиальными верхнечетвертичными (раQIII-IV) пылевато-глинистыми отложениями-суглинками, лессовидными, светло-коричневого цвета, макропористыми, твердыми по консистенции, плотными, просадочными. В толще суглинка отмечаются прослой галечника мощностью до 0,2 метра. Вскрытая мощность суглинка, по проектируемым трассам водопровода, составляет от 0,6 до 3,1 метра. Вскрытая мощность галечника составляет от 0,7 до 2.3 метра.

Местами, с поверхности описанные грунты перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью до 0,2 метров.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации поверхностных вод из реки Жерге-Тал и талых вод, образующихся во время таяния снега и ледников на горной гряде Коргоо. Движение и разгрузка потока грунтовых вод происходит в южном направлении, по направлению стока воды реки.

Сейсмичность района работ составляет 8 баллов.

В соответствии СП. 2.97 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)» описываемая территория села относится к потенциально не подтопляемой подземными водами.

Согласно проекту проектная документация разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и Техническими условиями «Проектирование сельского водопровода».

Согласно проекту схема водоснабжения села принята принудительно-напорная, с применением электрических источников питания (насосная станция 2го подъема).

Проектом предлагается следующая технологическая схема водоснабжения с.Жерге-Тал: с водозаборных сооружений исходная вода поступает в напорно-регулирующую емкость (резервуар емк.250м³), откуда через повысительную насосную станцию она поступает в распределительную сеть села, пройдя цикл обеззараживания в хлораторной.

Проектируемые водозаборные сооружения предназначены для обеспечения питьевой водой жителей с. Жерге-Тал.

Площадь участка - 4620.00 м², площадь грав. дороги - 417.20 м², автодороги и подъезды – 267,5м².

Источник водоснабжения - подземные воды из существующих нисходящих родников.

Проектом предусмотрено строительство каптажных сооружений на площадке водозабора.

На площадке запроектированы следующие сооружения:

- каптаж родника;
- здание сторожки;
- уборная с герметичным выгребом.

Территория имеет зону санитарной охраны, которая ограждена и имеет организованный въезд на территорию через ворота и подъездные пути к проектируемым сооружениям.

Для предупреждения возможного загрязнения проектируемого водопровода хозяйственно-питьевого назначения и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на площадке резервуаров выполняется зона санитарной охраны. Организация зоны санитарной охраны строгого режима производится в соответствии с целевым использованием подземной воды в системе централизованного питьевого водоснабжения населения села Жерге-Тал. Предусматривается отвод поверхностных вод за пределы территории.

Каптажные устройства (водосборная камера) применяются для захвата подземной воды из родников. Каптаж нисходящих родников осуществляется через обратный фильтр и водопримемные отверстия в стене каптажной камеры. Каптаж нисходящих родников сооружается с водоулавливающими стенками из глинистого плотно утрамбованного грунта, вдоль которых со стороны потока подземных вод устраивается гравийно-дренирующая отсыпка, сопрягающаяся с обратным фильтром каптажа. При рассредоточенном выходе подземных вод на поверхность земли в виде отдельных источников, отстоящих один от другого на расстоянии более 5 м, каптаж их осуществляется раздельно со сбором воды в общую водосборную камеру.

В проекте каптажная камера выполняется из сборных железобетонных колец.

Согласно проекту предусмотрено сторожка .

Площадь застройки $34,3\text{ м}^2$, общая площадь $-13,6\text{ м}^2$.

Здание одноэтажное $6,30 \times 2,70 \times 3,19(\text{h})$, из комплексных конструкций и предназначенное для служебного персонала и осуществления пропускного режима. В здании предусматривается помещение топочной с отдельным входом.

В здании размещены: служебное помещение, пропускная и топочное помещение. Пропускное помещение имеет два входа (вход и выход) с крыльцами и навесом. Топочное помещение имеет отдельный вход с крыльцом и навесом.

Здание сторожки запроектировано на базе металлического контейнера (20 футов) марки НС (High Cube) с внешними размерами $6,058 \times 2,438 \times 2,896(\text{h})$ м и внутренними размерами $5,898 \times 2,350 \times 2,693(\text{h})$ м.

Проектом предусмотрено рабочее освещение всех помещений. Аварийное освещение не требуется.

Для обеспечения подъезда к зданиям и сооружениям, проектом предусматривается устройство автодороги с покрытием из гравийно-оптимальной смеси $\text{H}=100\text{ мм}$, шириной проезда 4м.

Для электроснабжения площадки водозабора, проектом предусмотрена установка дизельного генератора, расположенного в помещении сторожки в отдельном помещении, с обеспечением дымохода, для отвода выхлопных газов (учтено разделом ЭМ сторожки). Мощность ДГУ - 7кВт, 230В. Объем топливного бака 25л. Для ДГУ-7кВт обеспечить запас топлива, в объеме не менее 25л (объем топливного бака). Топливо для ДГУ хранится в отдельном помещении.

Проектируемые сооружения предназначены для обеспечения питьевой водой жителей с. Жерге-Тал.

Площадь участка $=2929,40\text{ м}^2$, площадь грав. дороги $= 365.30\text{ м}^2$, длина ограды $= 225.50\text{ п.м.}$

Участок существующего резервуара расположен севернее села Жерге-Тал и представляет собой спланированную площадку на которой находится резервуар.

На площадке запроектированы следующие сооружения:

- здание хлораторной;
- здание повысительной насосной станции (для потребителей I зоны водоснабжения);
- здание сторожки;
- уборная с герметичным выгребом.

Территория площадки будет максимально возможно огорожена по периметру зоны санитарной охраны. Также запроектирован организованный въезд на территорию через ворота и подъездные пути к проектируемым сооружениям.

Существующий резервуар предназначен для сбора и регулирования подачи воды в водопроводные распределительные сети с. Жерге-Тал.

Требуемый объем резервуара складывается из хранения в нем аварийного и регулирующего объемов воды.

Аварийный объем воды в резервуаре предусматривается из условия обеспечения расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления в течение времени ликвидации аварии на водоводе.

Существующий железобетонный резервуар питьевой воды $V=250\text{м}^3$ выполнен в монолитном варианте, в соответствии с ТП 901-4-50с. Диаметр резервуара в осях – 10,3м. Высота резервуара от днища до верха несущих конструкций перекрытия – 3,6м.

Проектом предусматривается перечень демонтажных и ремонтно-восстановительных работ:

- очистка днища резервуара от грязи, мусора, ила;
- промывка внутренних поверхностей резервуара водой;
- пробивка (высверливание) новых отверстий под технологические трубопроводы;
- установка сальников;
- ремонт поврежденных участков резервуара;
- проведение испытания резервуара на герметичность.

Согласно проекту предусмотрено хлораторная.

В здании хлораторной предусматривается обеззараживание воды гипохлоритом кальция. Доза хлора принята 1 мг/л. Производительность установки по активному хлору составляет 1,78 кг/сутки. Хлорная вода из хлораторной подается в существующий напорно-регулирующий резервуар, где происходит контакт воды с хлором.

Хлораторная установка размещается в металлическом утепленном контейнере размером 12х2,35м и высотой 2,5 м.

В состав хлораторной входят:

- Техническое помещение;
- Лаборантская;
- Склад хлора;
- Колодец-выгреб.

Производительность хлорной установки рассчитана на обеззараживание суточного расхода воды составляющего $561,37 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Хлорный раствор от хлораторной подается в существующий резервуар емкостью 1000 м^3 , куда вода поступает от проектируемого водозабора (родник). Обеззараживание воды предусматривается хлорной известью.

Суточный расход хлорной извести составляет $1,87 \text{ кг/сут}$ (исходя из суточного расхода воды, подлежащего обеззараживанию $561,37 \text{ м}^3$, расчетной дозы активного хлора $1,0 \text{ г/м}^3$, процентного содержания активного хлора в хлорной извести 30%). Расчетный объем однопроцентного раствора хлорной извести составляет 187 л/сут . Данный раствор в течение суток подается в резервуар.

Хлорный бак устанавливается на подставке на высоте $1,20 \text{ м}$, обеспечивающей самотечное поступление хлорного раствора в бак DTS 200.

Хлорный бак для растворения хлорной извести дополнительно оборудуется вентиляционным воздуховодом. Бак закрывается крышкой.

Для хранения хлорной извести предусмотрен склад. В складе предусмотрен комплект противопожарных средств.

При работе с хлорной известью необходимо строго соблюдать правила по технике безопасности.

В техническом помещении хлораторной размещается основное технологическое оборудование состоящее из: хлорный бак устанавливается на подставке на высоте $1,20 \text{ м}$, обеспечивающей самотечное поступление хлорного раствора в бак DTS 200.

Хлорный бак оборудуется электроменшалкой и патрубками с вентилями.

В хлорном баке общей емкостью 100 л производится затирка, определенного количества гипохлорита кальция $3,5 \text{ кг}$ (хлорной извести) с водой до концентрации раствора $5-7\%$. При работе с хлорной известью необходимо строго соблюдать правила по технике безопасности.

Выгружать и загружать хлорную известь, перемешивать раствор, обслуживающий персонал обязан в противогазе, защитной санитарной одежде при включенной принудительной вентиляции.

В хлораторной размещаются шкаф для хранения противогазов, спецодежды и аптечка для оказания экстренной помощи.

Здание хлораторной запроектировано на базе металлического контейнера.

Согласно проекту для хранения хлорной извести предусмотрен склад. В складе предусмотрен комплект противопожарных средств. При работе с хлорной известью необходимо строго соблюдать правила по технике безопасности. Выгружать и загружать хлорную известь, перемешивать раствор, обслуживающий персонал обязан в противогазе, защитной санитарной одежде при включенной принудительной вентиляции.

В хлораторной размещаются шкаф для хранения противогазов, спецодежды и аптечка для оказания экстренной помощи.

Площадь застройки. $64,70 \text{ м}^2$, общая площадь. $26,80 \text{ м}^2$, строительный объем $90,20 \text{ м}^3$.

Источником снабжения здания водой, необходимой на технологические и хозяйственно-питьевые нужды хлораторной, являются реконструируемые водозаборные сооружения.

Проектируемый водовод предназначен для транспортировки питьевой воды от площадки водозабора до площадки существующего резервуара емк. 250 м³.

В связи со сложным рельефом местности села Жерге-Тал, и проведенного гидравлического расчета запроектирована двухзонная система водоснабжения:

I зона - согласно технологической схемы исходная вода, от существующего резервуара емкостью 250 м³, по самостоятельному водоводу, запроектированному через повысительную насосную станцию 2-го подъема, расположенную на площадке резервуара, поступает в распределительную сеть верхней части села Жерге-Тал. Система запроектирована хозяйственно-питьевой.

II зона - согласно технологической схемы исходная вода по самотечно-напорному водоводу поступает в распределительную сеть нижней части села Жерге-Тал. Система водопровода запроектирована хозяйственно-питьевой;

В здании запроектирована система производственной и хозяйственно-бытовой канализации.

Для подключения частных подворий в проектируемых водопроводных колодцах предусматриваются гребенки, располагаемые на несколько подворий, в каждом колодце, с установкой на них запорной арматуры. Подключение частных домов выполняется за счет средств хозяев домовладений по согласованию с председателем СООПВ.

Отвод стоков производственной канализации осуществляется в проектируемый герметичный колодец-выгреб. Отвод условно чистых стоков от раковины запроектирован в фильтрующий колодец.

Все бытовые отходы складываются в специально отведенных местах с последующим вывозом в специализированные места согласованные с МСУ.

При работе котельной отсутствуют значимые загрязнения почвы.

Проектируемый водовод предназначен для транспортировки питьевой воды от площадки водозабора до площадки резервуара.

Согласно проекту, в период строительства основным источником воздействия на окружающую среду оказывают строительные работы:

- Автотранспорт работающий в процессе строительства. При строительстве будут использоваться: бульдозеры (1 шт), экскаваторы (1 шт), автокран (1 шт), а также грузовая машина (1 шт) для перевозки строительного материала. Автотранспорт будет использоваться при рытье траншей для прокладки инженерных коммуникаций.

- Земляные работы. Земляные работы представляют собой рытье траншей под систему канализации и инженерных коммуникаций. По возможности для сокращения пылеобразования будет использоваться ручной труд и применяться обеспыливание.

- Сварочные работы. Сварочные работы в основном предвидятся при строительстве зданий на площадке водозабора и при прокладке распределительной сети. При сварочных работах будут использоваться электроды Э42 А.

- Лакокрасочные работы. При лакокрасочных работах проводимых при отделке зданий используются грунтовка ГФ 021, эмаль ПФ 115.

Согласно проекту предусмотрено мероприятия необходимые для предотвращения отрицательного влияния строительной и транспортной техники:

- при транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки кузова автомашин предусматривается накрывать специальными тентами;

- максимальное использование существующих проездов для движения техники;

- максимальное использование электроинструментов и оборудования взамен механизмов, работающих на жидком топливе;

- применение только технически исправных машин и механизмов, исключающих подтеки нефтепродуктов;

- исключение сброса в поверхностный сток нефтепродуктов за счёт организации заправки автотранспорта ГСМ за пределами водоохраной зоны на стационарных АЗС и дорожной техники с использованием передвижных АЗС с поддонами для сбора переливов (проливов);

Согласно проекту мероприятия для предотвращения отрицательного влияния объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры строительства.

- установить биотуалеты для рабочих;

- обеспечить места хранения твердых отходов;

- поддержание в чистоте площадки строительства и прилегающей территории, подъездов и внутренних проездов при прокладке автотяги за счет санитарной уборки и использования передвижных мусоросборных контейнеров;

- спуск бытовых стоков должен отсутствовать, сбор в герметические емкости;

- установить временные сооружения на спланированной площадке;

- спланировать площадки для складирования строительных материалов и конструкций;

- производство работ строго в отведенной строй генпланом зоне, огороженной специальным забором;

- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;

- сбор использованных обтирочных материалов (ветоши) в специальной закрывающейся водонепроницаемой таре при технике и утилизация совместно с отходами ТБО;

- перепланировка участка трассы строительства не должна производиться;

- на питьевые нужды используется бутилированная вода

При бурении скважин производятся следующие мероприятия:

1. В местах бурения не предусматривается строительство складов ГСМ, т.к. бурение будет проводиться буровой установкой, которая укомплектованы

передвижными средствами снабжения ГСМ. Кроме того, в непосредственной близости от населенного пункта имеются автозаправочные станции и не требуется устройство их в пределах площадки бурения скважины.

2. Все материалы и запас глины для приготовления бурового раствора после завершения бурения полностью будут вывозиться с территории буровой площадки с последующей зачисткой площадей их хранения на по согласованию с МСУ.

3. Шлам, отработанный водно-глинистый раствор и сточные воды собираются в металлические мерники для последующего вывоза их и захоронения в бессточных стационарных ловушках. Производственные отходы собираются в металлические контейнеры для вывоза их с буровой площадки и захоронения в стационарной ловушке.

4. Весь бумажный и деревянный материалы - мешкотара и упаковки, а также полимерные и пластиковые материалы вывозятся с территории буровой на специально отведенные в районе санкционированные мусорные свалки. После вывоза бурового оборудования, извлечения трубопроводов, кабелей, заземления и мелкого материала, производится полная планировка и рекультивация буровой площадки.

5. Все буровое оборудование, шламовые амбары, ГСМ и дополнительное оборудование располагать только на территории земельного отвода.

Процесс бурения скважины будет проводиться в строгом соответствии с нормативными документами КР.

При эксплуатации водозабора имеется биотуалет, шлам образующийся при бурении собирается в герметичную емкость с последующим вывозом и утилизацией.

Согласно Закону Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 8.05.2009 №151 категория опасности работ на водозаборе по сбросам сточных вод II.

В процессе проведения работ по строительству водозабора предусматриваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от земляных, буровых работ и работе строительной техники.

Земляные работы включают в себя выемочно-погрузочные, автотранспортные, планировочные работы. При производстве земляных работ на участках линейных сооружений складирование грунта производится на месте производства работ (на бровке траншей).

От стационарных источников выбросов при производстве строительных работ в атмосферный воздух будут выделяться: пыль породного материала (неорганическая пыль), оксиды железа, марганца, азота, углерода, кремния, винилхлорид, уайт спирт, бенз(а)пирен.

С отработанными газами двигателей строительного и автотранспортного оборудования будут выделяться: оксид углерода, оксиды азота, твердые частицы (сажа), диоксид серы, углеводороды.

При выполнении всех вышеуказанных мероприятий влияние объекта в период строительства минимальное. Загрязнения сточными водами отсутствует (имеется биотуалет).

Все отходы образующиеся при строительстве системы водоснабжения будут складироваться на площадке строительства с последующим вывозом на свалку согласно договору с МСУ.

Место заложения буровых скважин будет привязываться к существующим дорогам, которые в достаточном количестве покрывают площадь работ. В связи с этим строительство дорог (подъездных путей) при производстве буровых работ настоящим проектом не предусматривается.

В местах бурения не предусматривается строительство складов ГСМ, т.к. бурение будет проводиться буровой установкой, которая укомплектована передвижными средствами снабжения ГСМ. Кроме того, в непосредственной близости имеются автозаправочные станции и не требуется устройство их в пределах площадки бурения скважины.

Производственные отходы собираются в металлические контейнеры для вывоза их с буровой площадки и захоронения в стационарной ловушке.

Буровые работы на территории водозабора ориентированы на минимальное воздействие на окружающую среду.

На территории строительства и прилегающих территориях не было обнаружено нахождения видов, занесенных в Красную книгу Кыргызстана.

Для минимизации вредного воздействия строительные работы будут производиться только в дневное время, строительная техника используется только в исправном состоянии. Исключается розлив и заправка ГСМ. Строительные работы производятся исключительно в пределах строительной площадки.

Вырубка деревьев не предвидится. Выемка и складирование плодородно-растительного слоя (ПРС) предусматривается в месте по согласованию с МСУ в соответствии со всеми требованиями направленными на сохранение ПРС.

При эксплуатации водозабора имеется надворный туалет. Сточные воды от туалета вывозятся на ближайшие очистные сооружения ассенизационными машинами. Согласно Закону Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 8.058.2009 №151 категория опасности водозабора по сбросам сточных вод II.

Выемка и складирование плодородно-растительного слоя (ПРС) предусматривается в месте по согласованию с МСУ в соответствии со всеми требованиями направленными на сохранение ПРС.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничений.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается от крайних скважин на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод.

Согласно проекту предусмотрено Раздел Охраны окружающей среды.

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями НИП 2.04.02-84 и Техническими условиями «Проектирование сельского водопровода».

При эксплуатации водозабора имеется надворный туалет. Сточные воды от туалеты вывозятся на ближайшие очистные сооружения ассенизационными машинами.

При эксплуатации системы водоснабжения отсутствует загрязнение атмосферного воздуха.

При эксплуатации водозабора образуются следующие отходы:

- отходы от уборки территории - 5 класс опасности
- отходы от персонала (ТБО) - 5 класс опасности

Все бытовые отходы складываются в специально отведенных местах с последующим вывозом в специализированные места согласованные с МСУ.

Согласно Закону Кыргызской Республики «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 8.05.2009 №151, категория опасности по образованию отходов равна III. В соответствии с Законом КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» (2012 г.) категория опасности для всех видов работ при строительстве водозабора:

- Категория опасности по выбросам - III категория
- Категория опасности по сбросам - II категория
- Категория опасности по отходам - II категория

Согласно проекту общий выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (неорганическая пыль, сварочный аэрозоль, оксиды марганца, оксиды железа, фтористый водород, Уайт спирт) составит 2,6096 т/год. С отработанными газами двигателей строительного и автотранспортного оборудования будут выделяться: оксид углерода, оксиды азота, твердые частицы (сажа), диоксид серы, углеводороды массой 2,313 т/год. При проведении строительных работ воздействие на поверхностные воды отсутствует. В результате строительной деятельности образуются отходы 3, 4 и 5 класса опасности массой 10,2021 т/время строительства. Производственные и токсичные отходы отсутствуют.

Нарушенных земель, подлежащих рекультивации, не имеется. Анализ почвы проводить нецелесообразно, так как большая часть территории отведена под строительные объекты.

Источников инфра - и ультразвуковых колебаний, и ионизирующего излучения нет.

Исходя из материалов и проведенных расчетов, можно сделать вывод, что строительство не окажет значительного воздействия на окружающую среду.

При строительных работах предусмотреть сохранение и отдельное складирование плодородного слоя почвы из земляных работах.

В строительных работах применять инертных материалов и камней из лицензионно-согласованных карьеров.

Для твердо-бытовых и других отходов предусмотреть специальные ямы с вывозом в ближайшие санкционированные свалки.

Не допускать загрязнения поверхностных, подземных вод и сносу зеленых насаждений без разрешений.

По окончании строительных работ рекультивировать использованные земельные участки согласно экологическим требованиям.

При оценке значимости воздействия объекта строительства на окружающую среду основанной на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений, проектируемый объект, характеризует воздействие, как воздействие низкой значимости (в пределах 1-8 баллов)

Строительные работы проводит с соблюдением требований согласно Законами по охране окружающей среды.

3. Вывод.

Рассмотрев представленные материалы, Государственная экологическая экспертиза Иссык-Куль-Нарынского регионального управления МПРЭТН выносит положительное заключение на Проект система водоснабжения для подпроекта «Жерге-Тал» Нарынского района Нарынской области, разработанный ОАО «Проектный институт «Кыргызгипрострой».

Инициатором проекта является: Жерге-Тал а/а

При этом необходимо Жерге-Тал а/а:

-перед началом работ уведомить Иссык-Куль-Нарынское региональное управление МПРЭТН;

-при строительстве и эксплуатации объекта соблюдать требования Законов по охране окружающей среды;

-после окончания строительных работ предоставить исходные данные для нормативных плат за загрязнение окружающей среды и своевременно оплатить.

В случае невыполнения заключения Государственной экологической экспертизы и проведения работ не по проектным решениям, заключение автоматически теряет силу.

Председатель экспертной комиссии,
заведующий отделом Государственной
экологической экспертизы:


Члены экспертной комиссии:

Главный специалист отдела ГЭЭ:

Главный специалист отдела ГЭЭ:


Н.Миназарова


К.Арстанбекова


Т.Акмалиев

Аналогичные Заключение Государственной экологической экспертизы получены и по селам Лама, Арал, Кичи-Арал, Чаек, Беш-Терек, Кочкор, Кара-Тоо, Исакеев, Молдо-Кылыч, Баево, Кайынды-Булак, Куланак и Учкун.

Приложение 2. Перечень основных документов по экологическим защитным мерам Программы по состоянию на 31 декабря 2025 года.

| № | Название документа | Подготовлен | Дата утверждения |
|----|--|-------------|--|
| | Основная документация: | | |
| 1. | PSSA/Детальная оценка систем защитных мер Программы. KGZ – 52256-001: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области | АБР, АРИС | июль 2019 года https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-ppsa-en_1.pdf |
| | Отчеты: | | |
| 2 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период август-декабрь 2020 года по Программе | АРИС | январь 2021 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-emr-en.pdf |
| 3 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2021 года по Программе | АРИС | Июль 2021 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-emr-en_1.pdf |
| 4 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2021 года по Программе | АРИС | Январь 2022 г. https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-emr-6 |
| 5 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2022 года по Программе | АРИС | Июль 2022 г. https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-emr-en_0.pdf |
| 6 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2022 года по Программе | АРИС | Январь 2023 г. https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/52256/52256-001-emr-en_2.pdf |
| 7 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2023 года по Программе | АРИС | Июль 2023 г. https://www.aris.kg/uploads/default/projects/e177a03cecc1871afc61e6bd8f043142.pdf https://www.aris.kg/uploads/default/projects/3f8d1bbaf859649dc70eaf5266ae8d5a.pdf |
| 8 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2023 года по Программе | АРИС | Январь 2024 г. https://www.aris.kg/projects/proektyprogrammy-aris/programma-razvitiya-selskogo-vodosnabzheniya-i-sanitarii-v-narynskoj-oblasti-prsvsno |

| | | | |
|--------------------------|---|------------|--|
| 9 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2024 года по Программе | АРИС | Июль 2024 г. https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-emr-5 |
| 10 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2024 года по Программе | АРИС | https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-emr-7 |
| 11 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период январь-июнь 2025 года по Программе | АРИС | https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-emr-8 |
| 12 | Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды за период июль-декабрь 2025 года по Программе | АРИС | https://www.adb.org/projects/documents/kgz-52256-001-emr-9 |
| Другие документы: | | | |
| 13 | <p>ПУОСКО для сел (СВВ): Жалгыз-Терек, Орто-Саз, Жан-Булак Молдо-Кылыч, Кочкор, Исакеев Орук-Там, Ак-Кыйя, Тош-Булак, Лама, Арал, Кичи-Арал Кара-Тоо, Чаек, Беш-Терек, Жерге-Тал (Ак-Талинский р-н) Баетово, Кайынды-Булак Жерге-Тал (Нарынского р-на), Куланак, Учкун Ат-Башы, Ак-Жар, Кызыл-Соок, Сары-Булун, Кен-Суу, Котур-Суу, Табылгы</p> <p>ПУОСКО для сел (ЛОС): Лама, Исакеев, Чаек (12 многоэтажные дома), Жерге-Тал (Ак-Талинский р-н)</p> | Подрядчики | <p>01.09.2022 г. 09.09.2022 г. 01.11.2022 г. 14.11.2022 г.</p> <p>17.01.2023 г. 03.07.2023 г.</p> <p>15.01.2024 г.</p> <p>04.02.2025 г.</p> <p>29.03.2024 г.</p> |
| 14 | Под-план по утилизации грунта для конкретных строительных объектов. | АРИС | 12.06.2023 г. |

Приложение 3. Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Ак-Кыя

Номер Проекта: KGZ 52256-001.

январь 2026 года

**КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ**

KGZ 52256-001: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (ПРСВСНО) (Номер кредита: 3854-KGZ (COL) Номер гранта: 0676-KGZ (SF))

Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Ак-Кыя Чет-Нурина айыл окмоту Нарынского района

Подготовлено: Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) для Кыргызской Республики и Азиатского банка развития (АБР).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Сокращения | 82 |
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 83 |
| 1.1 Преамбула..... | 83 |
| 1.2 Основная информация..... | 84 |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | 86 |
| 2.1 Описание проекта..... | 86 |
| 2.2 Расположение проектного участка | 87 |
| 2.3 Программные контракты и Управление..... | 88 |
| 2.4 Деятельность по проекту в течение отчетного периода..... | 89 |
| 2.5 Краткое изложение проблем, которые все еще открыты в ПОМОС (МРЖ и экологические несоответствия) | 94 |
| 2.5.1 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) | 94 |
| 2.5.2 Экологические несоответствия | 94 |
| 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР) | 95 |
| 3.1 Вырубка деревьев | 95 |
| 3.2 Снятие почвенно-растительного слоя..... | 95 |
| 3.3 Пылеподавление после обратной засыпки траншеи | 95 |
| 3.4 Строительные отходы..... | 95 |
| 3.5 Проживание рабочих..... | 95 |
| 3.6 Обзор визуального мониторинга, проведенного в течение отчетного периода | 95 |
| 3.7 Шум и вибрация, связанные с земляными работами..... | 96 |
| 4. ОБЗОР ТОГО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ МЕНЕЕ ХОРОШО ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | 97 |
| 5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 98 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|---|----|
| Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта (документ в оригинале) | 99 |
|---|----|

Сокращения

| | |
|---------------|--|
| АБР | - Азиатский банк Развития |
| КР | - Кыргызская Республика |
| АРИС | - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики |
| ДРПВВ | - Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| Программа | - Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области |
| МРЖ | - Механизм рассмотрения жалоб |
| МСУ | - Местное самоуправление |
| ООПТ | - Особо охраняемые природные территории |
| ПКР | - Правительство Кыргызской Республики |
| ППКР | - Постановление Правительства Кыргызской Республики |
| ПУОСКО | - План управления окружающей средой для конкретного объекта |
| ТБО | - Твердые бытовые отходы |
| ПСД | - Проектно-сметная документация |
| ООС | - Охрана окружающей среды |
| ВОР | - Ведомость объема работ |
| ГСМ | - Горюче-смазочные материалы |
| АО | - Айыл окмот |
| ППЗМ АБР 2009 | - Положения о Политике по Защитным Мерам АБР 2009 г. |
| ОСС, ОТ и ТБ | - Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности |
| м | - метр |
| ПОМОС | - Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула

1. Данный отчет представляет собой отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Ак-Кыя Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (Программа).
2. В качестве одной из приоритетных задач Кабинета Министров КР ставит создание надежной и успешно функционирующей системы в секторе сельского водоснабжения и санитарии.
3. В рамках Программы через Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) внедряется программный подход в реализации государственной политики и инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и санитарии. Данный программный подход предусматривает разработку мероприятий, готовые для реализации в расширенном масштабе и мультиплицирования с целью расширения воздействия и создания возможностей для финансирования со стороны доноров по развитию сектора водоснабжения и санитарии.
4. Программа, финансируемая Азиатским Банком Развития (АБР), вошла в программу направленных на развитие сельского водоснабжения и санитарии.
5. Целями Программы в сфере развития является оказание помощи КР в (i) достижение приемлемого уровня жизни для кыргызстанцев, и (ii) улучшение здоровья и повышение качества жизни, снижение неблагоприятных воздействий на окружающую среду к 2026 году. Ожидаемым результатом Программы станет инклюзивный и надежный доступ к безопасным службам ВСС в сельских населенных пунктах Нарынской области. На уровне воздействия Программа кредитование на основе результатов (КОР) соответствует цели Кабинета Министров КР по улучшению здоровья и качества жизни жителей и снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду к 2026 году.
6. Посредством реализации мероприятий по стратегическим объектам инфраструктуры и институциональной поддержке, эти программы сфокусируются на оказании помощи Кабинету Министров КР в разработке и реализации институциональных моделей для более качественного предоставления услуг в области сельского водоснабжения и санитарии.

Это позволит усилить потенциал соответствующих организаций на уровне сообществ, местных органов власти.

В рамках Программы будет также оказана поддержка по вопросам системы надзора, планирования, разработки политики и стратегии, а также консультационного потенциала государственных органов, работающих в секторе водоснабжения и санитарии.

7. ДРПВВ будет исполнять роль Исполнительного агентства по Программе и будет отвечать за общий мониторинг результатов Программы, АРИС будет Реализующим агентством.
8. Данный отчет по аудиту по завершенной строительной деятельности (PCEAR) охватывает период строительства системы водоснабжения в селе Ак-Кыя подпроекта «Ак-Кыя» в период с 7 июня 2023 года по 24 октября 2025 года в рамках реализуемой Программы.
9. **Основная задача** проведения пост-строительного аудита - определить, все ли природоохранные защитные меры были полностью реализованы и что нет вопросов, которые остаются нерешенными, что все обязательства, разработанные в процессе планирования подпроекта и оценки воздействия, полностью выполнены.
10. **Вторая задача** - предоставить информацию об извлеченных уроках, которая будет полезна для будущих подпроектов.

В данном отчете содержится информация о ходе работ, связанных с предотвращением воздействий на окружающую среду. Результаты основаны на многочисленных выездных посещениях объекта/подпроекта Ак-Кыя в период с июля 2023 года по октября 2025 года специалистом по мерам безопасности Программы.

1.2 Основная информация

11. Село Ак-Кыя Чет-Нурунского айыльного аймака Нарынского района Нарынской области расположено на расстоянии 15 км восточнее от города Нарын.
12. В сентябре 2021 года, специалистами ОАО «Кыргызгипрострой» совместно с представителями органов МСУ было проведено визуальное обследование существующих водозаборных сооружений села Ак-Кыя (см. Рисунок 1).

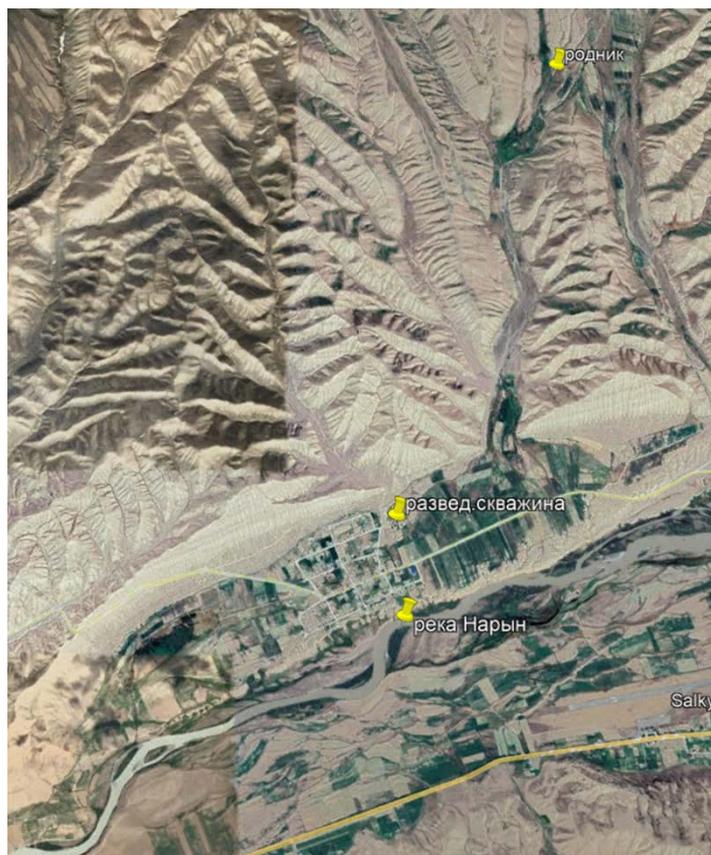


Рисунок 1. Ситуационный план села (п/п Ак-Кыйя, статус: сентябрь 2021 г.)

13. Согласно гидрогеологическому заключению на участок проектирования предполагаемого водозабора питьевого назначения для с. Ак-Кыйя указано, что для решения вопроса водоснабжения с. Ак-Кыйя необходимо бурение скважины на участке юго-восточнее от существующей разведочной скважины на 800 м.
14. Сотрудниками института совместно с представителями местного самоуправления была выбрана площадка под водозабор согласно выданных рекомендаций гидрогеологов.
15. **Категория окружающей среды.** Согласно классификации Положения АБР о Политике по Защитным Мерам от 2009 г. (ППЗМ АБР 2009) подпроект Ак-Кыйя относится к категории В. В связи с небольшим объемом работ воздействие на окружающую среду было локальным и ограничивалось этапом строительства проекта.
16. Реализуемый подпроект улучшает здоровья и повышает качества жизни местных жителей села Ак-Кыйя, снижает неблагоприятных воздействий на окружающую среду и обеспечивает надежный доступ к системе безопасного водоснабжения.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

2.1 Описание проекта

17. Категория земли, на которой расположена площадка водозабора - муниципальная.
18. Проектная документация разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и Технических условий «Проектирование системы сельского водоснабжения». ПСД для подпроекта Ак-Кыя подготовлена ОАО «Кыргызгипрострой» в 2022 году.
19. В составе ПСД разработан раздел «Охрана окружающей среды» для подпроекта Ак-Кыйя, где подробно описаны возможные воздействия на окружающую среду в период строительства (глава III) и возможные влияния на окружающую среду в период эксплуатации (глава IV).
20. Для подключения частных подворий в проектируемых водопроводных колодцах проектом предусмотрены гребёнки, которые рассчитаны на несколько подворий с установкой на них запорной арматуры и счетчиков учета воды.
21. Анализ работы системы водоснабжения населенного пункта начинается с определения суточного водопотребления всеми группами водопотребителей. Для определения расчетных расходов воды необходимо знать потребителей воды в данном населенном пункте и их количество к концу расчетного срока, а также нормы водопотребления для всех потребителей.
22. В сельских населенных пунктах основными водопотребителями является население, вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, поливку приусадебных участков, поение скота.
23. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах принимают в зависимости от степени оснащения зданий санитарно-гигиеническим оборудованием согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Технических условий (ТУ) КР «Проектирование сельского водопровода», выпущенных в 2010 г., и являющихся дополнением к СНиП 2.04.02-84*.
24. В расчёте учитывались нормы расхода воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков (принимается по ТУ КР, п.1.9).
При этом, с учетом повсеместного износа сельских водопроводных сетей, принимаем потери на утечки равные 10% (ТУ КР, п.1.3). При расчете принималась 100% обеспеченность жителей села водой.
25. Для сельских населенных мест на основании пункта 1.7 ТУ КР удельная норма водопотребления составляет 100 литров на человека в сутки.

26. С учетом перспективы развития на ближайшие 20 лет расчетная потребность в воде для подпроекта Ак-Кыя составит 156,02 м³/сутки, или 6,5 м³/час.
27. Таким образом, для решения вопроса водоснабжения села Ак-Кыя в объеме 6,5 м³/час пробурена новая скважина на участке юго-восточнее от существующей разведочной скважина на 800 м. На площадке водозабора установлена водонапорная башня.

2.2 Расположение проектного участка

28. Источником водоснабжения являются подземные воды из скважины. Согласно проекту пробурена новая скважина.
29. Технологическая схема водоснабжения села Ак-Кыя: глубинный насос из скважины подает исходную воду в напорно-регулирующую емкость (водонапорную башню), откуда она поступает в распределительную сеть села, пройдя цикл обеззараживания на бактерицидной установке. Схема водоснабжения поселка принята принудительно-напорная с использованием источников электроэнергии (насос первого подъема) (см. Рисунок 2).

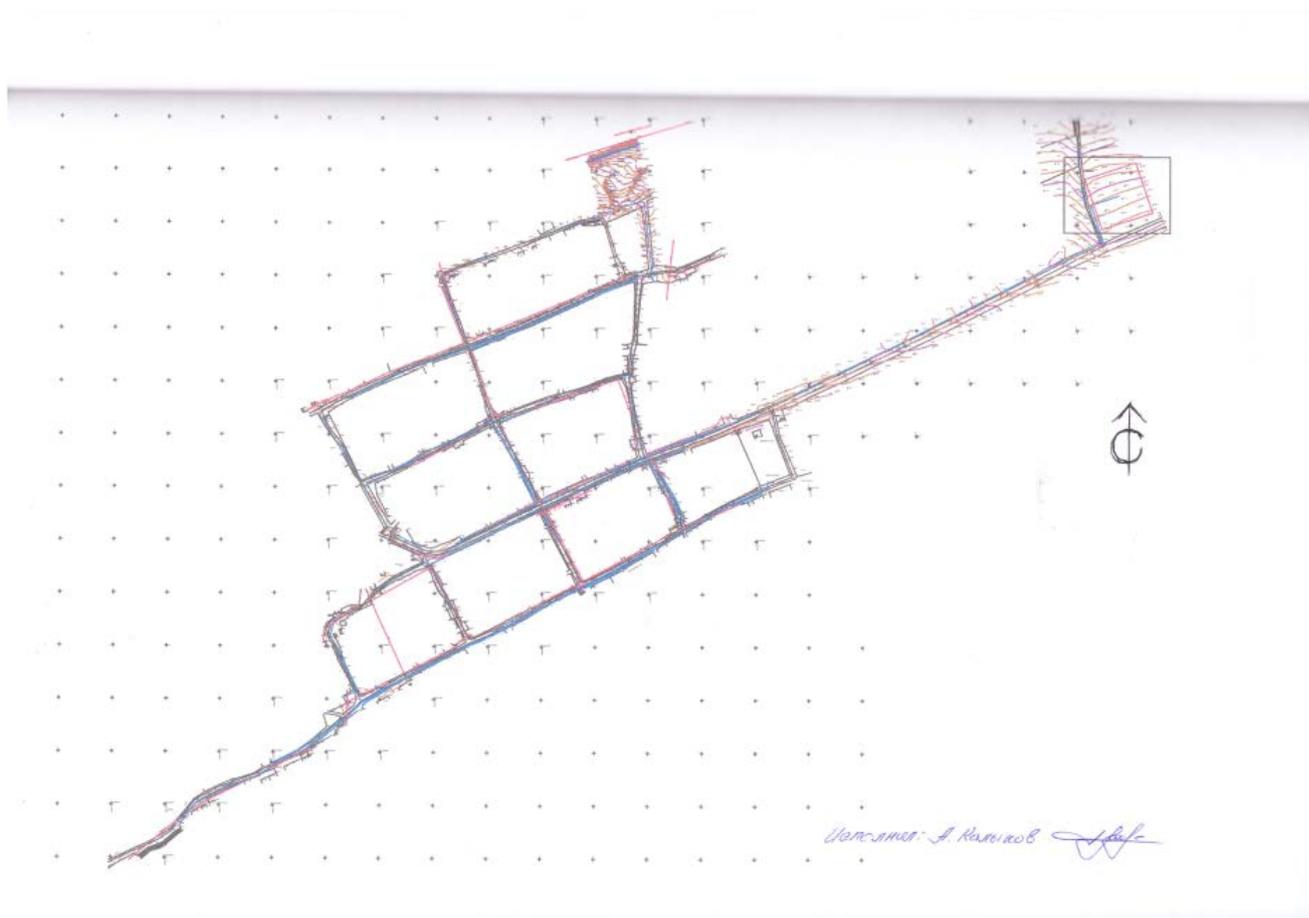


Рисунок 2. Схема системы водоснабжения села Ак-Кыя (п/п Ак-Кыйя, статус: октябрь 2022 г.)

2.3 Программные контракты и Управление

30. В июне месяце 2023 года в ходе тендерного процесса был выбран Подрядчик Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная Компания Шер-Курулуш» для строительства системы водоснабжения для подпроекта Ак-Кыя.

31. 7 июня 2023 года подписан контракт ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-03 между Чет-Нурунским АО и Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная Компания Шер-Курулуш» на общую сумму 59 926 389,60 сомов. Контракт завершен 24 октября 2025 года (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Основные партнеры по реализации подпроекта Ак-Кыя

| № | Донор | Заемщик / ОРП | | Подрядчик | Инженеры (руководители) | Основные виды работ |
|---|-------|--|----------------------------|--|---|---|
| | | Исполнительное агентство (ИА) | Реализующее агентство (РА) | | | |
| 1 | ADB | ДРПВВ при Министерстве водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР | АРИС | Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная Компания Шер-Курулуш» | Инженер по инфраструктуре (АРИС), Инженер по техническому надзору (АРИС) | Поселковая сеть водоснабжения из ПЭ труб 6225 м. В том числе из ПЭ труб 110 х 4,2 мм – 995 м и из ПЭ труб 90 х 3,5 мм – 5230 м. Установка ж.б. колодцы – 36 комплект. 1 новая скважина. Водонапорная башня с объемом 25 м ³ (Н = 24 м). Бактерицидная установка. Ограждение площадку водозабора. |

2.4 Деятельность по проекту в течение отчетного периода

32. Произведены земляные работы с разработкой грунта IV группы в траншеях экскаватором HUYNDAY ROBEX – 1400 W, методом «обратная лопата».

33. Площадь водозабора составляет 0,25 га. На площадке водозабора построены следующие сооружения (см. Фото 1):

- скважина;
- водонапорная башня с объемом 25 м³ (H = 24 м);
- здание сторожки с техническим помещением (см. Фото 2);
- уличная уборная с герметичным выгребом;
- ворота;
- ограда из проволочной сетки (высотой h = 2 м);
- гравийная дорога;
- Трансформаторная подстанция (КТП).



Фото 1. Объекты, расположенные на площадке водозабора (подпроект Ак-Кыйя, статус: октябрь 2024 г.)



Фото 2. Здание технического помещения, совмещенное со сторожкой
(п/п Ак-Кыйя, статус: сентябрь 2024 г.)

34. Обеззараживание исходной воды происходит при помощи УФ-облучения. Установлены бактерицидные установки производительностью 20 м³/час (1 – рабочая, 1 – резервная) (см. Фото 3).



Фото 3. Бактерицидные установки (с. Ак-Кыя, статус: ноябрь 2025 г.)

35. На площадке водозабора построен бетонный фундамент (выгреба) и устроена новая деревянная уборная для обслуживающего персонала (см. Фото 4).



Фото 4. Новая деревянная уборная для обслуживающего персонала
(п/п Ак-Кыя, статус: август 2024 г.)

36. К электрическим сетям подключено от комплектной трансформаторной подстанции (КТП), которая установлена на площадке водозабора (КТП 25/10/0,4) (см. Фото 5).



Фото 5. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) (село Ак-Кыя, статус: август 2025 г.)

37. Установлены железобетонные опоры, укомплектованные для воздушной линии - 0,4 кВ с линейной арматурой для проводов. Также установлены светильники уличные светодиодные, светильники с лампами люминесцентными.

38. На площадке водозабора создана зона санитарной охраны (ЗСО) с площадью 0,25 га в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

39. На площадке водозабора установлены ворота распашные и калитка с установкой столбов металлических.
40. Произведена гравийная дорога на участке водозабора.
41. На площадке водозабора и на улицах села не обнаружены изделия из асбеста.
42. В целях ограничения доступа посторонних лиц и животных, по периметру площадки водозабора и резервуара установлены ограда на металлическом каркасе по металлическим стойкам-опорам из сетки «рабицы» высотой 2 м.
43. Прокладка сетей водопровода произведена с восстановлением дорожного покрытия и ирригационных сетей.
44. Произведена укладка водоводов (995 м) и распределительной сети (5230 м) из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием (всего - 6225 м).
45. Установлены сборные железобетонные круглые водопроводные колодцы с водоразборными узлами (гребенками) и запорно-регулирующей арматурой в количестве 36 шт. На водопроводные колодцы установлены чугунные люки.
46. Для выполнения внутридворовых (внутридомовых) подключений к сети водоснабжения, были установлены водопроводные колодцы установлены через каждые 75 м.
47. Экологическое воздействие в результате строительства системы водоснабжения подпроекта Ак-Кыя не были, т.к. основная часть строительных работ осуществлялась вдоль существующей полосы отвода.
48. Подрядчик обеспечил рабочих защитной спецодеждой.
49. В процессе земляных работ Подрядчиком:
- траншеи укреплены защитными щитами от обвала грунта,
 - установлены переходные мостики с поручнями и переносные лестницы,
 - в целях ограничения доступа людей и животных изготовлены и установлены по периметру траншей в населенном пункте защитные переносные ограждения высотой 1,6 м,
 - установлены светоотражательные предупредительные знаки и сигнальные ленты.

50. Подрядчик разработал План управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО) для подпроекта «Ак-Кыя», и специалист по мерам безопасности утвердил ПУОСКО 1 ноября 2022 года.
51. ПУОСКО для подпроекта Ак-Кыя проинформирован на общественных слушаниях 10 ноября 2022 года. На общественных слушаниях также утверждены подпроект Ак-Кыя и проектные решения (см. Фото 4, Фото 5, Фото 6).



Фото 4. Информирование ПУОСКО (п/п Ак-Кыя, статус: ноябрь 2022 г.).



Фото 5. Информирование подпроекта и проектных решений (п/п Ак-Кыя, статус: ноябрь 2022 г.).



Фото 6. Утверждение проектных решений (п/п Ак-Кыя, статус: ноябрь 2022 г.).

2.5 Краткое изложение проблем, которые все еще открыты в ПОМОС (МРЖ и экологические несоответствия)

2.5.1 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

52. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был разработан для своевременного и надлежащего удовлетворения обращений, жалоб и запросов жителей.

Во время общественного слушания люди, подверженные воздействию проекта, были полностью проинформированы о своих правах и о процедурах рассмотрения жалоб, поданных в устной или письменной форме.

Подрядчиком был изготовлен баннер для подпроекта Ак-Кыя, где указаны контактные данные центрального офиса АРИС, Механизм обратной связи (МОС) АРИС и Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная Компания Шер-Курулуш».

53. **Журнал МРЖ.** Журнал МРЖ ввелся со стороны прораба Подрядчика Консорциум: ОсОО «ЭКАРАС-5» и ОсОО «Строительная Компания Шер-Курулуш» с начала строительно-монтажных работ (СМР) в подпроекте Ак-Кыя.

Прораб Подрядчика является ответственным по ООС, ОТ и ТБ.

54. По состоянию на 24 октября 2025 года жалобы и предложения от местного населения не были, а были только положительные отзывы в журнале замечаний и предложений.

55. Необходимо отметить, что во всех подпроектах Программы, где производятся строительно-монтажные работы (СМР), функционирует МРЖ.

2.5.2 Экологические несоответствия

56. Экологических несоответствий нет.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)

57. Выполнены необходимые мероприятия по закрытию подпроекта Ак-Кыя (см. Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта).

3.1 Вырубка деревьев

58. Вырубка деревьев за отчетный период не была.

3.2 Снятие почвенно-растительного слоя

59. Снятие почвенно-растительного слоя за отчетный период не было.

3.3 Пылеподавление после обратной засыпки траншей

60. В целях предупреждения пылеобразования Подрядчиком после обратной засыпки траншеи опрыскивались водой строительная площадка, грунтовые дороги и улицы села Ак-Кыя.

3.4 Строительные отходы

61. Во время выполнения строительных работ строительные отходы были собраны и утилизированы в мусорную свалку АО.

3.5 Проживания рабочих

62. Специалисты и рабочие Подрядчика проживали в доме местного жителя села Ак-Кыя. В доме имеется кухонный блок, оборудованное место для приема пищи, умывальники и туалеты.

3.6 Обзор визуального мониторинга

63. В течении отчетного периода проводился регулярный визуальный мониторинг за соблюдением требований природоохранного законодательства КР и требований ПУОСКО подпроекта Ак-Кыя.

Визуальный мониторинг проводился специалистом по мерам безопасности Программы, с участием консультанта/инженера по техническому надзору (ИТН) и прораба Подрядчика ответственного по ООС, ОТ и ТБ.

64. По итогам визуальных мониторингов составлялись Чек-листы по мониторингу и надзору строительных работ (№ 1 от 12.07.2023 г., № 2 от 24.08.2023 г., № 3 от 26.09.2023 г., № 4 от 25.10.2023 г., № 5 от 21.11.2023 г. № 6 от 17.05.2024 г., № 7 от 27.06.2024 г., № 8 от 24.07.2024 г., № 9 от 15.08.2024 г., № 10 от 06.09.2024 г.).

В ежемесячном отчете ИТН также включены информации о соблюдении экологических защитных мер.

3.7 Шум и вибрация, связанные с земляными работами

65. В течении строительного периода регулярно проводился мониторинг шума и вибрации на участках ведения строительно-монтажных работ (СМР) подпроекта Ак-Кыя.

Проанализировав данные результатов проведенного мониторинга, учитывая данные фоновых уровней, строительные работы не оказывали значительного воздействия на окружающую среду.

4. ОБЗОР ТОГО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ МЕНЕЕ ХОРОШО ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

66. В настоящее время все необходимые действия по завершению проектной деятельности завершены. На протяжении всего строительного периода не отмечались факты несоблюдения техники безопасности. Со стороны специалиста по мерам безопасности Программы на постоянной основе проводился постоянный мониторинг на предмет выполнения требований ПУОСКО, охраны труда и техники безопасности. Проводились постоянные разъяснительные работы по технике безопасности.
67. Площадка водозабора системы водоснабжения села Ак-Кыя огорожена полностью для ограничения доступа посторонних лиц, детей и домашних животных.
68. Дороги и улицы села Ак-Кыя полностью восстановлены после завершения земляных работ.
69. Меры по смягчению последствий работ, описанные в ПУОСКО, являются достаточными. Примером передовой практики является адаптация ПУОСКО и увеличение интенсивности пылеподавления на строительных участках в связи с сухой и жаркой летней погодой.
70. Рекомендуется создать группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

71. Подрядчик в полной мере и своевременно выполнял природоохранные мероприятия, предусмотренные в ПУОСКО подпроекта Ак-Кыя и соблюдал нормы законодательства КР в сфере охраны труда рабочих, техники безопасности и пожарной безопасности.
72. Осмотрены все железобетонные водоразборные колодцы системы водоснабжения села Ак-Кыя. Домохозяйства подключены к системе водоснабжения села через счетчики учета потребляемой воды индивидуально.
73. Подключение частных домов выполнены за счет средств хозяев домовладений по согласованию со старостой села Ак-Кыя.
74. Подрядчиком ОсОО «ЭКАРАС-5» выполнены следующие мероприятия, отраженные в Таблице 4-1 ПУОСКО подпроекта Ак-Кыя:
- удалены все насыпи, обломки, мусор и временные сооружения (такие как навесы и туалеты), в которых больше нет необходимости;
 - все дороги и улицы восстановлены до первоначального состояния;
 - строительная участка очищена полностью, после проверки не имеются разливов таких веществ, как масло, ГСМ, краска и другие химикаты.
- В процессе строительных работах:
- не были нарушены коммуникации;
 - не были пострадавшие сооружения;
 - не были разрушены растительный покров;
 - не был создан лагерь, рабочие жили в доме местного жителя села Ак-Кыя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта (документ в оригинале)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ, АРХИТЕКТУРА ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК
ЧАРБА МИНИСТЕРЛИГИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК АРХИТЕКТУРА-КУРУЛУШ КОНТРОЛДОО ДЕПАРТАМЕНТИНИН
НАРЫН РЕГИОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АРХИТЕКТУРА-КУРУЛУШ КОНТРОЛДОО
БАШКАРМАЛЫГЫ

НАРЫНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

*(Архитектура-курулуш иши чыгарында позамалдоо жана кыргыздоо боточо ийгарым укуктуу органдын
апталышы/ Наименование уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной
деятельности)*

БЕКТЕМИН

Нарын региондук мамлекеттик архитектура-
курулуш контролдоо башкармалыгынын
башчысы

С.С.Тыялебаев

№ 24

10

№

09-09-29-2/93



Курулушу аяктаган объекттин шайкенттиги баалоо жөнүндө
АКТЫСЫ

АКТ

об оценке соответствия завершеного строительством объекта

1. Заказчик (Заказчиком Чет-Нуринский айыл окуму

*(бүгүнкү иштин жана анын ведомствосуна баш ийүүсү/ наименование заказчика и ее ведомственная
подчиненность)*

объект шайкенттиги баалоого томонку объект карестулган/ предъявлен к оценке соответствия
объект:

«Строительство системы водоснабжения для подирекции «Ак-Кыя»

*объекттин аты жана курулушунун түрү (жана курулуш, реконструкция, профитин кайра калыптатуу,
кайра пландаштыруу/Наименование объекта и вид строительства, включая строительство, реконструкцию,
перепрофилирование, перестройку)*

дарегин боюнча /по адресу: Нарынской области, Нарынский район, Чет-Нуринский айыл окуму

Ак-Кыя
*(область, район калктуу кыуу, кичи район, квартал, мого, үйдүн (корпусунун) номери/ область, район и местной пункт,
микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))*

2. Объекттин курулушу мамлекеттик архитектура жана курулуш органы (анын аймактык
жана ведомстволук бөлүмдөрү, ошондой эле Бишкек шаарынын маанилүү ийгарым
укуктуу органы) тарабынан берилген макулданышкан долбоор менен ийгар куруу
корутундусунун, долбоордук-емгальик документтеринин мамлекеттик ийгарылыгынан
он корутундусуна ылайык ишке ашырылды/ Строительство объекта осуществлено
согласно градостроительному законодательству с согласованием проектом айданыш
государственным органом архитектуры и строительства (его территориальными и
подведомственными подразделениями, а также уполномоченным органом мэрии города

Бишкек), положительным заключением госэкспертизы проектно- сметной документации;

№ ГЭ-00-1-1-359-э-22 Департамента государственной экспертизы

(№ плана работы, органы аттестации плана работы/исполнителя/баш и/услуг и дата, наименование органа, и ее ведомственная подчиненность)

3. Курулуштун башкы подрядчысы/Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ОсОО Экарас-5, лицензия серии КРП-2 №03816 от 11.05.2011г. консорциум ОсОО «СК Шер Курулуш» лицензия серии КРП-1-2 №02130 от 11.04.2008г.

(Указом аттестации плана работы/исполнителя/баш и/услуг, лицензия/план работы берикен датасы/ наименование организации и ее ведомственная подчиненность, № лицензии и дата выдачи)

4. Курулуштун долбоордук документтери иштелип чыкты/ Проектная документация и строительство разработана:

ОАО "КЫРГЫЗГИПРОСТРОЙ" лицензия КРП-1-2 №00883 от 09.08.2004г.

(Указом аттестации плана работы/исполнителя/баш и/услуг, долбоордук ДБА жана ДБИ лицензия, сертифицированные наименование организации и ее ведомственная подчиненность, лицензия, сертификат ГАП и ГПД ар-сына)

5. Макулдашылган долбоор менен шаар куруу корутундусу берген/ Градостроительное заключение с согласованным проектом выдано:

Нарынский районным управлением по градостроительству и архитектуре №023 от 13.05.2022г.

(Архитектурный план курулуштун макулдаштырган органы (аттестация/план работы/исполнителя/баш и/услуг, указом/план Бишкек шаарынын мэриясынын кызматы куруу органынын аттестация/указом/наименование государственного органа архитектуры и строительства (если территориального и подведомственного подразделения, а также указывающегося органа мэрии города Бишкек)

6. Долбоордук документтер бекитилди жана макулдашылды/ Проектная документация утверждена и согласована: главным архитектором Нарынского района

(объектная документтерин бекиткен (кайра бекиткен) органы аттестация/лицензия/план работы/ утвержденного (перепроверяется) документацию на объект)

7. Курулуш жүргүзүлгөн мөөнөт/ Строительство осуществлено в сроки:

Курулуштун башталышы/Начало строительства: июнь месяц 2023г.

Курулуштун аякталышы/Окончание строительства: октябрь месяц 2025г.

8. Нарынского регионального управления государственного архитектурно-строительного контроля Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля Министерства строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

Архитектура-куруу үчүн чейрөсүндө келгилдей жана кантарадык бөлүмүнө берилген указом/ аттестация/ Наименование уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности

томонку долбоордук-сметалык документтер (инж-корумалору берилди/ представлены копии следующей проектно-сметной документации:

- 1) акты, свидетельствующие о завершении и приемке всех этапов строительства, журнал авторского надзора и журналы производства работ;
- 2) исполнительно-техническая документация (исполнительные съемки, акты скрытых работ);
- 3) акты испытаний смонтированного инженерно-технологического оборудования;
- 4) лабораторные заключения на ответственные конструкции;
- сертификаты на строительные материалы, конструкции и изделия;

б) справка о стоимости выполненных работ, подписанная заказчиком и генеральным подрядчиком.

(Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигинин 2025 – жылдын 2-августундагы № 93-НПА буйругу менен бекитилген Жобонун 130-пункта на ылайык документтердин аталышы/наименование документов в соответствии с п.130 Положения, утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики от 2 июля 2025 года № 93-НПА.)

9. Шайкештикти баалоо үчүн көрсөтүлгөн объект кубаттуулуктун, өндүрүмдүүлүктүн, өндүрүштүк аянттын, узундуктун, сыйымдуулуктун, көлөмдүн, өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн, ташуу жөндөмдүүлүгүнүн, жумуш орундарынын ж. б. негизги көрсөткүчтөрүнө ээ (бардык объекттер боюнча (көп кабаттуу турак үйлөрдөн тышкары) максаттуу продукцияга же кызмат көрсөтүүнүн негизги түрлөрүнө ылайык алчалоо бирдиктеринде толтурулат):

Предъявленный для оценки соответствия объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме многоэтажных жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Аталышы/наименование | Өлчөө бирдиги/Ед. измер | Проект боюнча/ По проекту | | Факт боюнча/Фактически | |
|---|---|-------------------------|--|---|--|---|
| | | | Жалпы (мурда кабыл алынгандарды эске алуу менен)/ Общая (с учетом ранее принятых) | Анын ичинде ишке киргизүү комплекси же кезек/ В т.ч. пуското комплекс или очереди | Жалпы (мурда кабыл алынгандарды эске алуу менен)/ Общая (с учетом ранее принятых) | Анын ичинде ишке киргизүү комплекси же кезек/ В т.ч. пуското комплекс или очереди |
| 1 | Скважина с дебитом | л/с | 1,8 | | 1,8 | |
| 2 | Водонапорная башня V=25 м ³ H=24 м | м ³ | 25 | | 25 | |
| 3 | Водопроводные сети (L=6225 м) в.т.ч. из ПЭ труб 110x4.2 мм – 995м; из ПЭ труб | м | 6225 | | 6225 | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| 90x3.5 мм – 5230м. | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

Шайкештикти баалоо үчүн көрсөтүлгөн көп кабаттуу турак үйдүн төмөнкү көрсөткүчтөрү бар (көп кабаттуу турак үйлөр ишке киргизилгенде гана толтурулат)/ Предъявления для оценки соответствия многоквартирный жилой дом имеет следующие показатели (заполняется только при вводе многоквартирных жилых домов)

| КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ/ПОКАЗАТЕЛИ | Өлчөө бирдиги/ Ед. измер | Проект боюнча/по проекту | Факт боюнча/ фактически |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Жалпы аянты /Общая площадь | кв.м. | | |
| Кабаттардын саны/Число этажей | Кабат/этаж | | |
| Имараттардын саны/ Количество зданий | бирдик/шт | | |
| Курулуштун жалпы көлөмү/Общий строительный объем | куб.м. | | |
| Анын ичинде жер астындагы/ В.т.ч. подземной части | кв.м. | | |
| Орнотулган, тиркелген жайлардын аянты/ Площадь встроенных, пристроенных помещений | кв.м. | | |
| Турак эмес жайлар/Нежилые помещений, | | | |
| Паркинг | | | |

| Көрсөткүчтөрү/ Показатели | Проект боюнча/по проекту | | | | Факт боюнча/Фактически | |
|---|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | Батирлердин саны/ число квартир | батирлердин аянты м2/площадь квартир м ² | | Батирлердин саны/ число квартир | батирлердин аянты м2/площадь квартир м ² | |
| | | Жалпы/ общая | Турак жай/ Жилая | | Жалпы/ общая | Турак жай/ Жилая |
| Бардык батирлер, анын ичинде/ Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| Бир бөлмөлүү/ Однокомнатных | | | | | | |
| Эки бөлмөлүү/ Двухкомнатных | | | | | | |
| Үч бөлмөлүү/ Трехкомнатных | | | | | | |
| Төрт бөлмөлүү/ | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Четырехкомнатных | | | | | | |
| Андан ашык/и болес | | | | | | |

10. Долбоордо каралган эмгекти коргоо, жарылуу коопсуздугун, өрт коопсуздугун камсыз кылуу, айлана-чөйрөнү коргоо жана сейсмикага каршы иш-чаралар / Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(Аткаруу эсепинде маалымат берилеби же көрсөтүлбөсү)

11. Кызматтар жана уюмдар менен макулдашылган муздак жана ысык суу менен жабдуунун, канализациянын, жылуулук менен жабдуунун, газ менен жабдуунун, энергия менен жабдуунун тышкы тышкы коммуникациялары (курулуш долбооруна ылайык керектүүсүн белгилөө)/ Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, согласованные службами и организациями (отметить необходимое согласно проекта строительства):

12. Имараттарга кирүүчү жолдорду, тротуарларды, чарбалык, оюн жана спорт аянтчаларын жашылдандыруу, үстүнкү катмардын куруу, ошондой эле имараттардын фасадынын элементтерин жасалгалоо боюнча иштер долбоорго ылайык аткарылууга тийиш/ Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены согласно проекта

Өзгөчө талаптар/ Особые условия:

Экологиялык жана технологиялык ченемдерди сактабагандык үчүн жоопкерчиликти эксплуатациялоочу тарап тартат/ За несоблюдение экологических и технологических норм ответственность несет эксплуатирующая сторона.

13. Пайдаланууга кабыл алынуучу негизги фонддордун сметалык наркы/ Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию.

(Смета объектов жана муниципалдык объекттер үчүн ээни толтурушат / заполняется только ээ, государственных и муниципальных объектов)

Жалпы/всего 49 138,126 миң сом/тыс. сом

Анын ичинде курулуш-монтаждоо иштери/в том числе строительно-монтажных работ 49 138,126 миң сом/тыс. сом

Жабдуунун, шаймандар жана инвентарлар/оборудования, инструмента и инвентары _____ миң сом/тыс. сом

ЧЕЧИМ

РЕШЕНИЕ:

Объект:

«Строительство системы водоснабжения для подпроекта «Ак-Кыя», село Ак-Кыя, Чет-Нуринского а/а, Нарынского района, Нарынской области

(объекттин аталышы жана жабыгачкап жери: облус, кыргызстандын району, калай район, кыргызстандын уюму (корпусунун) нумери)наименование объекта и местонахождение: область, район населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

эксплуатацияга кабыл алынышы/ принять в эксплуатацию объект

Шарт менен/ с условием: пайдалануу процессинде объекттин көлөмдүк-пландалык чечимдери жана пайдалануу эрежелери, өрт коопсуздугунун талаптары, санитардык-гигиеналык, экологиялык, жер жана башка мыйзамдардын талаптары бузулган учурда

жоопкерчиликти тапшырыкчы тартат/ в случае нарушения объемно-планировочных решений объекта и правил эксплуатации, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, земельных и иных требований Законодательства в процессе эксплуатации ответственность несет заказчик.

Эскертүү: "Бул кабыл алуу актысы кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо, кыймылсыз мүлк объектиси жайгашкан жердеги Кыргыз Республикасынан ыйгарым укуктуу каттоо органы тарабынан укуктардын реестрине өзгөрүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп саналат".

Примечание: «Данный акт приема является основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, внесение изменений в реестр прав уполномоченным регистрационным органом Кыргызской Республики по месту нахождения объекта недвижимости».

1. Заказчы/Заказчик

Уюмдун аталышы/ Название организации



Глава Чет-Нуриева
Айыл окмону Күлөнов Т.С.
Аты-жөнү жасамактуу Ф.И.О. и подпись

2. Дөлбоордун автору/ Автор проекта

Уюмдун аталышы/ Название организации



ОАО «КЫРГЫЗГИПРОСТРОЙ»
ГЭИ Путилов А.А.
Аты-жөнү жасамактуу Ф.И.О. и подпись

3. Подрядчык уюм /Подрядная организация

Уюмдун аталышы/ Название организации



ОсОО Экарас-5
директора Ибраймузов Э.К.
Аты-жөнү жасамактуу Ф.И.О. и подпись

**4. Инженер-кеңешчи (техникалык козгомуз)
Инженер-консультант (Технический надзор)**

Уюмдун аталышы/ Название организации



Омуралиев А.К.
Аты-жөнү жасамактуу Ф.И.О. и подпись

**5. Контроль жүргүзүүчү инспектор/
Инспектор, Осуществлявший
архитектурно-строительный контроль**

Уюмдун аталышы/ Название организации



А. Дроздобенов
Аты-жөнү жасамактуу Ф.И.О. и подпись

АТКАРЫЛГАН ИШТЕРДИН НАРКЫНЫН СПРАВКАСЫ
СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 10.05.2024 ж. №240 токтому менен бекитилген Жобонун 56-п 1-п.п ылайык пайдаланууга кабыл алынуучу негизги фонддордун сметалык наркы/ Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, согласно п. 56, п.п. 1 утвержденного постановлением Кабинета Министров КР от 10 мая 2024 года №240

Объектин аталышы жана дарэги/ наименование объекта и местонахождение
Чет-Нура айыл аймагынын, Ак-Кыя айылындагы «Суу менен камсыз кылуу тутукторунун топтомун куруу»

Жалпы/ всего 49 138,126 миң сом/ тыс. сом

Анын ичинде курулуш-монтаждоо иштери/в том числе строительно-монтажных работ
49 138,126 миң сом/ тыс. сом

Жабдуулар, шаймандар жана инвентарлар/ оборудования, инструмента и инвентаря
0,00 миң сом/ тыс. сом

Курулуштун заказчысы/ Заказчик строительства:

Чет-Нура АО башчысы Кулешов Т.С.



Подряддык уюм/Подрядная организация:

Экарас-5 ЖЧКсынын директору Ибраймакунов Э.К.





Приложение 4. Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Жерге-Тал

Номер Проекта: KGZ 52256-001.

январь 2026 года

**КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ**

KGZ 52256-001: Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (ПРСВСНО) (Номер кредита: 3854-KGZ (COL) Номер гранта: 0676-KGZ (SF))

Отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) для завершенного подпроекта Жерге-Тал Ала-Бугинского айыл окмоту Ак-Талинского района

Подготовлено: Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) для Кыргызской Республики и Азиатского банка развития (АБР).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Сокращения | 109 |
| 1. ВВЕДЕНИЕ..... | 110 |
| 1.1 Преамбула | 110 |
| 1.2 Основная информация..... | 111 |
| 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ..... | 113 |
| 2.1 Описание проекта..... | 113 |
| 2.2 Расположение проектного участка | 114 |
| 2.3 Программные контракты и Управление..... | 115 |
| 2.4 Деятельность по проекту в течение отчетного периода..... | 116 |
| 2.5 Краткое изложение проблем, которые все еще открыты в ПОМОС (МРЖ и экологические несоответствия) | 123 |
| 2.5.1 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) | 123 |
| 2.5.2 Экологические несоответствия | 123 |
| 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР) | 124 |
| 3.1 Вырубка деревьев | 124 |
| 3.2 Снятие почвенно-растительного слоя..... | 124 |
| 3.3 Пылеподавление после обратной засыпки траншеи..... | 124 |
| 3.4 Строительные отходы | 124 |
| 3.5 Проживание рабочих | 124 |
| 3.6 Обзор визуального мониторинга, проведенного в течение отчетного периода | 124 |
| 3.7 Шум и вибрация, связанные с земляными работами | 125 |
| 4. ОБЗОР ТОГО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ МЕНЕЕ ХОРОШО ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА | 126 |
| 5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 127 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию законченного строительством объекта (документ в оригинале) | 128 |
|--|-----|

Сокращения

| | |
|---------------|--|
| АБР | - Азиатский банк Развития |
| КР | - Кыргызская Республика |
| АРИС | - Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики |
| ДРПВВ | - Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» (ДРПВВ) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| Программа | - Программа развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области |
| МРЖ | - Механизм рассмотрения жалоб |
| МСУ | - Местное самоуправление |
| ООПТ | - Особо охраняемые природные территории |
| ПКР | - Правительство Кыргызской Республики |
| ППКР | - Постановление Правительства Кыргызской Республики |
| ПУОСКО | - План управления окружающей средой для конкретного объекта |
| ТБО | - Твердые бытовые отходы |
| ПСД | - Проектно-сметная документация |
| ООС | - Охрана окружающей среды |
| ВОР | - Ведомость объема работ |
| ГСМ | - Горюче-смазочные материалы |
| АО | - Айыл окмот |
| ППЗМ АБР 2009 | - Положения о Политике по Защитным Мерам АБР 2009 г. |
| ОСС, ОТ и ТБ | - Охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности |
| м | - метр |
| ПОМОС | - Полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула

1. Данный отчет представляет собой отчет об экологическом аудите после завершения строительства (пост-строительному) (PCEAR) для завершенного подпроекта Жерге-Тал Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области (Программа).
2. В качестве одной из приоритетных задач Кабинета Министров КР ставит создание надежной и успешно функционирующей системы в секторе сельского водоснабжения и санитарии.
3. В рамках Программы через Департамент «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ) внедряется программный подход в реализации государственной политики и инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и санитарии. Данный программный подход предусматривает разработку мероприятий, готовые для реализации в расширенном масштабе и мультиплицирования с целью расширения воздействия и создания возможностей для финансирования со стороны доноров по развитию сектора водоснабжения и санитарии.
4. Программа, финансируемая Азиатским Банком Развития (АБР), вошла в программу направленных на развитие сельского водоснабжения и санитарии.
5. Целями Программы в сфере развития является оказание помощи КР в (i) достижение приемлемого уровня жизни для кыргызстанцев, и (ii) улучшение здоровья и повышение качества жизни, снижение неблагоприятных воздействий на окружающую среду к 2026 году. Ожидаемым результатом Программы станет инклюзивный и надежный доступ к безопасным службам ВСС в сельских населенных пунктах Нарынской области. На уровне воздействия Программа кредитование на основе результатов (КОР) соответствует цели Кабинета Министров КР по улучшению здоровья и качества жизни жителей и снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду к 2026 году.
6. Посредством реализации мероприятий по стратегическим объектам инфраструктуры и институциональной поддержке, эти программы сфокусируются на оказании помощи Кабинету Министров КР в разработке и реализации институциональных моделей для более качественного предоставления услуг в области сельского водоснабжения и санитарии.

Это позволит усилить потенциал соответствующих организаций на уровне сообществ, местных органов власти.

В рамках Программы будет также оказана поддержка по вопросам системы надзора, планирования, разработки политики и стратегии, а также консультационного потенциала государственных органов, работающих в секторе водоснабжения и санитарии.

7. ДРПВВ будет исполнять роль Исполнительного агентства по Программе и будет отвечать за общий мониторинг результатов Программы, АРИС будет Реализующим агентством.
8. Данный отчет по аудиту по завершенной строительной деятельности (PCEAR) охватывает период строительства системы водоснабжения в селе Жерге-Тал подпроекта «Жерге-Тал» в период с 30 июня 2023 года по 24 октября 2025 года в рамках реализуемой Программы.
9. **Основная задача** проведения пост-строительного аудита - определить, все ли природоохранные защитные меры были полностью реализованы и что нет вопросов, которые остаются нерешенными, что все обязательства, разработанные в процессе планирования подпроекта и оценки воздействия, полностью выполнены.
10. **Вторая задача** - предоставить информацию об извлеченных уроках, которая будет полезна для будущих подпроектов.

В данном отчете содержится информация о ходе работ, связанных с предотвращением воздействий на окружающую среду. Результаты основаны на многочисленных выездных посещениях объекта/подпроекта Жерге-Тал в период с июля 2023 года по октября 2025 года специалистом по мерам безопасности Программы.

1.2 Основная информация

11. Село Жерге-Тал Ала-Бугинского айыльного аймака Ак-Талинского района Нарынской области расположено на расстоянии 200 км юго-западнее от города Нарын.
12. В сентябре 2021 года, специалистами проектного института ОсОО «ЭНКОН» совместно с представителями органов МСУ было проведено визуальное обследование существующих водозаборных сооружений села Жерге-Тал (см. Рисунок 1).

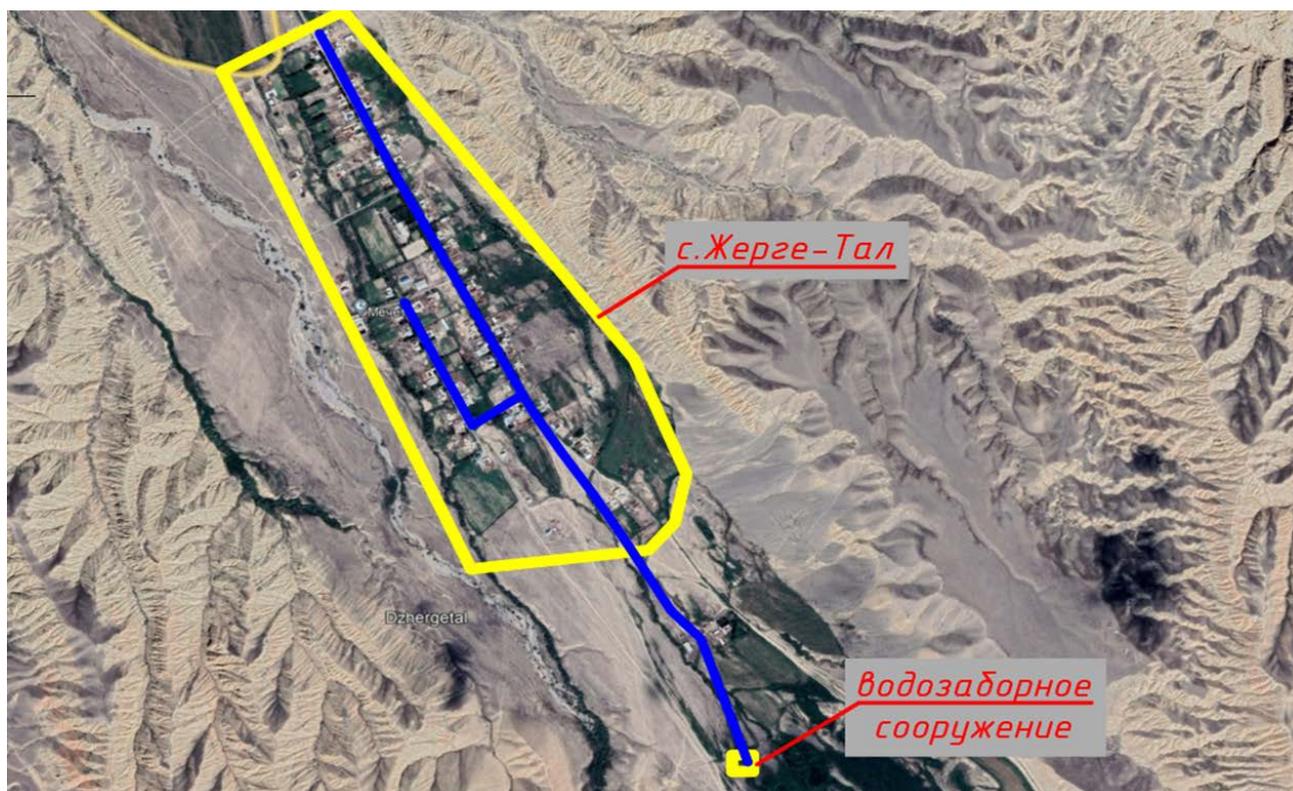


Рисунок 1. Ситуационный план села (п/п Жерге-Тал, статус: сентябрь 2021 г.)

13. На момент обследования в селе Жерге-Тал была централизованная система водоснабжения, построенная в 2011-2012 гг. Только 30% населения имели внутридворовые (внутридомовые) вводы. Остальные 70% пользовались водоразборными колонками.
14. Сотрудниками ОсОО «ЭНКОН» совместно с представителями местного самоуправления была выбрана площадка водозабора и площадка резервуара согласно выданных рекомендаций гидрогеологов.
15. **Категория окружающей среды.** Согласно классификации Положения АБР о Политике по Защитным Мерам от 2009 г. (ППЗМ АБР 2009) подпроект Жерге-Тал относится к категории В. В связи с небольшим объемом работ воздействие на окружающую среду было локальным и ограничивалось этапом строительства проекта.
16. Реализуемый подпроект улучшает здоровья и повышает качества жизни местных жителей села Жерге-Тал, снижает неблагоприятных воздействий на окружающую среду и обеспечивает надежный доступ к системе безопасного водоснабжения.

2 ПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

2.1 Описание проекта

17. Категория земли, на которой расположена площадка водозабора и площадка резервуара - муниципальная.
18. Проектная документация разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* и Технических условий «Проектирование системы сельского водоснабжения». ПСД для подпроекта Жерге-Тал подготовлена ОсОО «ЭНКОН» в 2022 году.
19. В составе ПСД разработан раздел «Охрана окружающей среды» для подпроекта Жерге-Тал, где подробно описаны возможные воздействия на окружающую среду в период строительства (глава III) и возможные влияния на окружающую среду в период эксплуатации (глава IV).
20. Для подключения частных подворий в проектируемых водопроводных колодцах проектом предусмотрены гребёнки, которые рассчитаны на несколько подворий с установкой на них запорной арматуры и счетчиков учета воды.
21. Анализ работы системы водоснабжения населенного пункта начинается с определения суточного водопотребления всеми группами водопотребителей. Для определения расчетных расходов воды необходимо знать потребителей воды в данном населенном пункте и их количество к концу расчетного срока, а также нормы водопотребления для всех потребителей.
22. В сельских населенных пунктах основными водопотребителями является население, вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, поливку приусадебных участков, поение скота.
23. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах принимают в зависимости от степени оснащения зданий санитарно-гигиеническим оборудованием согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и Технических условий (ТУ) КР «Проектирование сельского водопровода», выпущенных в 2010 г., который является дополнением к СНиП 2.04.02-84*.
24. В расчёте учитывались нормы расхода воды на полив зеленых насаждений и приусадебных участков (принимается по ТУ КР, п.1.9).

При этом, с учетом повсеместного износа сельских водопроводных сетей, принимаем потери на утечки равные 10% (ТУ КР, п.1.3). При расчете принималась 100% обеспеченность жителей села водой.

25. Для сельских населенных мест на основании пункта 1.7 ТУ КР удельная норма водопотребления составляет 100 литров на человека в сутки.
26. С учетом перспективы развития на ближайшие 20 лет расчетная потребность в воде для подпроекта Жерге-Тал составит 92,66 м³/сутки, или 3,86 м³/час.
27. Таким образом, для решения вопроса водоснабжения села Жерге-Тал из родника в объеме 3,86 м³/час необходимо построить каптаж родника на проектируемой площадке водозабора. Площадка резервуара расположена севернее от площадки водозабора.

2.2 Расположение проектного участка

28. Источником водоснабжения являются подземные воды из существующих нисходящих родников.
29. Согласно проекту построен каптажное сооружение на площадке водозабора.
30. Каптажные устройства (водосборные камеры) применяются для захвата подземной воды из родников. Каптажная камера выполнена из сборных железобетонных колец.
31. Технологическая схема водоснабжения села Жерге-Тал: из каптажа родника самотеком подает исходную воду в резервуар, откуда она поступает в распределительную сеть села, пройдя цикл обеззараживания на хлораторной (см. Рисунок 2).

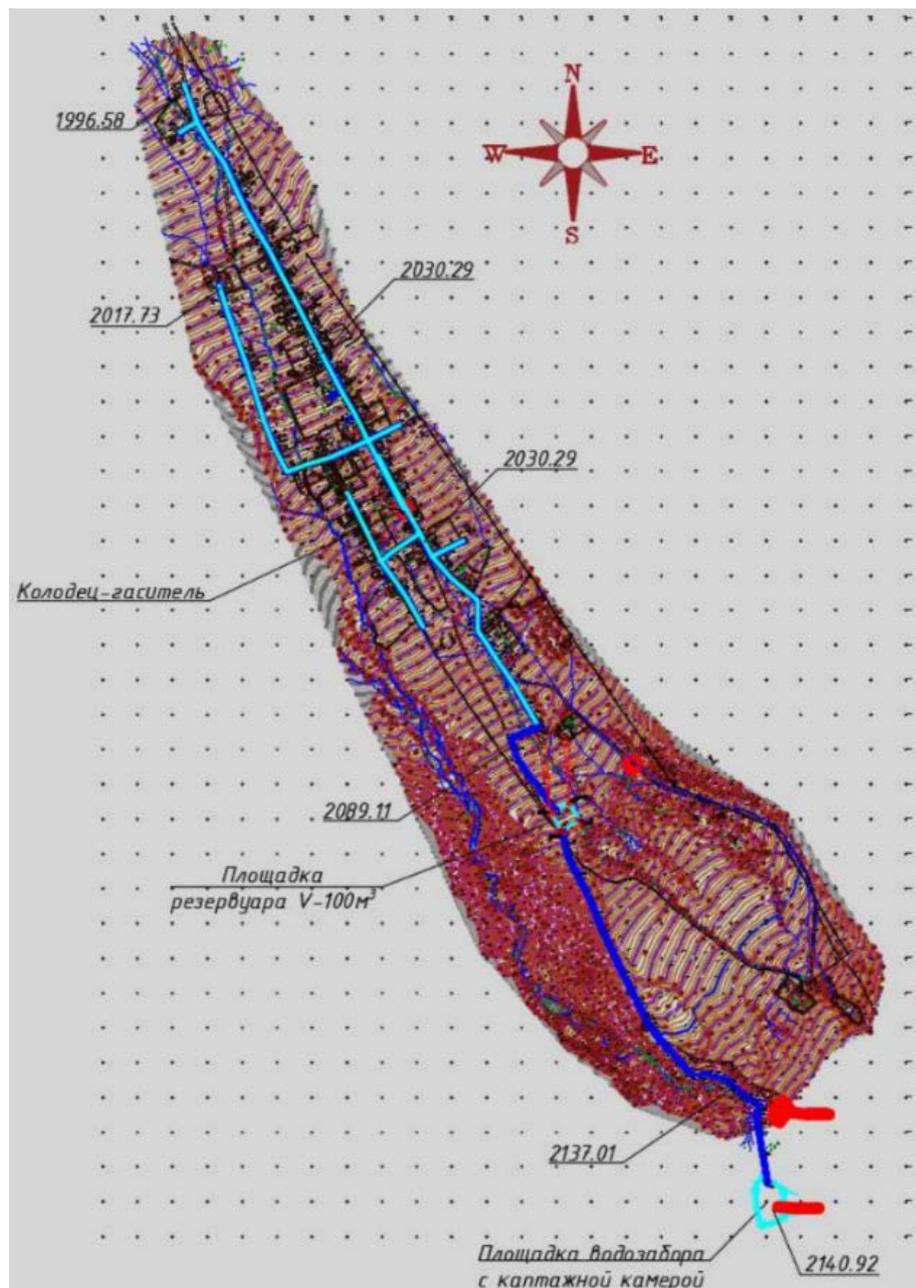


Рисунок 2. Схема системы водоснабжения с. Жерге-Тал (п/п Жерге-Тал, статус: октябрь 2022 г.)

2.3 Программные контракты и Управление

32. В июне месяце 2023 года в ходе тендерного процесса был выбран Подрядчик ОАО «Юг-Стройсервис» для строительства системы водоснабжения для подпроекта Жерге-Тал.
33. 30 июня 2023 года подписан контракт ARIS-ADB-NRWSSDP-CW-NCB-DLI-1-04 между Ала-Бугинским АО и Открытым Акционерным Обществом «Юг-Стройсервис» на общую сумму 30 904 214,70 сомов. Контракт завершен 24 октября 2025 года (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Основные партнеры по реализации подпроекта Жерге-Тал

| № | Донор | Заемщик / ОРП | | Подрядчик | Инженеры (руководители) | Основные виды работ |
|---|-------|--|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | Исполнительное агентство (ИА) | Реализующее агентство (РА) | | | |
| 1 | ADB | ДРПВВ при Министерстве водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР | АРИС | ОАО «Юг-Стройсервис» | Инженер по инфраструктуре (АРИС), Инженер по техническому надзору (АРИС) | Поселковая сеть водоснабжения из ПЭ труб 4950 м. Установка ж.б. колодцы – 36 комплект. Каптаж родника - 1. Резервуар монолитный ж.б. с объемом 100 м³. Хлораторный. Сторожка. Ограждение площадку водозабора и площадку резервуара. |

2.4 Деятельность по проекту в течение отчетного периода

34. Произведены земляные работы с разработкой грунта IV группы в траншеях экскаватором HUYNDAY ROBEX – 1400 W, методом «обратная лопата».
35. На площадке водозабора построены следующие сооружения (см. Фото 1):
- каптаж родника;
 - здание сторожки (см. Фото 2);
 - уличная уборная с герметичным выгребом;
 - ворота и ограда из проволочной сетки (высотой h = 2 м);
 - гравийная дорога.



Фото 1. Объекты, расположенные на площадке водозабора (п/п Жерге-Тал, статус: октябрь 2024 г.)



Фото 2. Здание сторожки (п/п Жерге-Тал, статус: сентябрь 2024 г.)

36. На площадке резервуара построены следующие сооружения (см. Фото 3).

- Резервуар монолитный ж.б. с объемом 100 м³;
- здание сторожки;
- здание хлораторной (см. Фото 4);
- уличная уборная с герметичным выгребом;
- ворота и ограда из проволочной сетки (высотой $h = 2$ м);
- гравийная дорога;
- Трансформаторная подстанция (КТП).



Фото 3. Объекты, расположенные на площадке резервуара (подпроект Жерге-Тал, статус: октябрь 2024 г.)



Фото 4. Здание хлораторной (с. Жерге-Тал, статус: август 2024 г.)



Фото 5. Резервуар монолитный ж.б. с объемом 100 м³ (с. Жерге-Тал, статус: август 2024 г.)



Фото 6. Здание сторожки (п/п Жерге-Тал, статус: сентябрь 2024 г.)

37. К электрическим сетям подключено от комплектной трансформаторной подстанции (КТП), которая установлена на площадке водозабора (КТП 25/10/0,4) (см. Фото 7).



Фото 7. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) (село Жерге-Тал, статус: август 2025 г.)

38. Установлены железобетонные опоры, укомплектованные для воздушной линии - 0,4 кВ с линейной арматурой для проводов. Также установлены светильники уличные светодиодные, светильники с лампами люминесцентными.
39. На площадке водозабора и на площадке резервуара созданы зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.
40. На площадке водозабора установлены ворота распашные и калитка с установкой столбов металлических.
41. Произведена гравийная дорога на участке водозабора.
42. На площадке водозабора и на улицах села не обнаружены изделия из асбеста.
43. В целях ограничения доступа посторонних лиц и животных, по периметру площадки водозабора и резервуара установлены ограда на металлическом каркасе по металлическим стойкам-опорам из сетки «рабицы» высотой 2 м.
44. Прокладка сетей водопровода произведена с восстановлением дорожного покрытия и ирригационных сетей.
45. Произведена укладка водоводов и распределительной сети из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием (всего - 4950 м).

46. Установлены сборные железобетонные круглые водопроводные колодцы с водоразборными узлами (гребенками) и запорно-регулирующей арматурой в количестве 36 шт. На водопроводные колодцы установлены чугунные люки.
47. Для выполнения внутридворовых (внутридомовых) подключений к сети водоснабжения, были установлены водопроводные колодцы установленные через каждые 75 м.
48. Экологическое воздействие в результате строительства системы водоснабжения подпроекта Жерге-Тал не были, т.к. основная часть строительных работ осуществлялась вдоль существующей полосы отвода.
49. Подрядчик обеспечил рабочих защитной спецодеждой.
50. В процессе земляных работ Подрядчиком:
- траншеи укреплены защитными щитами от обвала грунта,
 - установлены переходные мостики с поручнями и переносные лестницы,
 - в целях ограничения доступа людей и животных изготовлены и установлены по периметру траншей в населенном пункте защитные переносные ограждения высотой 1,6 м,
 - установлены светоотражательные предупредительные знаки и сигнальные ленты.
51. Подрядчиком разработан План управления окружающей средой для конкретного объекта (ПУОСКО) для подпроекта Жерге-Тал, и специалист по мерам безопасности Программы утвердил ПУОСКО 17 января 2023 года.
52. ПУОСКО для подпроекта Жерге-Тал проинформирован на общественных слушаниях 27 января 2023 года. На общественных слушаниях также утверждены подпроект Жерге-Тал и проектные решения (см. Фото 8, Фото 9, Фото 10).



Фото 8. Информирование ПУОСКО (п/п Жерге-Тал, статус: январь 2023 г.).



Фото 9. Информирование подпроекта и проектных решений (п/п Жерге-Тал, статус: январь 2023 г.).



Фото 10. Утверждение проектных решений (п/п Жерге-Тал, статус: январь 2023 г.).

2.5 Краткое изложение проблем, которые все еще открыты в ПОМОС (МРЖ и экологические несоответствия)

2.5.1 Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ)

53. Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) был разработан для своевременного и надлежащего удовлетворения обращений, жалоб и запросов жителей.

Во время общественного слушания люди, подверженные воздействию проекта, были полностью проинформированы о своих правах и о процедурах рассмотрения жалоб, поданных в устной или письменной форме.

Подрядчиком был изготовлен баннер для подпроекта Жерге-Тал, где указаны контактные данные центрального офиса АРИС, Механизм обратной связи (МОС) АРИС и ОАО «Юг-Стройсервис».

54. **Журнал МРЖ.** Журнал МРЖ ввелся со стороны прораба Подрядчика ОАО «Юг-Стройсервис» с начала строительного-монтажных работ в подпроекте Жерге-Тал.

Прораб Подрядчика является ответственным по ООС, ОТ и ТБ.

55. По состоянию на 24 октября 2025 года жалобы и предложения от местного населения не были, а были только положительные отзывы в журнале замечаний и предложений.

56. Необходимо отметить, что во всех подпроектах Программы, где производятся строительные-монтажные работы (СМР), функционирует МРЖ.

2.5.2 Экологические несоответствия

57. Экологических несоответствий нет.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (СМР)

58. Выполнены необходимые мероприятия по закрытию подпроекта Жерге-Тал (см. Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта).

3.1 Вырубка деревьев

59. Вырубка деревьев за отчетный период не была.

3.2 Снятие почвенно-растительного слоя

60. Снятие почвенно-растительного слоя за отчетный период не было.

3.3 Пылеподавление после обратной засыпки траншей

61. В целях предупреждения пылеобразования Подрядчиком после обратной засыпки траншеи опрыскивались водой строительная площадка, грунтовые дороги и улицы села Жерге-Тал.

3.4 Строительные отходы

62. Во время выполнения строительных работ строительные отходы были собраны и утилизированы в мусорную свалку АО.

3.5 Проживания рабочих

63. Специалисты и рабочие Подрядчика проживали в доме местного жителя села Жерге-Тал. В доме имеется кухонный блок, оборудованное место для приема пищи, умывальники и туалеты.

3.6 Обзор визуального мониторинга

64. В течении отчетного периода проводился регулярный визуальный мониторинг за соблюдением требований природоохранного законодательства КР и требований ПУОСКО подпроекта Жерге-Тал.

Визуальный мониторинг проводился специалистом по мерам безопасности Программы, с участием консультанта/инженера по техническому надзору (ИТН) и прораба Подрядчика ответственного по ООС, ОТ и ТБ.

65. По итогам визуальных мониторингов составлялись Чек-листы по мониторингу и надзору строительных работ (№ 1 от 22.08.2023 г., № 2 от 26.09.2023 г., № 3 от 25.10.2023 г., № 4 от 21.11.2023 г., № 5 от 15.05.2024 г. № 6 от 25.06.2024 г., № 7 от 23.07.2024 г., № 8 от 13.08.2024 г., № 9 от 05.09.2024 г., № 10 от 25.10.2024 г.).

В ежемесячном отчете ИТН также включены информации о соблюдении экологических защитных мер.

3.7 Шум и вибрация, связанные с земляными работами

66. В течении строительного периода регулярно проводился мониторинг шума и вибрации на участках ведения строительно-монтажных работ (СМР) подпроекта Жерге-Тал. Проанализировав данные результатов проведенного мониторинга, учитывая данные фоновых уровней, строительные работы не оказывали значительного воздействия на окружающую среду.

4. ОБЗОР ТОГО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО И ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ МЕНЕЕ ХОРОШО ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

67. В настоящее время все необходимые действия по завершению проектной деятельности завершены. На протяжении всего строительного периода не отмечались факты несоблюдения техники безопасности. Со стороны специалиста по мерам безопасности Программы на постоянной основе проводился постоянный мониторинг на предмет выполнения требований ПУОСКО, охраны труда и техники безопасности. Проводились постоянные разъяснительные работы по технике безопасности.
68. Площадка водозабора системы водоснабжения села Жерге-Тал огорожена полностью для ограничения доступа посторонних лиц, детей и домашних животных.
69. Дороги и улицы села Жерге-Тал полностью восстановлены после завершения земляных работ.
70. Меры по смягчению последствий работ, описанные в ПУОСКО, являются достаточными. Примером передовой практики является адаптация ПУОСКО и увеличение интенсивности пылеподавления на строительных участках в связи с сухой и жаркой летней погодой.
71. Рекомендуется создать группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

72. Подрядчик в полной мере и своевременно выполнял природоохранные мероприятия, предусмотренные в ПУОСКО подпроекта Жерге-Тал и соблюдал нормы законодательства КР в сфере охраны труда рабочих, техники безопасности и пожарной безопасности.
73. Осмотрены все железобетонные водоразборные колодцы системы водоснабжения села Жерге-Тал. Домохозяйства подключены к системе водоснабжения села через счетчики учета потребляемой воды индивидуально.
74. Подключение частных домов выполнены за счет средств хозяев домовладений по согласованию со старостой села Жерге-Тал.
75. Подрядчиком ОАО «Юг-Стройсервис» выполнены следующие мероприятия, отраженные в Таблице 4-1 ПУОСКО подпроекта Жерге-Тал:
- удалены все насыпи, обломки, мусор и временные сооружения (такие как навесы и туалеты), в которых больше нет необходимости;
 - все дороги и улицы восстановлены до первоначального состояния;
 - строительная участка очищена полностью, после проверки не имеются разливов таких веществ, как масло, ГСМ, краска и другие химикаты.

В процессе строительных работах:

- не были нарушены коммуникации;
- не были пострадавшие сооружения;
- не были разрушены растительный покров;
- не был создан лагерь, рабочие жили в доме местного жителя села Жерге-Тал.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. АКТ оценки соответствия, вводимого в эксплуатацию завершеного строительством объекта (документ в оригинале)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ, АРХИТЕКТУРА ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК АРХИТЕКТУРА-КУРУЛУШ КОНТРОЛДОО ДЕПАРТАМЕНТИНИ
НАРЫН РЕГИОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АРХИТЕКТУРА-КУРУЛУШ КОНТРОЛДОО
БАШКАРМАЛЫГЫ

НАРЫНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

(Архитектура-курулуш иши чыйрсында козомолдоо жана контролдоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын атагышы/ Наименование уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности)

БЕКТЕМИН
Нарын региондук мамлекеттик архитектура-курулуш контролдоо башкармалыгынын башчысы

С.С.Тиллебаев

(код, номер, Аты-Жыы)

« 24 » 10

№ 09-09-29-2/74



Курулушу аяктаган объекттин шайкештигин баалоо жонундо
АКТЫСЫ

АКТ

об оценке соответствия завершеного строительством объекта

1. Заказчы / Заказчиком Ала-Буга а/о ИНН 01506202310349

(ухмдун атагышы жана анын ведомстволук баш ийүүсү/ наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

объект шайкештикти баалоого төмөнкү объект көрсөтүлгөн/ предъявлен к оценке соответствия объект: Строительство системы водоснабжения

объектин атагышы жана курулуштун түрү (жаңы курулуш, реконструкциялоо, профилини кайра өзгөртүү кайра пландаштыруу/Наименование объекта и вид строительства, (новое строительство, реконструкция, перепрофилирование, перепланировка)

дарегин боюнча/по адресу: Ак-Талинский район село Жерге-Тал

(облусу, район калктуу конуш, кичи район, квартал, көчө, үйдүн (корпустун) номери)/ область, район населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Объектин курулушу мамлекеттик архитектура жана курулуш органы (анын аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрү, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органы) тарабынан берилген макулдашылган долбоор менен шаар куруу корутундусунун, долбоордук-сметалык документтеринин мамлекеттик экспертизасынын оң корутундусуна ылайык ишке ашырылды/ Строительством объекта

осуществлено согласно градостроительному заключению с согласованным проектом выданным государственным органом архитектуры и строительства (его территориальными и подведомственными подразделениями, а также уполномоченным органом мэрии города Бишкек), положительным заключением госэкспертизы проектно-сметной документации,;

ГЗ №143220914MRLG82 от 20.09.2022 г. Согласованный проект от 07.09.2022 г. ГЭ №00-1-91/22-22 от 16.11.2022 г.

(№ жана датасы, органы аталышы жана анын ведомстволук баш ийүүсү) № и дата, наименование органа, и ее ведомственная подчиненность)

3. Курулуштун башкы подрядчысы/Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ОсОО "Юг-Стройсервис" лиц. КРО-2 №05184 от 14.08.2013 г. ИНН 02710199310011

(уюмдун аталышы жана анын ведомстволук баш ийүүсү, лицензия алган жана берилген датасы/ наименование организации и ее ведомственная подчиненность, № лицензии и дата выдачи)

4. Курулуштун долбоордук документтери иштелип чыкты/ Проектная документация на строительство разработана:

ОсОО "Энкон" лиц. КРЦ-1-2 №010941 от 07.08.2023 ИНН 00211200610161

(уюмдун аталышы жана анын ведомстволук баш ийүүсү, долбоордун ДБА жана ДБН лицензиясы, сертификаты/ наименование организации и ее ведомственная подчиненность, лицензия, сертификат ГАП и ГИП проекта)

5. Макулдашылган долбоор менен шаар куруу корутундусу берген/ Градостроительное заключение с согласованным проектом выдано: Ак-Талинское районное управление по градостроительству и архитектуре ГЗ №143220914MRLG82 от 20.09.2022 г.

6. (Архитектуранын жана курулуштун мамлекеттик органынын (анын аймактык жана ведомстволук бөлүмчөсүнүн, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктуу органынын аталышы көрсөтүлсүн/ указать наименование государственного органа архитектуры и строительства (его территориального и подведомственного подразделения, и также уполномоченного органа мэрии города Бишкек)

6. Долбоордук документтер бекитилди жана макулдашылды/ Проектная документация утверждена и согласована: Ак-Талинское районное управление по градостроительству и архитектуре от 07.09.2022 г.

(объектин документтерин бекиткен (кайра бекиткен) органын аталышы/наименование органа, утвердившего (перутвердившего) документацию на объект)

7. Курулуш жүргүзүлгөн мөөнөт/ Строительство осуществлено в сроки:

Курулуштун башталышы/Начало строительства: «__» июнь 2024 ж. (г.)

Курулуштун аякташы/Окончание строительства: «__» сентябрь 2025 ж. (г.)

8. Нарынское региональное управление государственного архитектурно-строительного контроля

Архитектура-курулуш иши чөйрөсүндө көзөмөлдөө жана контролдоо бөлүмчө ыйгарым укуктуу органын аталышы/ Наименование уполномоченного органа по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности

төмөнкү долбоордук-сметалык документтердин көчүрмөлөрү берилди/ представлены копии следующей проектно-сметной документации:

площадка резервуара, площадка водозабора, водовод и распределительная сеть, общая пояснительная записка, охрана окружающей среды, технические спецификации инженерно-геологические и топографические изыскания – 7 альбома

(Кыргыз Республикасынын Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министрлигин 2025 – жылдын 2-августундагы № 93-НПА бүтүрүү менен бекитилген Жобонун 130-пункта на ылайык документтердин аталышы/наименование документов в соответствии с п.130 Положения, утвержденного приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики от 2 июля 2025 года № 93-НПА)

9. Шайкештикти баалоо үчүн көрсөтүлгөн объект кубаттуулуктун, өндүрүмдүүлүктүн, өндүрүштүк аянттын, узундуктун, сыйымдуулуктун, көлөмдүн, өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн, ташуу жөндөмдүүлүгүнүн, жумуш орундарынын ж. б. негизги көрсөткүчтөрүнө ээ (бардык объекттер боюнча (көп кабаттуу турак үйлөрдөн тышкары) максаттуу продукцияга же кызмат көрсөтүүнүн негизги түрлөрүнө ылайык өлчөө бирдиктеринде толтурулат):

Предъявленный для оценки соответствия объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме многоэтажных жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Аталышы / наименование | Өлчөө бирдиги/ Ед. измер | Проект боюнча/ По проекту | | Факт боюнча/Фактически | |
|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | Жалпы (мурда кабыл алынганда рды эске алуу менен)/ Общая (с учетом ранее принятых) | Анын ичинде ишке киргизүү Ү комплекси же кезек/ В т.ч. пускового комплекси или очереди | Жалпы (мурда кабыл алынганда рды эске алуу менен)/ Общая (с учетом ранее принятых) | Анын ичинде ишке киргизүү Ү комплекси же кезек/ В т.ч. пускового комплекси или очереди |
| 1 | Строительство системы водоснабжения в селе Жерге-Тал Ак-Талинского района | п/м | 4 950 | | п/м | 4 950 |
| | | Резервуар куб/м | 100 | | Резервуар куб/м | 100 |
| | | Хлораторный ед изм. м2 | 20 | | Хлораторный ед изм. м2 | 20 |
| | | Сторожка ед изм. м2, 2 шт | 20 | | Сторожка ед изм. м2, 2 шт | 20 |

Шайкештикти баалоо үчүн көрсөтүлгөн көп кабаттуу турак үйдүн төмөнкү көрсөткүчтөрү бар (көп кабаттуу турак үйлөр ишке киргизилгенде гана толтурулат)/ Предъявленный для оценки соответствия многоэтажный жилой дом имеет следующие показатели (заполняется только при вводе многоэтажных жилых домов)

| КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ/ПОКАЗАТЕЛИ | Өлчөө бирдиги/ Ед. измер. | Проект боюнча/по проекту | Факт боюнча/ фактически |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Жалпы аянты /Общая площадь | п/м | 4950 | 4950 |
| Кабаттардын саны/Число этажей | Кабат/этаж | - | - |
| Имараттардын саны/ Количество зданий | Бирдик/шт | - | - |
| Курулуштун жалпы көлөмү/Общий строительный объем | куб.м. | - | - |
| Анын ичинде жер астындагы/ В.т.ч. подземной части | кв.м. | - | - |
| Орнотулган, тиркелген жайлардын аянты/ Площадь встроенных, пристроенных помещений | кв.м. | - | - |
| Турак эмес жайлар/Нежилые помещений, | | - | - |
| Паркинг | | - | - |

| Көрсөткүчтөрү/ Показатели | Проект боюнча/по проекту | | | | Факт боюнча/Фактически | |
|--|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | Батирлердин саны/ число квартир | батирлердин аянты м2/площадь квартир м ² | | Батирлердин саны/ число квартир | батирлердин аянты м2/площадь квартир м ² | |
| | | Жалпы/ общая | Турак жай/ Жилая | | Жалпы/ общая | Турак жай/ Жилая |
| Бардык батирлер, анын ичинде/ Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| Бир бөлмөлүү/ Однокомнатных | | | | | | |
| Эки бөлмөлүү/ Двухкомнатных | | | | | | |
| Үч бөлмөлүү/ Трехкомнатных | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Төрт бөлмөлүү/ Четырехкомнатных | | | | | | |
| Андан ашык/и болсө | | | | | | |

10. Долбоордо каралган эмгекти коргоо, жарылуу коопсуздугун, өрт коопсуздугун камсыз кылуу, айлана-чөйрөнү коргоо жана сейсмикага каршы иш-чаралар / Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(Аткаруу жөнүндө маалымат сведения о выполнении)

11. Кызматтар жана уюмдар менен макулданылган муздак жана ысык суу менен жабдуунун, канализациянын, жылуулук менен жабдуунун, газ менен жабдуунун, энергия менен жабдуунун тышкы тышкы коммуникациялары (курулуш долбооруна ылайык керектүүсүн белгилөө)/ Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, согласованные службами и организациями (отметить необходимое согласно проекта строительства):

12. Имараттарга кирүүчү жолдорду, тротуарларды, чарбалык, оюн жана спорт аянтчаларын жашылдандыруу, үстүнкү катмарын куруу, ошондой эле имараттардын фасадынын элементтерин жасалгалоо боюнча иштер долбоорго ылайык аткарылууга тийиш/ Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасада зданий должны быть выполнены согласно проекта

Өзгөчө талаптар/ Особые условия:

Экологиялык жана технологиялык ченемдерди сактабагандык үчүн жоонкерчиликти эксплуатациялоочу тарап тартат/ За несоблюдение экологических и технологических норм ответственность несет эксплуатирующая сторона.

13. Пайдаланууга кабыл алынуучу негизги фонддордун сметалык наркы/ Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию.

(мамлекеттик жана муниципалдык объекттер үчүн гана толтурулат / заполняется только для государственных и муниципальных объектов)

Жалпы/ всего _____ миң сом/ тыс. сом

Анын ичинде курулуш-монтаждоо иштери/в том числе строительно-монтажных работ _____ миң сом/ тыс. сом

Жабдуулар, шаймандар жана инвентарлар/ оборудования, инструмента и инвентаря _____ миң сом/ тыс. сом

ЧЕЧИМ / РЕШЕНИЕ:

Объект: Строительство системы водоснабжения в селе Жерге-Тал Ак-Талинского района
(объекттин аталышы жана жайгашкан жери: облус, калктуу конуш району, кичи район, квартал, көчө, үйдүн (корпусун) номери/наименование объекта и месторасположение: область, район населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
_____ эксплуатацияга кабыл алынып/принять в эксплуатацию объект

Шарт менен/ с условием: пайдалануу процессинде объекттин колөмдүк-пландык чечимдери жана пайдалануу эрежелери, өрт коопсуздугунун талаптары, санитардык-гигиеналык, экологиялык, жер жана башка мыйзамдардын талаптары бузулган учурда жоопкерчиликти таанырыкчы тартат/ в случае нарушения объемно-планировочных решений объекта и правил эксплуатации, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических, земельных и иных требований Законодательства в процессе эксплуатации ответственность несет заказчик.

Эскертүү: "Бул кабыл алуу актысы кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо, кыймылсыз мүлк объектиси жайгашкан жердеги Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу каттоо органы тарабынан укуктардын реестрине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп саналат".

Примечание: «Данный акт приемки является основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, внесение изменений в реестр прав уполномоченным регистрационным органом Кыргызской Республики по месту нахождения объекта недвижимости».

1. Заказчы/Заказчик

Ата Буя А/О Ташкыс
Уюмдун аталышы/ Название организации


Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись



2. Долбоордун автору/ Автор проекта


ООО "Экон"
Уюмдун аталышы/ Название организации


Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись



3. Подряддык уюм/ Подрядная организация

ОАО «Т-стройсервис»
Уюмдун аталышы/ Название организации


Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись



**4. Инженер-кеңешчи (техникалык көзөмөл)
Инженер-консультант (Технический надзор)**

Уюмдун аталышы/ Название организации

Абгашиев Н.
Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись

**5. Контроль жүргүзүүчү инспектор/
Инспектор,
Осуществлявший архитектурно-
строительный контроль**

НРУ ГАСК
Уюмдун аталышы/ Название организации


Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись

А. Дроздобенов
Аты-жөнү жана колу/ Ф.И.О. и подпись

АТКАРЫЛГАН ИШТЕРДИН НАРКЫНЫН СПРАВКАСЫ
СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

пайдаланууга кабыл алынуучу негизги фонддордун сметалык наркы/ Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Объектин аталышы жана дарегі/ наименование объекта и местонахождение
Строительство системы водоснабжения для подпроекта "Жерге Тап"

Жалпы/ всего 32 826 778,07 миң сом/ тыс. сом

Анын ичинде курулуш-монтаждоо иштери/в том числе строительно-монтажных работ
_____ миң сом/ тыс. сом

Жабдуулар, шаймандар жана инвентарлар/ оборудования, инструмента и инвентаря
_____ миң сом/ тыс. сом

Курулуштун заказчысы/ Заказчик строительства:

Ала-Бука АЙТЫ ОКМОСУ

(курулушка заказ берген эске эсе юридикалык жактын аталышы, печати /наименование юридического или юридического лица заказчика строительства, печать)



Подрядк уюм/Подрядная организация:

ОАО "Юг-стройсервис"

(юридикалык жактын аталышы, печати /наименование юридического лица подрядной организации, печать)



137

